



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
OTP d.d. Split, SWIFT/BIC: OTPVHR2X, OTP HR4924070001100083155

PRIVREMENI ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI RADOVA

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

Dionica: A.3.5. KUĆE – GORNJE PODOTOČJE – II. FAZA RADOVA

IZVOĐAČ

**VENTUM GRADNJA D.O.O.
ANTE STARČEVIĆA 72
22 305 KISTANJE
OIB:39269647310**

PODUGOVARATELJ:

**KAP PO KAP D.O.O.
Braće Radića 64
32 270 Županja
OIB: 48496195968**



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

1. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA:

UGOVOR O GRAĐENJU br. VG-AVG-A3-19-04/21 od 22.04.2021. godine

PREDSTAVNIK IZVOĐAČA: Nikola Morić

PREDSTAVNIK PODUGOVARATELJA: Mladen Kovačević

Postupak primopredaje izvedenih radova i okončanog obračuna proveden je u nazočnosti predstavnika Izvođača i Podugovaratelja 27.04.2022. godine pri čemu je utvrđeno da radovi koje je Podugovaratelj prikazao u građevinskoj knjizi za travanj, svibanj, lipanj 2021. godine nisu stvarno realizirani radovi. Na temelju obilaska gravitacijskog kolektora utvrđeno je sljedeće stanje:

KANAL K1:

K1-RADOVI KOJI SU IZVEDENI, A NISU PRIKAZANI KNJIGOM				
k.č.br.	spajanje na kolektor	spajanje na reviziono okno	duljina spoja u metrima reviziono okno-sabrno okno (cijev DN160)	okno DN 600 (kućni priključak)
87	K-1	RO 1	19	1
88	K-1	RO 1	13	1
245/2_2	K-1	RO 4	8	1
267/2	K-1	RO 19	10	1
K1 - RADOVI KOJI NISU IZVEDENI, A PRIKAZANI SU KNJIGOM				
k.č.br.	spajanje na kolektor	spajanje na reviziono okno	duljina spoja u metrima reviziono okno-sabrno okno (cijev DN160)	okno DN 600 (kućni priključak)
242/2	K-1	RO 8	9	1
226/2	K-1	RO 15	10	1
92/1	K-1	RO 16	8	1
218	K-1	RO19	16	1
253/3	K-1	RO 10	11	1
255/1	K-1	RO 11	13	1
NAPOMENA: Kućni pruključci 253/3, 255/1 izvedeni, ali su spojeni na kolektor K-3.				
OKNO	OPIS STAVKE			
RO 12	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO16	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 19	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 20	Okno nije ugrađeno.			



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
 Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
 PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
 Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABAHR2X

KANAL K2:

K2 - RADOVI KOJI NISU IZVEDENI, A PRIKAZANI SU KNJIGOM				
k.č.br.	spajanje na kolektor	spajanje na reviziono okno	duljina spoja u metrima okno-sabrno okno (cijev DN160)	okno DN 600 (kućni priključak)
380/1	K-2	RO 38	8	1
384	K-2	RO 42	9	1
259/1	K-2	RO 42	8	1
394	K-2	RO 47	10	1
400/2	K-2	RO 50	8	1
401	K-2	RO 52	11	1
242/2	K-2	RO 52	9	1
OKNO	OPIS STAVKE			
RO 34	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 35	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 36	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 37	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 38	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 39	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 40	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 41	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 42	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 43	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 44	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 45	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZBAHR2X

RO 46	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.
RO 47	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.
RO 48	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.
RO 49	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.
RO 50	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.
RO 51	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.
RO 52	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.
RO 33	Okno nije ugrađeno.



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
 Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
 PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
 Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABAHR2X

KANAL K3:

K3 - RADOVI KOJI SU IZVEDENI, A NISU PRIKAZANI KNJIGOM				
k.č.br.	spajanje na kolektor	spajanje na reviziono okno	duljina spoja u metrima reviziono okno-sabrno okno (cijev DN160)	okno DN 600 (kućni priključak)
253/3	K-3	RO 53	5	1
255/1	K-3	RO 53	8	1
NAPOMENA: Kućni pruključci prikazani knjigom, ali kao da su spojeni na kolektor K-1.				
RADOVI KOJI NISU IZVEDENI, A PRIKAZANI SU KNJIGOM				
k.č.br.	spajanje na kolektor	spajanje na reviziono okno	duljina spoja u metrima reviziono okno-sabrno okno (cijev DN160)	okno DN 600 (kućni priključak)
250/1	K-3	RO 56	13	1
253/3	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac.			
OKNO	OPIS STAVKE			
RO 53	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 54	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 55	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 56	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

KANAL K4:

K4 - RADOVI KOJI NISU IZVEDENI, A PRIKAZANI SU KNJIGOM				
k.č.br.	spajanje na kolektor	spajanje na reviziono okno	duljina spoja u metrima reviziono okno-sabrno okno (cijev DN160)	okno DN 600 (kućni priključak)
267/2	K-4	RO 57	10	1
OKNO	OPIS STAVKE			
RO 57	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 58	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 59	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 60	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 61	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			
RO 62	Nisu izvedeni AB elementi (rasteretni prsten i poklopac) i čelični poklopac s natpisom Velika Gorica.			



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

KANAL K5:

RADOVI KOJI NISU IZVEDENI, A PRIKAZANI SU KNJIGOM				
k.č.br.	spajanje na kolektor	spajanje na reviziono okno	duljina spoja u metrima reviziono okno-sabrno okno (cijev DN160)	okno DN 600 (kućni priključak)
288/1	K-5	RO 63	10	1



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

PREGLED IZVEDENOG STANJA SABIRNIH OKANA

A.3.5. KUĆE-GORNJE PODOTOČJE, 2. faza gradnje_KAP PO KAP						
br.	datum ugradnje	k.č.br.	spajanje na kolektor	spajanje na reviziono okno	duljina spoja u metrima reviziono okno-sabrno okno (cijev DN160)	ugradnja čepa DN160
1	16. lipanj 2021.	89	K-1	RO 1	7	1
2	16. lipanj 2021.	94/4	K-1	RO 1	8	1
3	16. lipanj 2021.	92/1	K-1	RO 2	12	1
4	16. lipanj 2021.	93/3	K-1	RO 2	8	1
5	16. lipanj 2021.	244/1	K-1	RO 3	7	1
6	17. lipanj 2021.	246/5	K-1	RO 5	8	1
7	17. lipanj 2021.	246/6	K-1	RO 5	10	1
8	17. lipanj 2021.	246/3	K-1	RO 6	6	1
9	17. lipanj 2021.	243/4	K-1	RO 6	6	1
10	17. lipanj 2021.	243/2	K-1	RO 6	7	1
11	18. srpanj 2021.	250	K-1	RO 9	10	1
12	18. srpanj 2021.	242/1	K-1	RO 9	9	1
13	18. srpanj 2021.	243/1	K-1	RO 8	9	1
14	28. lipanj 2021.	251	K-1	RO 10	12	1
15	28. lipanj 2021.	245/2_1	K-1	RO 4	8	1
16	29. lipanj 2021.	247/1	K-1	RO 7	10	1
17	29. lipanj 2021.	245/2_2	K-1	RO 4	8	1
18	29. lipanj 2021.	241	K-1	RO 10	12	1
19	30. lipanj 2021.	256/2	K-1	RO 14	9	1
20	30. lipanj 2021.	257	K-1	RO 14	7	1
21	1. srpanj 2021.	231/1	K-1	RO 13	12	1
22	1. srpanj 2021.	231/2	K-1	RO 13	11	1
23	2. srpanj 2021.	232/2	K-1	RO 14	7	1
24	5. srpanj 2021.	233_1	K-1	RO 11	8	1
25	5. srpanj 2021.	233_2	K-1	RO 11	7	1
26	6. srpanj 2021.	243/5	K-1	RO 4	7	1
27	6. srpanj 2021.	243/3	K-1	RO 4	8	1
28	7. srpanj 2021.	227	K-1	RO 16	7	1
29	7. srpanj 2021.	225	K-1	RO 16	7	1
30	7. srpanj 2021.	264	K-1	RO 17	10	1
31	8. srpanj 2021.	221	K-1	RO 18	8	1
32	8. srpanj 2021.	219	K-1	RO 18	7	1



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

33	20. srpanj 2021.	267/1	K-1	RO 19	17	1
34	20. srpanj 2021.	267/2	K-1	RO 19	10	1
35	20. srpanj 2021.	270	K-4	RO 57	6	1
36	21. srpanj 2021.	272/2	K-4	RO 59	10	1
37	21. srpanj 2021.	272/3	K-4	RO 60	17	1
38	21. srpanj 2021.	267/4	K-4	RO 60	8	1
39	22. srpanj 2021.	263/3	K-4	RO 58	7	1
40	23. srpanj 2021.	273	K-4	RO 62	5	1
41	23. srpanj 2021.	295	K-4	RO 65	11	1
42	26. srpanj 2021.	294	K-5	RO 64	7	1
43	26. srpanj 2021.	289/1	K-5	RO 64	8	1
44	27. srpanj 2021.	183	K-5	RO 63	6	1
45	27. srpanj 2021.	184	K-5	RO 63	11	1
46	27. srpanj 2021.	253/2	K-3	RO 55	5	1
47	28. srpanj 2021.	255/4	K-3	RO 55	13	1
48	28. srpanj 2021.	255/3	K-3	RO 54	10	1
49	28. srpanj 2021.	255/2	K-3	RO 56	6	1
50	29. srpanj 2021.	253/3	K-3	RO 53	5	1
51	29. srpanj 2021.	253/1	K-3	RO 56	11	1
52	30. srpanj 2021.	255/1	K-3	RO 53	8	1
53	30. srpanj 2021.	253/3	K-3	RO 54	11	1
54	2. kolovoz 2021.	88	K-2	RO 52	10	1
55	2. kolovoz 2021.	90/2	K-2	RO 52	10	1
56	2. kolovoz 2021.	93/4	K-2	RO 51	7	1
57	3. kolovoz 2021.	93/2	K-2	RO 50	13	1
58	3. kolovoz 2021.	244/2	K-2	RO 50	9	1
59	3. kolovoz 2021.	245/1	K-2	RO 49	5	1
60	3. kolovoz 2021.	246/2	K-2	RO 48	9	1
61	4. kolovoz 2021.	263/2	K-2	RO 41	8	1
62	4. kolovoz 2021.	264/1	K-2	RO 40	10	1
63	4. kolovoz 2021.	280/3	K-2	RO 34	14	1
64	6. kolovoz 2021.	283/2	K-2	RO 34	9	1
65	6. kolovoz 2021.	263/1	K-1	RO 16	13	1
66	6. kolovoz 2021.	262	K-1	RO 15	7	1
67	6. kolovoz 2021.	87	K-1	RO 1	19	1
68	6. kolovoz 2021.	88	K-1	RO 1	13	1
69	10. kolovoz 2021.	243/6	K-1	RO 3	10	1



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
 Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
 PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
 Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

CCTV INSPEKCIJA

DIONICA	KOLEKTOR	STACIONAŽA	DUBINA (m)	OPIS NEODSTATKA	OZNAKA FOTOGRAFIJE	PROMJER KOLEKTORA	CIJENA SANACIJE METODOM BEZ ISKOPA (PAKER)
A.3.5. Kuće- Gornje Podotočje, 2. faza gradnje	K-1	0+094.00	1.70	BRTVA NA SPOJU CIJEVI I OKNA RO 4 (UZVODNO)	foto 16	DN 315	2.750,00 kn
		0+077.00	1.60	BRTVA NA SPOJU CIJEVI I OKNA RO 3 (NIZVODNO)	foto 17		2.750,00 kn
		0+100.00	1.75	BRTVA NA SPOJU DVIJE CIJEVI	foto 18		2.750,00 kn
		0+168.00	2.30	BRTVA NA SPOJU DVIJE CIJEVI	foto 19		2.750,00 kn
		0+277.00	3.20	RAZMAK NA SPOJU CIJEVI I OKNA RO 12 (NIZVODNO)	foto 20		2.750,00 kn
		0+312.00	3.30	RAZMAK NA SPOJU CIJEVI I OKNA RO 14 (UZVODNO)	foto 21		2.750,00 kn
		0+385.00	3.45	RAZMAK NA SPOJU CIJEVI I OKNA RO 17 (UZVODNO)	foto 22		2.750,00 kn
		0+340.00	3.35	RAZMAK NA SPOJU CIJEVI I OKNA RO 15 (NIZVODNO)	foto 23		2.750,00 kn
		0+364.00	3.40	RAZMAK NA SPOJU KONEKTORA I OKNA RO 16 (UZVODNO)	foto 24		2.750,00 kn
	K-2	0+000.82	3	RAZMAK NA	foto 47	DN 315	2.750,00 kn



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
 Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
 PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
 Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

				SPOJU DVIJE CIJEVI RO 34- RO 33				
		0+434.02	3	RAZMAK NA SPOJU DVIJE CIJEVI RO 48 - RO 47	foto 48		2.750,00 kn	
		0+092.67	3	POVRŠINSKO OŠTEĆENJE CIJEVI	foto 49		2.750,00 kn	
	K-3	0+073.12	1.65	BRTVA NA SPOJU DVIJE CIJEVI	foto 43	DN 250	2.750,00 kn	
	K-4	0+055.00	2.00	BRTVA NA SPOJU DVIJE CIJEVI	foto 44		2.750,00 kn	
		0+025.50	2.00	RAZMAK NA SPOJU DVIJE CIJEVI (42 mm)	foto 45		2.750,00 kn	
	K-5	0+003.30	2.40	RAZMAK NA SPOJU DVIJE CIJEVI (44 mm)	foto 46	DN 315	2.750,00 kn	
UKUPNO								44.000,00 kn



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

FOTODOKUMENTACIJA CCTV INSPEKCIJE:

KANAL K-1

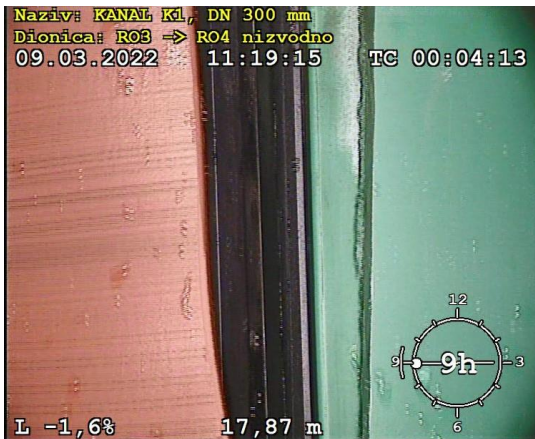


FOTO 16



FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19

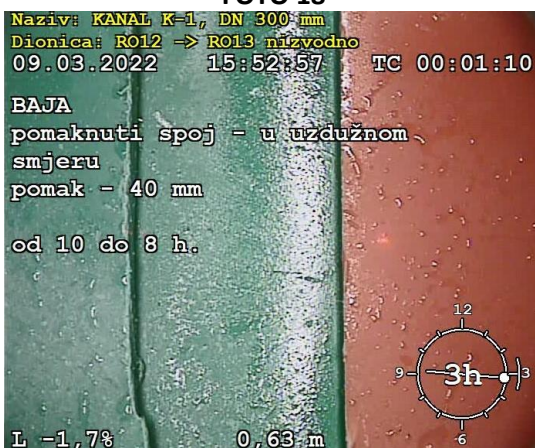


FOTO 20

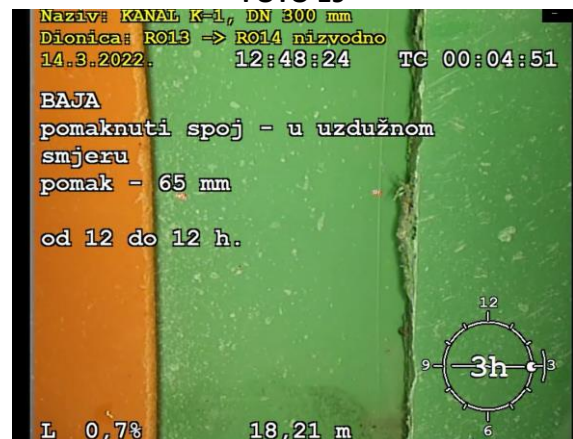


FOTO 21



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

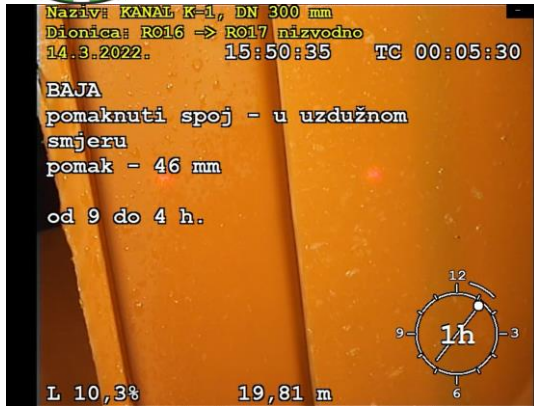


FOTO 22

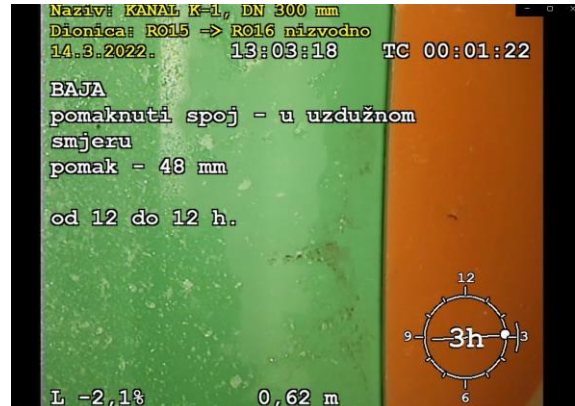


FOTO 23

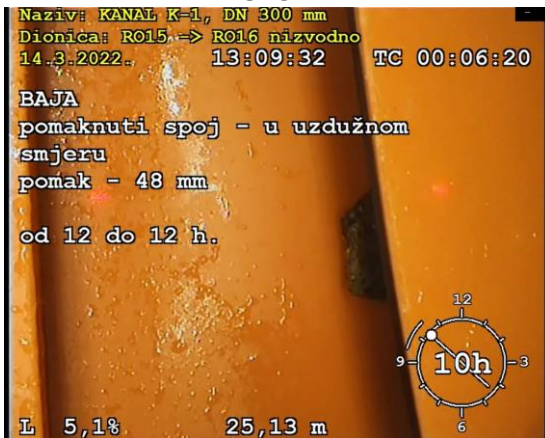


FOTO 24



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABAHR2X

KANAL K-2

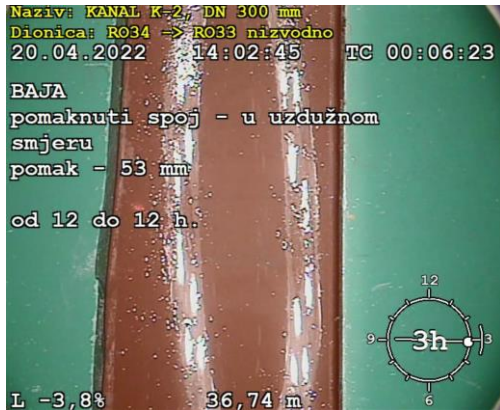


FOTO 47

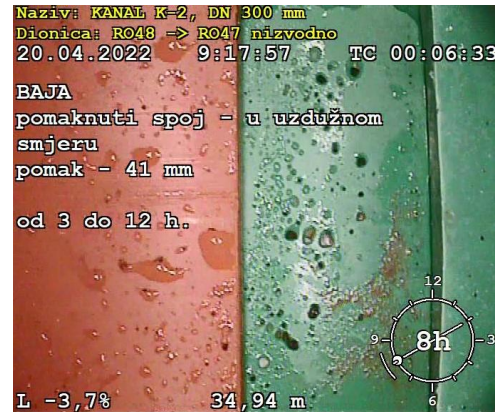


FOTO 48

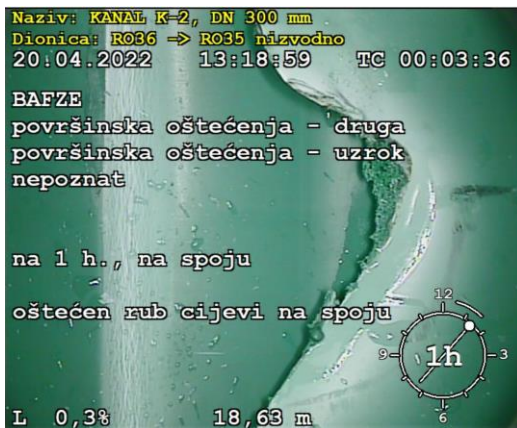


FOTO 49



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZBAHR2X

KANAL K-3

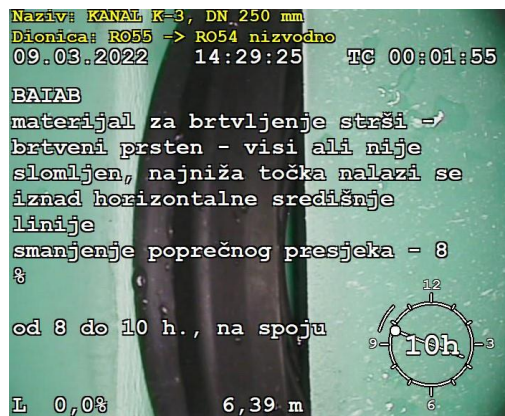


FOTO 43



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

KANAL K-4

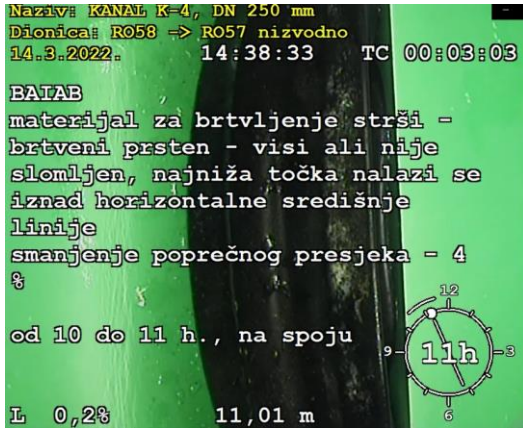


FOTO 44

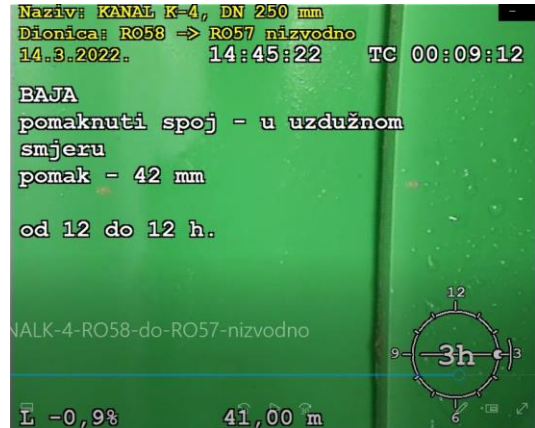


FOTO 45

KANAL K-5

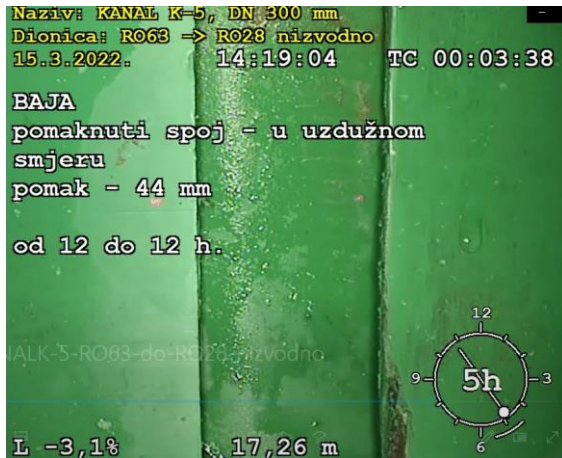


FOTO 46



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

SVEUKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:

Predstavnik Izvođača i Podugovaratelja su po izvršenom pregledu izvedenih radova i po reviziji obračunske dokumentacije suglasni da je sveukupna vrijednost izvedenih radova prikazana u prilogu ovom privremenom zapisniku o preuzimanju radova – Okončana situacija.

PREGLED PRIVREMENIH SITUACIJA - KAP PO KAP	
Opis stavke	Iznos (kn)
<i>Ukupna vrijednost izvršenih radova prikazana građevinskom knjigom</i>	1.253.350,99 kn
<i>Sanacija oštećenja kolektora utvrđenih CCTV inspekcijom</i>	- 44.000,00 kn
<i>Ugrađena cijev u oštećenu oborinsku odvodnju DN 315, L=6 m</i>	- 2.106,08 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova prikazana građevinskom knjigom	1.358.899,22 kn
Ukupno vrijednost situacije za mjesec travanj 2022.	-151.654,30 kn

PRILOG 1.

- OKONČANA SITUACIJA - REVIZIJA



VENTUM GRADNJA d.o.o.

Ante Starčevića 72, 22305 Kistanje, Republika Hrvatska, e-mail: info@ventum-gradnja.com
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, br. rješenja: Tt-17/3515-5
PDV ID: HR39269647310, MBS: 060257491, OIB: 39269647310
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN HR 862 3600 0011 0252 5654, SWIFT/BIC: ZABHR2X

Potpisivanjem ovog privremenog zapisnika o preuzimanju radova Izvođač i Podugovaratelj su suglasni da na snazi ostaju članci iz osnovnog ugovora br. VG-AVG-A3-19-04/21 sve dok se ne izvrši preuzimanje radova između Izvođača i Naručitelja.

Ovim Putem Izvođač još naglašava Podugovaratelju sljedeće stavke:

Preuzimanje radova

Za preuzimanje radova koji su predmet ovog Ugovora primjenjuju se odredbe Osnovnog ugovora i Podugovaratelj je suglasan da se preuzimanje radova između Podugovaratelja i Izvođača vrši nakon što se izvrši preuzimanje radova između Izvođača i Naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

Podugovaratelj će kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, prilikom potpisa ovog Ugovora, predati Izvođaču bjanko zadužnicu (ovjerenu kod javnog bilježnika) na iznos od 20 % od Ugovorne cijene iz ovog Ugovora. Predmetni instrument osiguranja biti će vraćen nakon realizacije svih stavki Ugovora.

Otklanjanje nedostataka

Podugovaratelj će kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostaviti Izvođaču neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv, prije povrata zadužnice za uredno ispunjenje Ugovora. Bankarsku garanciju će biti na iznos od 10% od ukupno izvršenih radova za prve dvije godine razdoblja odgovornosti, a za dodatno razdoblje od 3 godine na iznos od 5% izvršenih radova. Bankarska garancija će biti važeća do dana koji pada na 30. dan nakon isteka garancije koju prema Osnovnom ugovoru Izvođač predaje Naručitelju, o kojem datumu će Izvođač pravovremeno obavijestiti Podugovaratelja.

U Mraclinu, 27.04.2022. godine

Predstavnik Izvođača

Nikola Morić

Predstavnik Podugovaratelja

Mladen Kovačević
