

JASMINKA LILIĆ, dipl.ing.građ.

stalni sudski vještak u građevinarstvu i procjenitelj
51 000 Rijeka, Švalbina 7
OIB 23206156984

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Rijeka, Zadarska 1 i 3

Poslovni broj : R1-94/2025

Vještačenje : 07-04-2026

Predlagatelj osiguranja : 3. MAJ RIJEKA 1905 d.o.o, Rijeka, Liburnijska 3 , kojeg
zastupa punomoćnik Darijan Hört, odvjetnik u Opatiji

Protivnik osiguranja : GODINA d.o.o Slovenija, Slovenija , OIC- Hrpelje 22, Kozina
, Podružnica Rijeka, Miroslava Krlež 4 , kojeg zastupa
punomoćnica Angelika Rajačić Bonifačić , odvjetnica u
Zajedničkom odvjetničkom uredu Angelika Rajačić Bonifačić
i Sanja Gelić iz Rijeke , drugoprotivnik osiguranja INKAING
d.o.o. Slovenija, Letališka cesta 27 , Ljubljana, trećeprotivnik
osiguranja K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka,
Dolac 14

Radi : osiguranja dokaza


OČITOVANJE GRAĐEVINSKOG VJEŠTAKA



Rijeka, 21.07.2026.

Jasminka Lilić, dipl.ing.građ.


OČITOVA NJE NA PODNESAK PREDLAGATELJA OSIGURANJA

Činjenica da je izvođenje radova na izgradnji retencijskog bazena bilo višestruko premašeno nije predmet ovog nalaza i mišljenja.

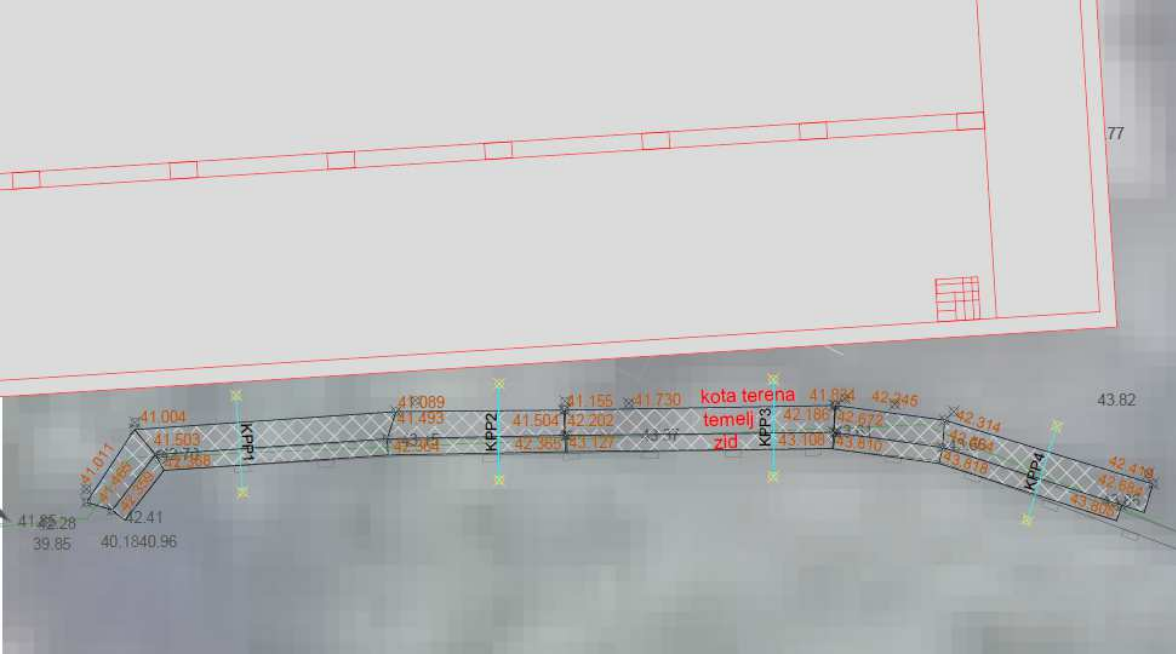


naručilac:  K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KODOLAC 14 51 000 Rijeka OIB: 80805858278		naziv zahvata u prostoru: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA
projektantski ured:  lineal ADRIA GROUP Lineal Adria Group d.o.o. Kovinska ulica 4A 10000 Zagreb OIB: 96626740200		naziv projekta/mape: PODSUSTAV TREĆI MAJ I
projektirani dio građevine: PODSUSTAV TREĆI MAJ I		razina razrade projekta: IZVEDBENI PROJEKT
		oznaka projekta: LAG05-A8-IZV-G
		ZOP: LAG05
glavni projektant:	Hrvoje Grubeša, mag.ing.aedif. G 6385 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Hrvoje Grubeša mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 6385	strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT
		broj mape / do mape: Mapa I.2
projektant:	Jani Trojner, dipl.inž.grad. GPR 125  Jani Trojner dipl. inž. grad. Strani privremeno ovlašten inženjer građevinarstva GPR 0125	datum: 11/2024
		sadržaj: SITUACIJA OGRADNOG ZIDA


KPP1

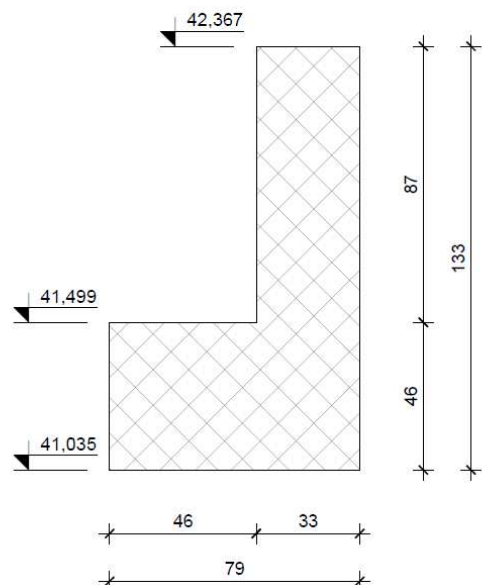


KPP2

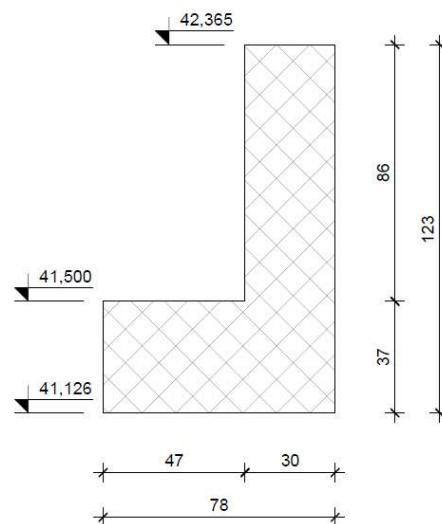

KPP3

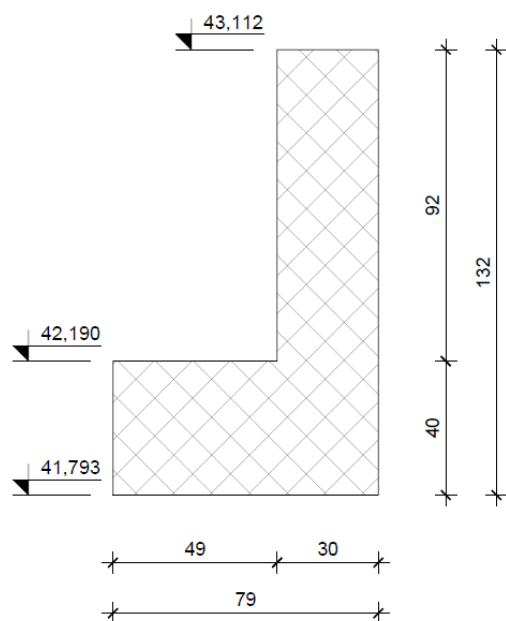

KPP4

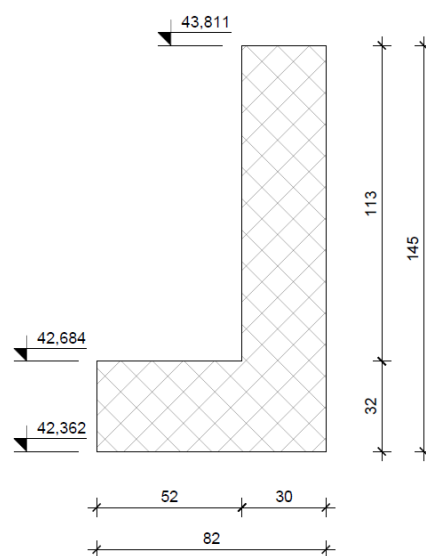

Na južnoj strani retencijskog bazena predviđen je ogradni zid. Dio novo izvedenog ogradnog zida se spaja na postojeće ogradne zidove na istočnoj , te na zapadnoj strani .



postojeći ogradni zida
visine 150 cm do kote
terena na južnoj strani



postojeći ogradni zida
visine 300 cm do kote
terena na južnoj strani

Novo betonirani zid izveden je u dužini od 18,5 m , kaskadno , visine do kote terena od 1,0m do 1,4 m . Prostor između građevine retencijskog bazena i betonskog ogradnog zida je dijelom nasipan materijalom iz iskopa, ostacima betonske smjese .

Zadatak vještaka je bio utvrditi uzročno posljedične veze nastanka štete, nastalu štetu i vrijednost radova potrebnih za sanaciju nastale štete u Rijeci , Liburnijska 3 u objektima hale za obradu i predobradu limova i radionice održavanja.

Uzrok nastanka štete u objektu radionice je obilna kiša dana 10.09. 2025. na riječkom području . Dana 10.rujna 2025. godine na riječkom području došlo je do ekstremnih oborina , te bujičnih poplave , posebno izraženih na lokaciji spoja ulice Jože Vlahovića i Liburnijske ulice (kod podvožnjaka) - fotografija iz video zapisa . Bujični tok je internom prometnicom predlagatelja osiguranja koja je u padu oticao sa Liburnijske ulice prema prema objektima u kojim je nastala šteta.

Stanje na gradilištu na dan štetnog događaja nije bilo od utjecaja na nastalu štetu .

Rijeka, 21.07.2026.

Jasminka Lilić, dil.ing. građ.
