GRAĐEVINSKA KNJIGA

REKONSTRUKCIJA BAZENA

LOKACIJA: VODICE

ožujak, 2020.

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA : Dobava i ugrađivanje lagano armiranog betona klase C16/20, presjeka 0,05-0,10 m³/m²-m¹ na tlu (podbeton). Ispod podnih ploča i temeljnih traka ugrađeje se podbeton minimalne debljine 10 cm.					
redni broj predračuna	*jedinica mjere*	ukupna količina po predračunu	*jedinična cijena*	izvršena količina radova	
1.	m3	20,00	1200,00	mjesečno	ukupno
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
8,30	0,10	3,30	*bazen*	2,74	
8,30	0,10	4,80		3,98	
12,80	0,10	2,30		2,94	
33,00	0,10	0,60	*kanali*	1,98	
8,10	0,10	6,60	*strojarnica*	5,35	
5,30	0,10	2,10	*skale strojarnica*	1,11	
			Ukupno podložni beton:	***18,11***	

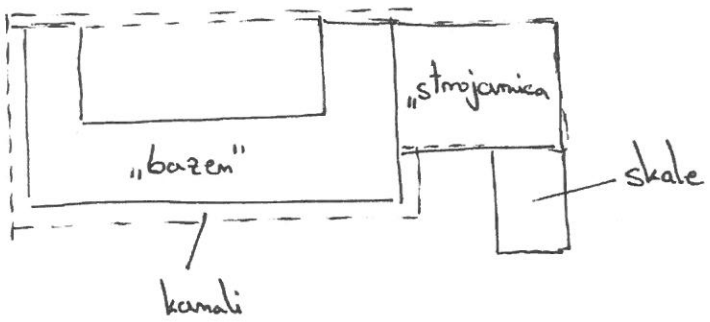

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA :					
Betoniranje armirano-betonskih temelja betonom C25/30. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Kroz temelje ostaviti sve potrebne otvore i šliceve prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija. Obračun po m3 gotovih temelja.					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
				mjesečno	ukupno
2.	m3	100,00	1600,00		
	dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**		
(1)	20,00	0,50	0,50	5,00	
(2)	10,00	0,50	0,50	2,50	
(3)	3,00	0,50	0,50	0,75	
			Ukupno temeljne trake ispod bazena:	***8,25***	

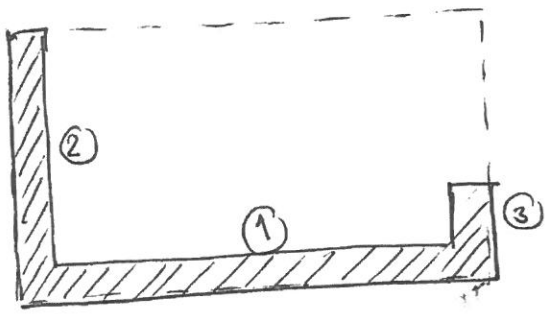

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA :					
Betoniranje AB podne ploče bazena (tlocrtne dimenzije 20,00x10,00) debljine 25 cm. Betoniranje betonom C25/30 u glatkoj oplati, sa aditivima za vodonepropusnost. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m3 .					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
3.	m3	100,00	1200,00	mjesečno	ukupno
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
20,00	0,23	10,00	*bazen*	46,00	
7,50	0,30	6,00	*strojarnica*	13,50	
5,00	0,30	1,50	*skale strojarnica*	2,25	
			Ukupno podne ploče:	***61,75***	

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA :					
Betoniranje ab ravne ploče - debljine 18,0 cm betonom C 25/30. Uključena oplata sa podupiranjem. Ugradba betona strojno s pervibriranjem. Obračun po m3 .					
redni broj predračuna 4.	jedinica mjere m3	ukupna količina po predračunu 100,00	jedinična cijena 1600,00	izvršena količina radova mjesečno	 ukupno
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
7,50	0,18	6,00		8,10	
			Stropna ploča strojarnice:	***8,10***	

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice stranica

OPIS RADOVA :

Betoniranje AB zidova bazena debljine 25 cm. Betoniranje betonom C25/30 u glatkoj oplati, sa aditivima za vodonepropusnost. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m3.

redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
				mjesečno	ukupno
5.	m3	100,00	1600,00		

dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**		
20,50	1,40	0,25	*bazen*	7,18
10,00	1,40	0,25		3,50
20,50	1,40	0,25		7,18
10,00	1,40	0,25		3,50
7,75	3,20	0,25	*strojarnica*	6,20
6,00	3,20	0,25		4,80
7,75	3,20	0,25		6,20
6,00	1,80	0,25		2,70
6,00	3,20	0,25		4,80
5,00	2,50	0,25	*skale strojarnice*	3,13
5,00	2,50	0,25		3,13
	(prosječna visina kosog zida)			
3,00	0,70	0,40	*podlivanje za zid stubišta prema moru*	0,84
2,00	0,50	0,50	*zid "kotlovnice"*	0,50
1,50	1,50	0,25	*kraj strojarnice*	0,56
4,00	1,20	0,25	*skale - more*	1,20
			Ukupno zidovi 25cm:	***55,40***

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA :					
Betoniranje arm. betonskog dvokrakog vanjskog stubišta sa stubama. Kosa ploča stubišta debljine 30cm na podu. Betoniranje betonom C 25/30. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate te njeno podupiranje. Obračun po m3 gotovog izbetoniranog stubišta.					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
				mjesečno	ukupno
6.	m3	10,00	3500,00		
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
5,00	0,40	1,50	*skale strojarnica*	3,00	
3,20	0,40	3,75	*skale - more*	4,80	
			Ukupno vanjske skale:	***7,80***	

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA :					
Betoniranje stepenica u bazenu betonom C25/30 u glatkoj oplati, sa aditivima za vodonepropusnost. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U stavci uključena i izrada betonske podloge za masažne ležaljke unutar bazena. Obračun po m3 .					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
7.	m3	5,00	2200,00	mjesečno	ukupno
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
1,80	1,22	1,20	iznos /2 = "trokut"	1,32	
			Ukupno bazenske skale:	***1,32***	
5,25	1,10	1,70		9,82	
			Ukupno beton za "masažne stolice":	***9,82***	
			Ukupno bazenske skale i masažne stolice:	***11,14***	

PRESJEK „MASAŽA":

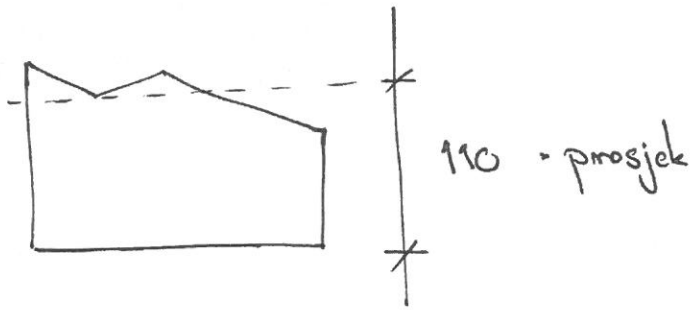

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA : Čišćenje terena na mjestu izgradnje bazena i strojarnice (oko već postojeće ploče starog bazena) kao priprema za izvođenje radova. Obračun po m2.					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
				mjesečno	ukupno
8.	m2	200,00	45,00		
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
8,00		4,50	*bazen*	36,00	
8,00		3,00		24,00	
20,00		2,50		50,00	
12,00		9,00	*strojarnica*	108,00	
		Ukupno pripremljene površine za betonažu:		***218,00***	

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice stranica

OPIS RADOVA :

Nabava, doprema i ugradnja sloja netkanog tekstila 300 g/m² na mjestima predviđenim projektom. Na mjestima predviđenim projektom/na zahtjev Investitora ugrađuje se sloj netkanog tekstila. Obračun po m² ugrađenog netkanog tekstila

redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
9.	m2	500,00	45,00	mjesečno	ukupno
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
9,00		5,00	*bazen*	45,00	
9,00		3,50		31,50	
21,00		3,00		63,00	
10,00		0,70	*"kanali"*	7,00	
20,00		0,70		14,00	
10,00		0,70		7,00	
20,00		0,70		14,00	
8,50		7,00	*strojarnica*	59,50	
5,50		2,00	*skale strojarnice*	11,00	
			Ukupno geotextil:	***252,00***	

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice stranica

OPIS RADOVA :

Strojno zbivanje materijala kao priprema za postavu podložnog betona za bazen/strojarnicu i sve pripadajuće pomoćne objekte u uređenju okoliša. Obračun po m2.

redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
10.	m2	300,00	45,00	mjesečno	ukupno
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
9,00		5,00	*bazen*	45,00	
9,00		3,50		31,50	
21,00		3,00		63,00	
10,00		1,00	*"kanali"*	10,00	
20,00		1,00		20,00	
10,00		1,00		10,00	
20,00		1,00		20,00	
8,50		7,00	*strojarnica*	59,50	
			Ukupno strojno zbivanje slojeva:	***259,00***	

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA :					
Betoniranje betonskog trakastog temelja i betonske "kape" zida za šetnicu na prostoru između bazena i mora. Beton klase C25/30 u glatkoj oplati, ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža *potrebne oplate. Obračun po m1.*					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
				mjesečno	ukupno
11.	m1	125,00	100,00		
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
125,00	0,18	0,45		125,00	
125,00	0,10	0,30		125,00	
			Ukupno temelj i "kapa":	***250,00***	

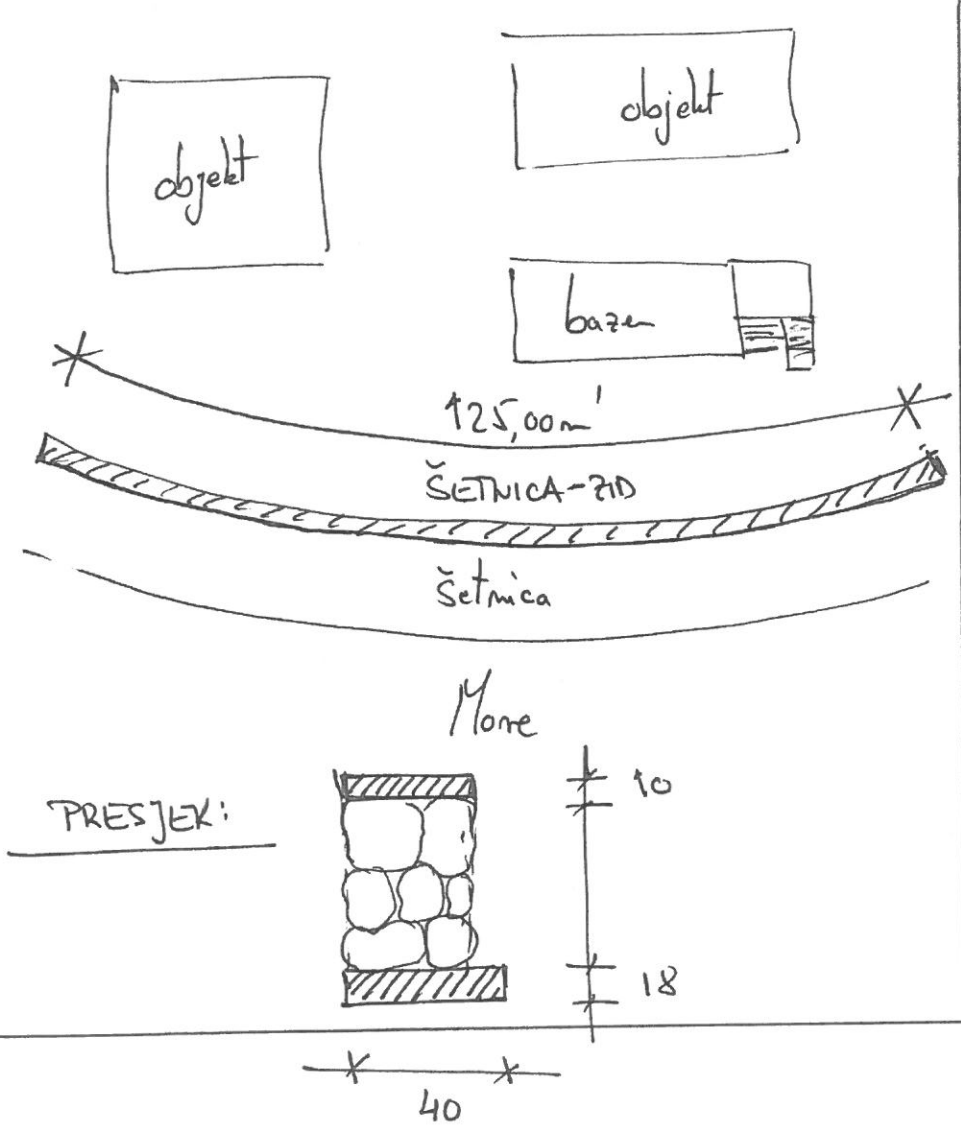

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice — stranica

OPIS RADOVA :

Ručno betoniranje šahti oko bazena/okolnih objekta betonom klase C25/30. U stavku je uključena izrada podnih ploča gdje je bilo potrebno, zidova šahte te poklopnica šahte/vijenac. Obračun po komadu šahte.

redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
12.	kom	5,00	3500,00	mjesečno	ukupno
ŠAHTA 1					
1,35	1,10	0,10	*ploča*	0,15	
1,10	0,80	0,15	*zidovi*	0,13	
1,10	0,80	0,15		0,13	
1,05	0,80	0,15		0,13	
1,05	0,80	0,15		0,13	
1,35	1,10	0,10	*"vijenac"*	0,15	
1,30	*1,30*	*0,10*	*poklopac dodatni*	0,17	
			Ukupno "šahta 1":	***0,98***	
ŠAHTA 2 & ŠAHTA 3 & ŠAHTA 4					
1,00	0,90	0,10	*ploča*	0,09	*x3*
0,90	0,50	0,15	*zidovi*	0,07	*x3*
0,90	0,50	0,15		0,07	*x3*
0,70	0,50	0,15		0,05	*x3*
0,70	0,50	0,15		0,05	*x3*
1,00	0,90	0,10	*"vijenac"*	0,09	*x3*
			Ukupno "šahta 2":	***1,26***	
"UPOJNI BUNAR" - STROJARNICA					
0,90	0,20	0,60		0,11	
0,90	0,30	0,60		0,16	
0,90	0,30	0,60		0,16	
0,90	0,30	0,60		0,16	
0,90	0,30	0,60		0,16	
			Ukupno "upojni bunar":	***0,76***	

**** ARMATURA: Svaka šahta armirana mrežama Q-385* (u cijeni)

Ukupno šahti:	***5,00***	***komada***

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA : Geodetsko praćenje visina za izradu svih AB radova oko bazena i strojarnice uključujući i okolne skale i kanale oko bazena te praćenje visina za nabivanje i nasipavanje materijala uređenja okoliša. Obračun po m2.					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
				mjesečno	ukupno
13.	m2	300,00	12,00		
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
20,00		10,00		200,00	
8,00		6,00		48,00	
6,00		8,00		48,00	
20,00		1,00		20,00	
10,00		1,00		10,00	
20,00		1,00		20,00	
10,00		1,00		10,00	
		Ukupno m2 praćenja visina za izvedbu AB radova:		***356,00***	

- praćenje visina prema zadanim kotama od strane Investitora
- dinamika praćenja:
podne ploče - zidovi - kanali bazena - stubište - masažne stolice
nabivanje tamponskog sloja na visinu, priprema za podložni beton

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA :					
Betoniranja betonskog kanala oko bazena za preljev. Beton klase C25/30, ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Širina kanala 25cm, visina 40cm, ukupna širina sa zubom 50cm, a zub kanala visine/širine 10-15cm. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m1.					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
				mjesečno	ukupno
14.	m1	70,00	650,00		
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
20,50				20,50	
10,50				10,50	
20,50				20,50	
10,50				10,50	
			Ukupna dužina kanala:	***62,00***	

Detalji - presjek kanala:

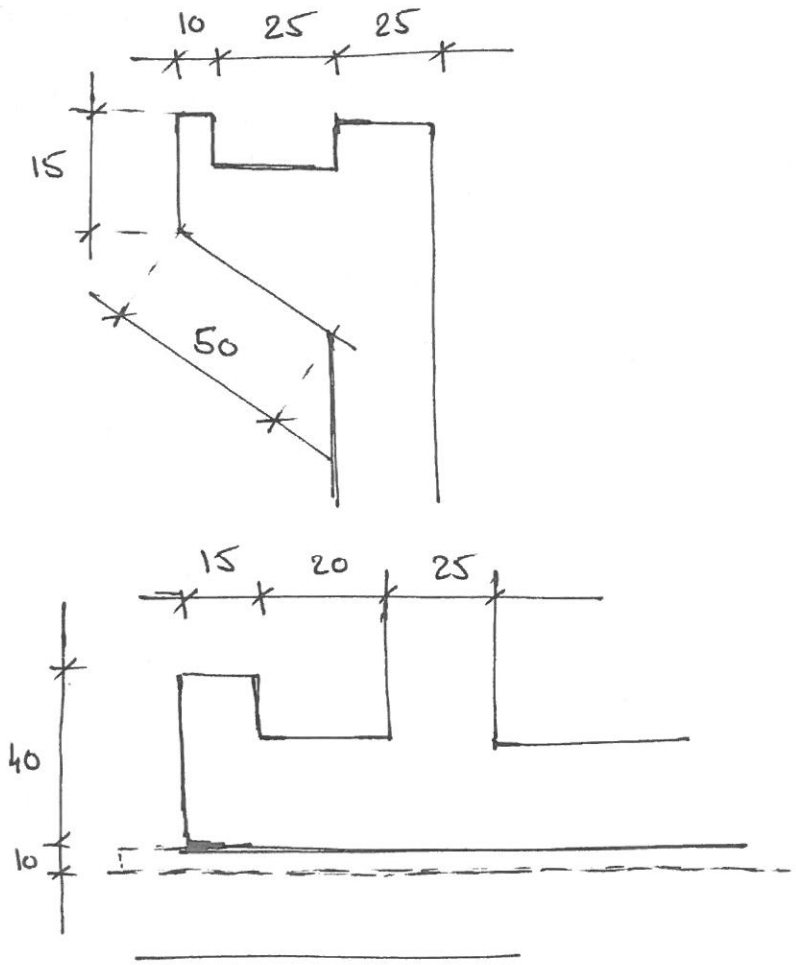

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice stranica

OPIS RADOVA :

Dobava, izrada i ugradba armature srednje složenosti. Armaturu izraditi prema statičkom računu i planu pozicija armature. Navedena količina je prema procjeni.

redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
				mjesečno	ukupno
15.	kg	20000,00	9,00		

dužina(m)	visina(m)	širina(m)			
Ukupna količina betona:		**190,00**	*m3*		
Korišteni mreže:	Q - 385		80,00 *kg/kom*		
	Q - 257		55,00 *kg/kom*		
Korištene šipke:	ø8 - motano željezo				
	ø12				
	ø14				

Prosječna kg/m3 prema popisu ugrađene armature iznosi:

87kg/m3

	m3	kg	
	190,00	87,00	16530,00

Armaturne mreže: ***9918,00*** Armaturne šipke: ***6612,00***

Ukupno kg ugrađene armature: ***16530,00***

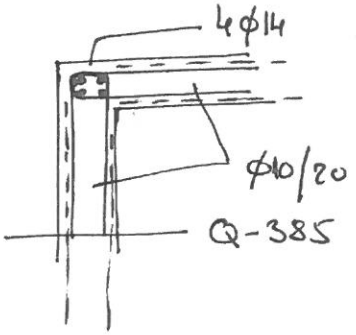

DETALJ SPOJA ZIDOVA / ZID-PLOČA

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija bazena - Vodice				stranica	
OPIS RADOVA :					
Ručno zidanje suhozida za šetnicu na prostoru između bazena i mora. Obračun po m1.					
redni broj predračuna	jedinica mjere	ukupna količina po predračunu	jedinična cijena	izvršena količina radova	
16.	m1	137,00	250,00	mjesečno	ukupno
dužina(m)	**visina(m)**	**širina(m)**			
137,00				137,00	
			Ukupna dužina zida:	***137,00***	

DOKAZNICA:

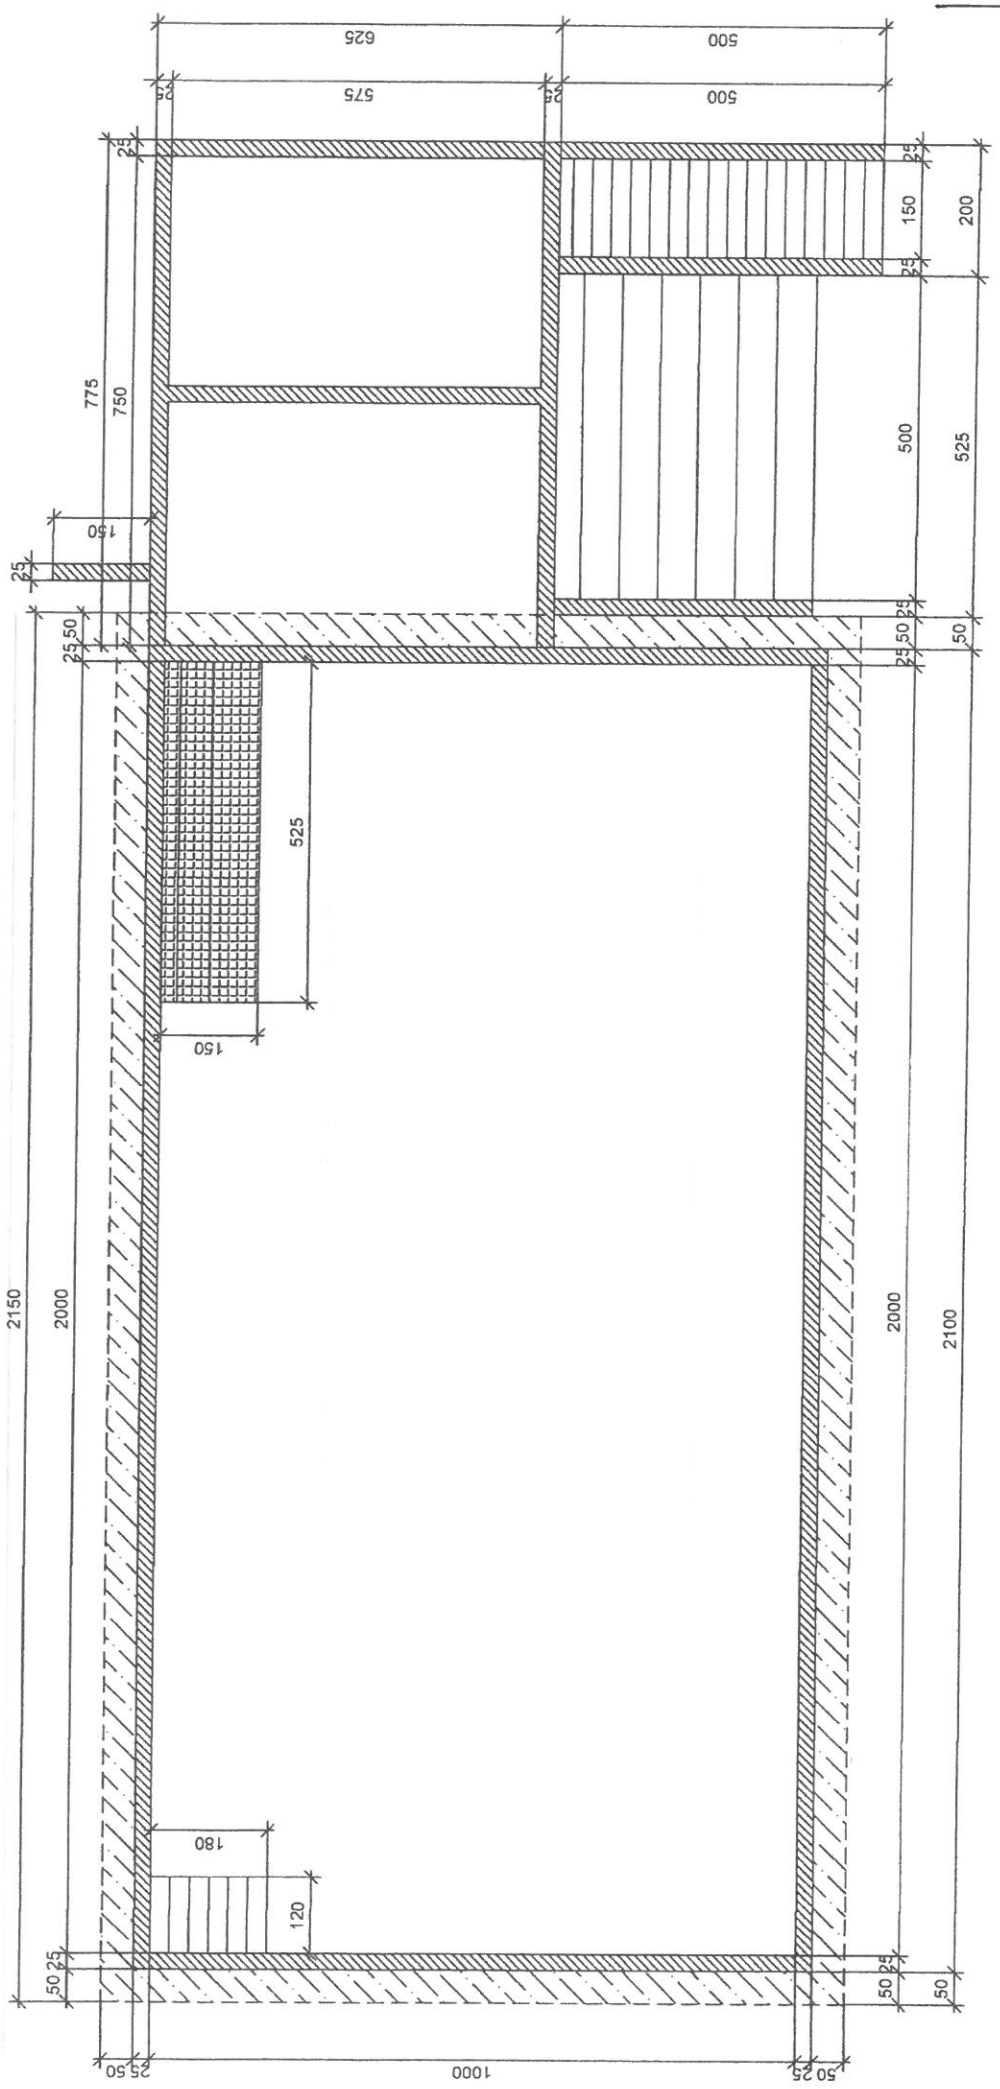
625
500
575
500
25
25
25
150
200
775
750
500
525
150
25
25
50
25
50
50
525
150
2150
2000
2000
2100
180
120
50
25
50
25
50
1000
25
50

Gmail Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Fwd:

Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> 19. srpnja 2021. u 14:38
Prima: graciano@rudan.com

Poštovani ,
U privitku vam dostavljamo traženu građevinsku knjigu te troškovnik građevinskoh radova na rekonstrukciji bazena.
Napominjemo s obzirom da nikad niste otvorili gradilište niti imenovali voditelja gradilišta nismo bili ni dužni voditi građevinsku knjigu.
Nadalje, nikad nam niste dostavili projekt za izvođenje radova već smo sve radove izvodili na osnovu vaših usmenih uputa.
Kao što znate sve radove smo izveli u skladu sa pravilima struke i završili prije više od godinu dana, te vas sada lijepo molimo da izvršite plaćanje po dostavljenim obračunima i fakturama ili ćemo biti prisiljeni podnjeti tužbu za naplatu naših potraživanja.
Lp
Boško Kranjac

Broj priloga: 2

Troškovnik_Vodice_bazen.pdf
122K

Građevinska knjiga_Vodice_bazen.pdf
3989K

Građevina:	oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA BAZENA	

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
1.	**GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI**				
1.	Dobava i ugrađivanje lagano armiranog betona klase C16/20, presjeka 0,05-0,10 m^3/m^2-m^1 na tlu (podbeton). Ispod podnih ploča i temeljnih traka ugrađeje se podbeton minimalne debljine 10 cm. Obračun po m^3 ugrađenog betona.	m^3	18,11	1.200,00	21.732,00
2.	Betoniranje armirano-betonskih temelja betonom C25/30. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Kroz temelje ostaviti sve potrebne otvore i šliceve prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija. Obračun po m3 gotovih temelja. Površina temelja mora biti obrađena "pod fratun", bez neravnina, s točnošću +/-2 mm, očišćena. Na svakom eventualnom prekidu betoniranja, prije nastavka ugraditi water-stop traku. Obračun po m^3 ugrađenog betona.				
-	Temelji.	m^3	8,25	1.600,00	13.200,00
3.	Betoniranje AB podne ploče bazena (tlocrtne dimenzije 20,00x10,00) debljine 25 cm. Betoniranje betonom C25/30 u glatkoj oplati, sa aditivima za vodonepropusnost. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m3 . U jediničnu cijenu uključena glatka oplata. Ploče moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena "pod fratun", točnosti do +/- 2 mm. Obračun po m^3 ugrađenog betona.				
-	Podna ploča debljine 25,00 cm.	m^3	61,75	1.200,00	74.100,00
4.	Betoniranje AB ravne ploče - debljine 18,0 cm betonom C 25/30. Uključena oplata sa podupiranjem. Ugradba betona strojno s pervibriranjem. Obračun po m3 . U jediničnu cijenu uključena glatka oplata. Ploče moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena "pod fratun". točnosti do +/- 2 mm. Obračun po m^3 ugrađenog betona.				
-	Podna ploča debljine 18,00 cm.	m^3	8,10	1.600,00	12.960,00
5.	Betoniranje AB zidova bazena/strojarnice/zidova okoliša debljine 25 cm. Betoniranje betonom C25/30 u glatkoj oplati, sa aditivima za vodonepropusnost. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m3. Zidovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. Obračun po m^3 ugrađenog betona.				
-	Beton zidova	m^3	55,40	1.600,00	88.640,00

Građevina:	oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA BAZENA	

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
6.	Betoniranje arm. betonskog dvokrakog vanjskog stubišta sa stubama. Kosa ploča stubišta debljine 30cm na podu. Betoniranje betonom C 25/30. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate te njeno podupiranje. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata. Stepenice moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena "pod fratun", točnosti do +/- 2 mm. Obračun po m³ ugrađenog betona.				
-	Beton stubišta	m³	7,80	3.500,00	27.300,00
7.	Betoniranje stepenica u bazenu betonom C25/30 u glatkoj oplati, sa aditivima za vodonepropusnost. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U stavci uključena i izrada betonske podloge za masažne ležalike unutar bazena. Obračun po m3 . U jediničnu cijenu uključena glatka oplata. Stepenice moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena "pod fratun", točnosti do +/- 2 mm. Obračun po m³ ugrađenog betona.				
-	Beton stubišta	m³	11,14	2.200,00	24.508,00
8.	Čišćenje terena na mjestu izgradnje bazena i strojarnice (oko već postojeće ploče starog bazena) kao priprema za izvođenje radova. Obračun po m2.				
-	Očišćena površina	m²	218,00	45,00	9.810,00
9.	Nabava, doprema i ugradnja sloja netkanog tekstila 300 g/m² na mjestima predviđenim projektom. Na mjestima predviđenim projektom/na zahtjev Investitora ugrađuje se sloj netkanog tekstila. Obračun po m² ugrađenog netkanog tekstila				
-	Geotextil	m²	252,00	45,00	11.340,00
10.	Strojno zbivanje materijala kao priprema za postavu podložnog betona za bazen/strojarnicu i sve pripadajuće pomoćne objekte u uređenju okoliša. Obračun po m2.				
-	Zbivena površina	m²	259,00	45,00	11.655,00
11.	Betoniranje betonskog trakastog temelja i betonske "kape" zida za šetnicu na prostoru između bazena i mora. Beton klase C25/30 u glatkoj oplati, ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m1.				
-	Dužina šetnice	m1	250,00	100,00	25.000,00
12.	Ručno betoniranje šahti oko bazena/okolnih objekta betonom klase C25/30. U stavku je uključena izrada podnih ploča gdje je bilo potrebno, zidova šahte te poklopnica šahte/vijenac. Obračun po komadu šahte.				
-	Šahte	kom	5,00	3.500,00	17.500,00

Građevina:	oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA BAZENA	

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
13.	Geodetsko praćenje visina za izradu svih AB radova oko bazena i strojarnice uključujući i okolne skale i kanale oko bazena te praćenje visina za nabivanje i nasipavanje materijala uređenja okoliša. Obračun po m2.				
-	geodetski radovi	m^2	356,00	12,00	4.272,00
14.	Betoniranja betonskog kanala oko bazena za preljev. Beton klase C25/30, ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Širina kanala 25cm, visina 40cm, ukupna širina sa zubom 50cm, a zub kanala visine/širine 10-15cm. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m1.				
-	Kanali oko bazena	m1	62,00	650,00	40.300,00
15.	Dobava, oblikovanje prema armaturnom planu i ugradba betonskog čelika srednje složenosti. Obračun po kilogramu ugrađenog čelika.				
-	RA B500B	kg	6.612,00	9,00	59.508,00
-	MA B500B	kg	9.918,00	9,00	89.262,00
16.	Ručno zidanje suhozida za šetnicu na prostoru između bazena i mora. Obračun po m1.				
-	Zid	m1	125,00	250,00	31.250,00
1.	**GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI:**				**562.337,00**
2.	**NABAVA MATERIJALA PREMA OTPREMNICAMA:**				**4.300,00**
				UKUPNO:	**566.637,00**
				PDV (25%):	**141.659,25**
				SVEUKUPNO:	**708.296,25**

Gmail **Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>**

Fwd:

Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> 7. lipnja 2021. u 16:37
Prima: marko.grzic@rudan.com

Poštovani,
u privitku maila račun sa dokaznicama, te vas molim da izvršite uplatu istog u roku od 7 dana.
Ujedno vas molim da izvršite ostatak uplate prethodnog računa.
Hvala vam

--
Lijep pozdrav!
Antonija Juričev - Talijaš
098 9103 190
Restoran pivnica " Hangar"
Ljudevita Gaja 57
22211 Vodice
makina-hangar.com
makina.hangar@gmail.com
facebook.com/HangarVodice/

Broj priloga: 12

1..pdf
104K

2.pdf
102K

3.pdf
102K

4.pdf
115K

5.pdf
109K

6.pdf
102K

8.pdf
99K

7.pdf
100K

9.pdf
98K

10.pdf
94K

BARBARA.dwg
190K

2021_VP_Racun_3_PP5_1.PDF
81K

Lp
Boško
[Citirani tekst je skriven]

Graciano Rudan <graciano@rudan.com> 8. prosinca 2021. u 13:24
Prima: Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Moramo to skupa isprivjetavati tvoji i moji.
A ako nećeš neka se nastavi postupak.., zao mi je…
Imam tu i velike primjedbe na kvalitetu.., ali o tom potom

Poslano s mojeg iPhonea

08.12.2021., u 13:17, korisnik Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> je napisao:

[Citirani tekst je skriven]

Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> 8. prosinca 2021. u 14:36
Prima: BOŠKO Kranjac <bosko.makina@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
Šalje: **Graciano Rudan** <graciano@rudan.com>
Date: sri, 8. pro 2021. 13:24
Subject: Re: Bazen
To: Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

[Citirani tekst je skriven]

Gmail Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Bazen

Broj poruka: 6

Graciano Rudan <graciano@rudan.com> 8. prosinca 2021. u 11:30
Prima: Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Boško,

Prije par dana sam dobio obavijest da si utužio onaj sporan račun za kojega je bio dogovor da ćemo isprovjeravati građevinsku knjigu do tada izvršenih radova!

Dali želiš da dođe moj nadzorni ili ostaješ pri svome da završimo na sudu?

Srdačan pozdrav,

Graciano Rudan
Član uprave

graciano@rudan.com
tel: +385 52 84 55 00
mob: +385 98 334 773
fax: +385 52 81 4333

Rudan d.o.o.
9. rujan 1/H
52341 Žminj
www.rudan.com

Svaka kap je bitna!

Molimo Vas da razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke.

Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> 8. prosinca 2021. u 12:49
Prima: BOŠKO Kranjac <bosko.makina@gmail.com>

[Citirani tekst je skriven]

BOŠKO Kranjac <bosko.makina@gmail.com> 8. prosinca 2021. u 12:56
Prima: Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Graciano ja sam vama poslao taj račun i dokaznice prije šest mjeseci, smatrao sam da ste odustali od svega jer se niste javili za to. Vi ste dužni po starom računu oko 10000 i po novom oko pedeset i nešto. Ja nisam imao namjeru vas utuživati ali moram štiti svoje poslovanje. Radove smo završili prije godinu i pol a vi se niste udostojili to riješiti. U koliko želite vi mi javite kad provjerite i ako će te platiti ja ću povući zahtjev.
[Citirani tekst je skriven]

Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> 8. prosinca 2021. u 13:17
Prima: Graciano Rudan <graciano@rudan.com>

Graciano,
Ja sam vama poslao taj račun i dokaznice prije šest mjeseci, smatrao sam da ste odustali od svega jer se niste javili za to. Vi ste dužni po starom računu oko 10000 i po novom oko pedeset i nešto. Ja nisam imao namjeru vas utuživati ali moram štiti svoje poslovanje. Radove smo završili prije godinu i pol a vi se niste udostojili to riješiti. U koliko želite vi mi javite kad provjerite i ako će te platiti ja ću povući zahtjev.

Gmail

Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

(bez naslova)

1 poruka

BOŠKO Kranjac <bosko.makina@gmail.com> 8. prosinca 2021. u 14:43
Prima: graciano@rudan.com
Cc: Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Graciano oprosti ali ako ti nisi bija u stanju u godinu i pol dana to provjeriti i izmjeriti onda nemam riječi. Što se tiče kvalitete nema problema i za to ste imali vremena uložiti prigovor i zatražiti da otklonimo eventualne nedostatke ali vi niste napravili ništa od toga a mi smo izveli sve radove na vaše osobno traženje i po vašim uputama, baz projekta i bez i kakvog papira. Sram te može biti. Ne neću povući tužbu vidimo se na sudu.

Gmail Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Re:

Broj poruka: 4

Graciano Rudan <graciano@rudan.com> 19. srpnja 2021. u 14:50
Prima: Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Poštovani Bosko,
Ako se dobro sjećate dogovoreni iznos je iznosio cca 300 tisuća kuna sto vam je avansno i placeno.
Ne trebam napominjati da je po vašem izračunu cijena narasla na dvostruko.
Unatoč svemu spreman sam da još jednom moj nadzorni Inzinjer dođe na izmjeru te da mirno riješimo nesuglasicu.
Problem je sto je navedeni gospodin u Istri i nije bas na raspolaganju kako mi se prohtije jer nije moj zaposlenik.
Covijek je već bio i utvrdio količine sukladno koje su vam i plaćene.
A ako smatrate da ste zakinuti Vi svakako dignite sudsku tužbu.
Ponavljam još jednom, nisam nikome u životu ostao dužan pa neću ni vama.

Poslano s mojeg iPhonea

> 19.07.2021., u 14:38, korisnik Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> je napisao:
>
> Poštovani ,
> U privitku vam dostavljamo traženu građevinsku knjigu te troškovnik građevinskoh radova na rekonstrukciji bazena.
> Napominjemo s obzirom da nikad niste otvorili gradilište niti imenovali voditelja gradilišta nismo bili ni dužni voditi građevinsku knjigu.
> Nadalje, nikad nam niste dostavili projekt za izvođenje radova već smo sve radove izvodili na osnovu vaših usmenih uputa.
> Kao što znate sve radove smo izveli u skladu sa pravilima struke i završili prije više od godinu dana, te vas sada lijepo molimo da izvršite plaćanje po dostavljenim obračunima i fakturama ili ćemo biti prisiljeni podnjeti tužbu za naplatu naših potraživanja.
> Lp
> Boško Kranjac

Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> 19. srpnja 2021. u 15:02
Prima: BOŠKO Kranjac <bosko.makina@gmail.com>

[Citirani tekst je skriven]

BOŠKO Kranjac <bosko.makina@gmail.com> 19. srpnja 2021. u 15:08
Prima: Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com>

Poštovani, mi nismo ništa radili bez vaseg dopuštenja dapače svi radovi koji su izvedeni su napravljeni na vaše traženje, čak smo i čekali za ispostavu zadnjeg računa jer ste vi to tražili. Poslane su vam sve izmjere, troškovnici i dokaznice, provjerite sve i onda se javite u razumnom roku. Mi smo vama odradili sve pošteno i sve što ste tražili i ne tražimo od vas ništ što nismo odradili. Pozdrav

[Citirani tekst je skriven]

Makina Hangar <makina.hangar@gmail.com> 19. srpnja 2021. u 15:18
Prima: Graciano Rudan <graciano@rudan.com>

Poštovani, mi nismo ništa radili bez vaseg dopuštenja dapače svi radovi koji su izvedeni su napravljeni na vaše traženje, čak smo i čekali za ispostavu zadnjeg računa jer ste vi to tražili. Poslane su vam sve izmjere, troškovnici i dokaznice, provjerite sve i onda se javite u razumnom roku. Mi smo vama odradili sve pošteno i sve što ste tražili i ne tražimo od vas ništ što nismo odradili.
Pozdrav

[Citirani tekst je skriven]

HANGAR UGOSTITELJSTVO d.o.o.
LJUDEVITA GAJA 57
22211 Vodice
Matični broj:04840810
Osobni identifikacijski broj (OIB)99031993004
ŽR:HR60 23400091110910758

RUDAN d.o.o.
9.rujan 1/H

52341 Žminj

Ispis otvorenih stavaka

na dan: 14.09.2021
Za konta: 1200

OIB: 84430586938

Naše poslovne knjige pokazuju na Vašem kontu slijedeće stanje, u našu odnosno Vašu korist, i da ga čine slijedeće otvorene stavke:

Svi iznosi su u HRK

Datum	Broj dokumenata i veza	Dospijeće	Konto	Ukupan iznos	U duguje SALDO	U potražuje
01.01.2021	PS RUDAN RN 17	02.04.2020	1200	10.000,00	10.000,00	0,00
15.02.2021	IR 3	15.02.2021	1200	51.447,00	51.447,00	0,00
		KONAČNO STANJE			61.447,00	0,00
		SALDO			61.447,00	

Pošiljatelj ispisa : Potvrđujem suglasnost:

HANGAR UGOSTITELJSTVO d.o.o.
Vodice, Ljudevita Gaja 57
OIB 99031993004

Mjesto:

Bilješka : Prikazanom stanju se ne slažemo u cjelosti - djelomično za iznos:

_____ iz slijedećih razloga:

Primatelj:

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: **13733-2021**

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

BORIVOJ MITRIĆ
HR-88440655792

Elektronički potpisano: 26.10.2021T16:53:33 (UTC:2021-10-26T14:53:33Z)
Izdavatelj certifikata: AKD d.o.o
Provjera: https://test.epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 652df453-bf48-4cc2-84eb-888910f8171f

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	HANGAR UGOSTITELJSTVO d.o.o.
OIB	99031993004
Adresa sjedišta	Ljudevita Gaja 57, 22211 Vodice
Punomoćnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Borivoj Mitrić
OIB	88440655792
Adresa prebivališta/sjedišta	Jerka Machieda 37, 22000 Šibenik
Pravna osnova	Odvjetnik

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	RUDAN d.o.o.
OIB	84430586938
Adresa sjedišta	9.rujan 1/H, 52341 Žminj

račun IBAN HR0924070001100334426, model HR99, s pozivom na broj 01-2021, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

RUDAN d.o.o.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Novčana tražbina po računu kod banke	Zapljena i prijenos radi naplate

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak					
Opis i tarifni broj	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Sastavljanje prijedloga	1.000,00 HRK	1	1.000,00 HRK	25,00 %	1.250,00 HRK
Ukupno					1.250,00 HRK

Trošak javnog bilježnika					
Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika	25,00 HRK	1	25,00 HRK	25,00 %	31,25 HRK
Ostatak naknade	289,47 HRK	1	289,47 HRK	25,00 %	361,84 HRK
Trošak daljnjih dostava	25,00 HRK	0	0,00 HRK	25,00 %	0,00 HRK
Ukupno					393,09 HRK

Broj zapisa: **60-6e619**

Kontrolni broj: **05b26-78ced-dfff9**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom: CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

OPIS RADOVA:
Betoniranje betonskog ophoda bazena debljine 15 cm
Obračun po m^2

SKICA I DOKAZNICA MJERA

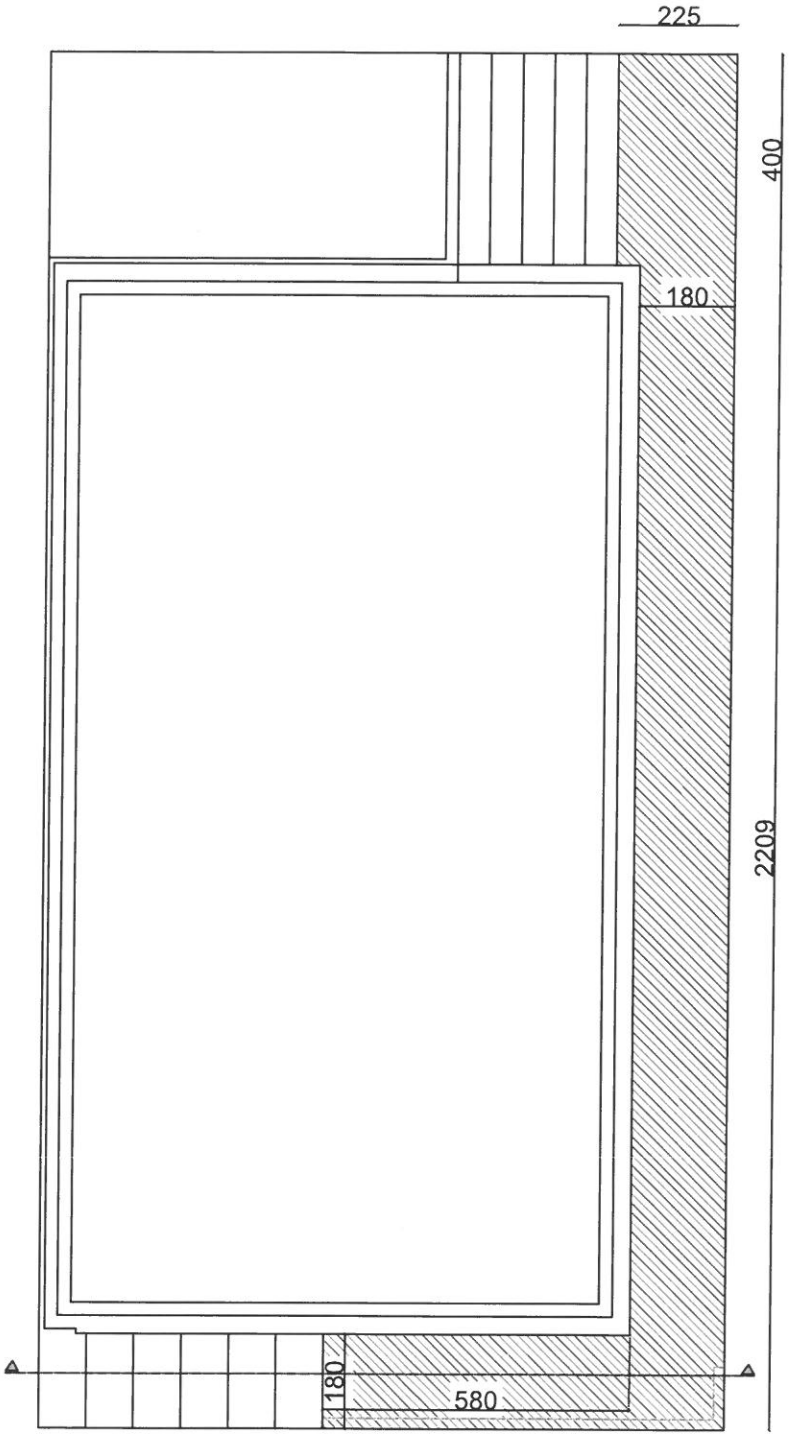

(1,80 x 5,80) + (22,09 x 1,80) + (2,25 x 4,00) =
10,44 + 39,76 + 9,00 = 53,4 m^2

OPIS RADOVA:
Betoniranje AB zida debljine 20 cm
Obračun po m^3

SKICA I DOKAZNICA MJERA

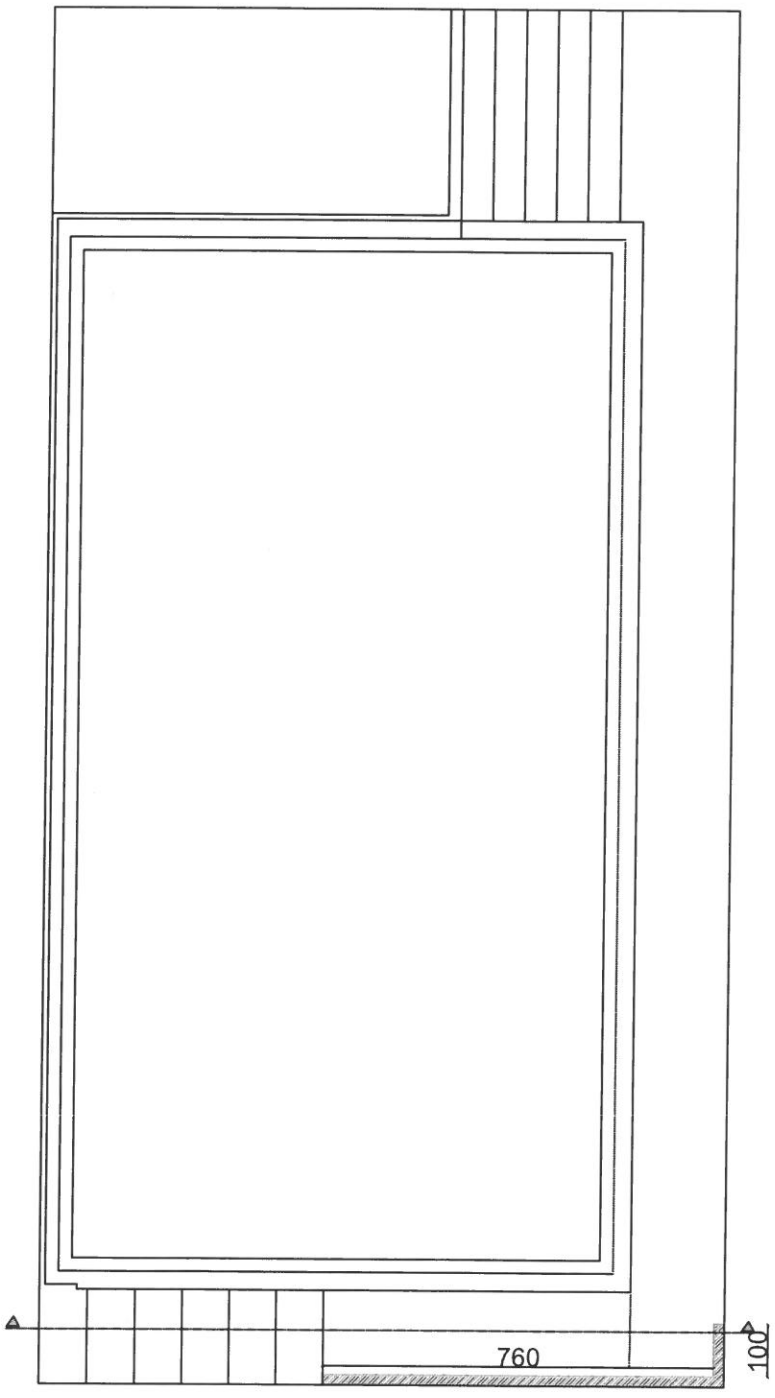

(7,60 x 0,9 x 0,20) +(1,00 x 0,9 x0,20) =
1,368 + 0,18 = 1,548 m^3

OPIS RADOVA:
Betoniranje AB temelja zida dimenzije 35 x 40 cm
Obračun po m^3

SKICA I DOKAZNICA MJERA

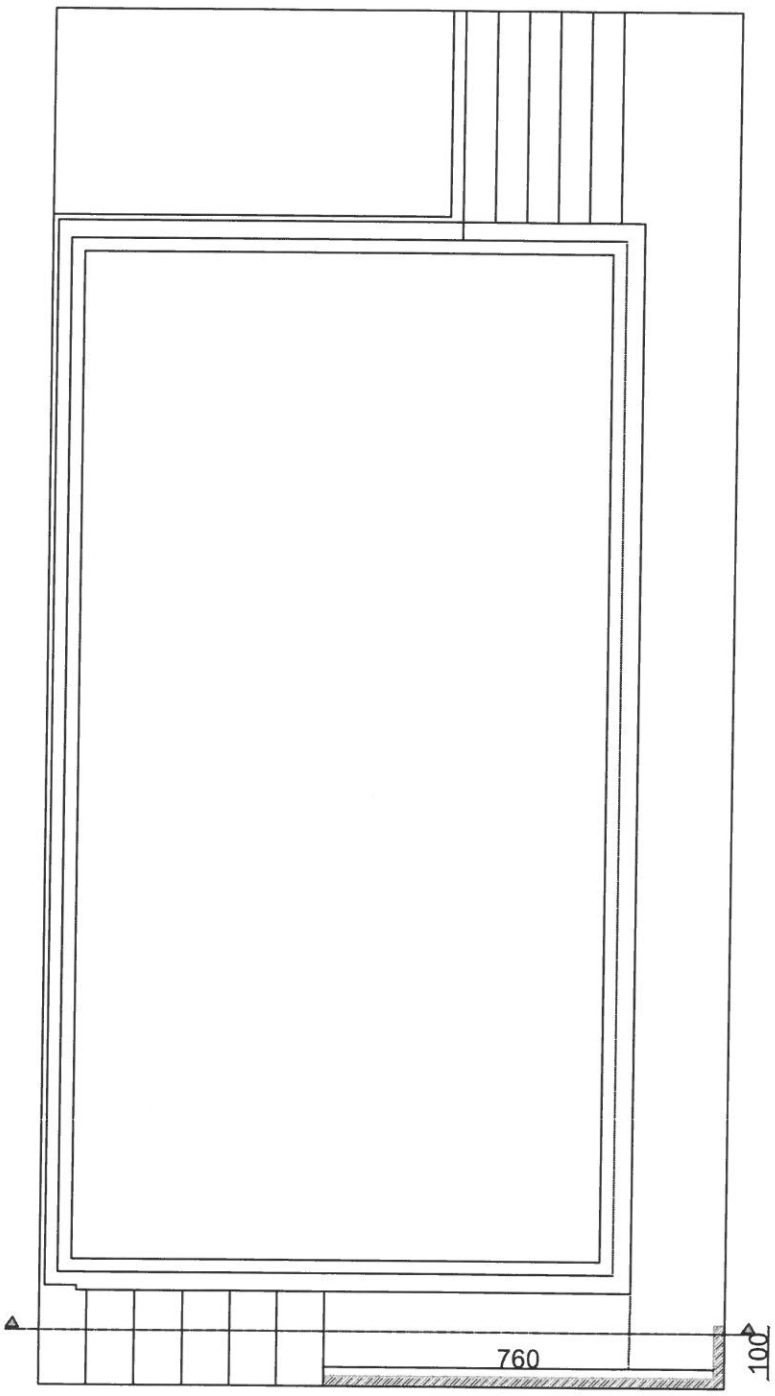

PRESJEK A-A



(7,60 x 0,35 x 0,40) +(1,00 x 0,35 x 0,40) =
1,064 + 0,14 = 1,204 m^3

OPIS RADOVA:
Postavljanje geotekstila
Obračun po m^2

SKICA I DOKAZNICA MJERA

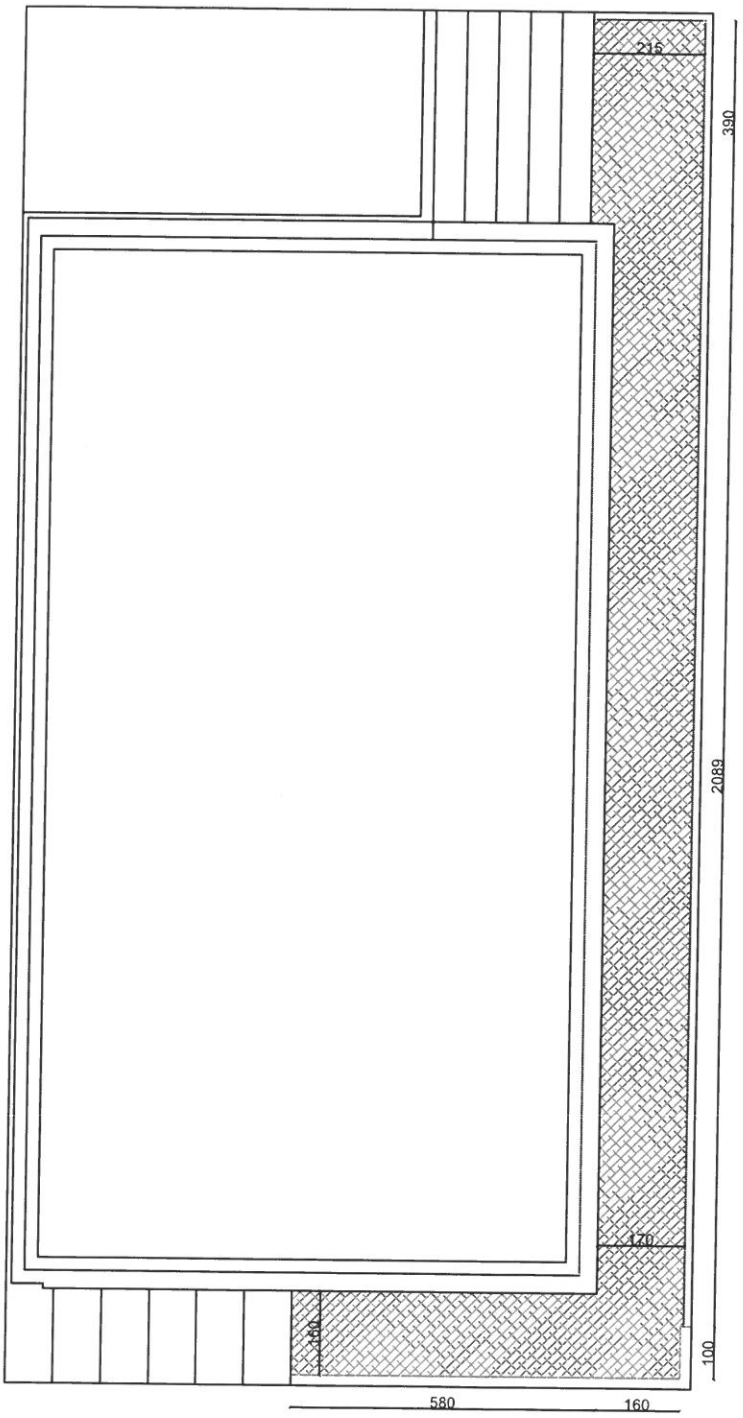

(1,60 x 5,80) + (1,60 x 1,00) + (1,70 x 20,89) +(3,90 x 2,15) =
9,28 + 1,6 + 35,51 + 8,38 = 54,77 m^2

OPIS RADOVA:
Betoniranje stubišnog kraka
Obračun po m^3

SKICA I DOKAZNICA MJERA

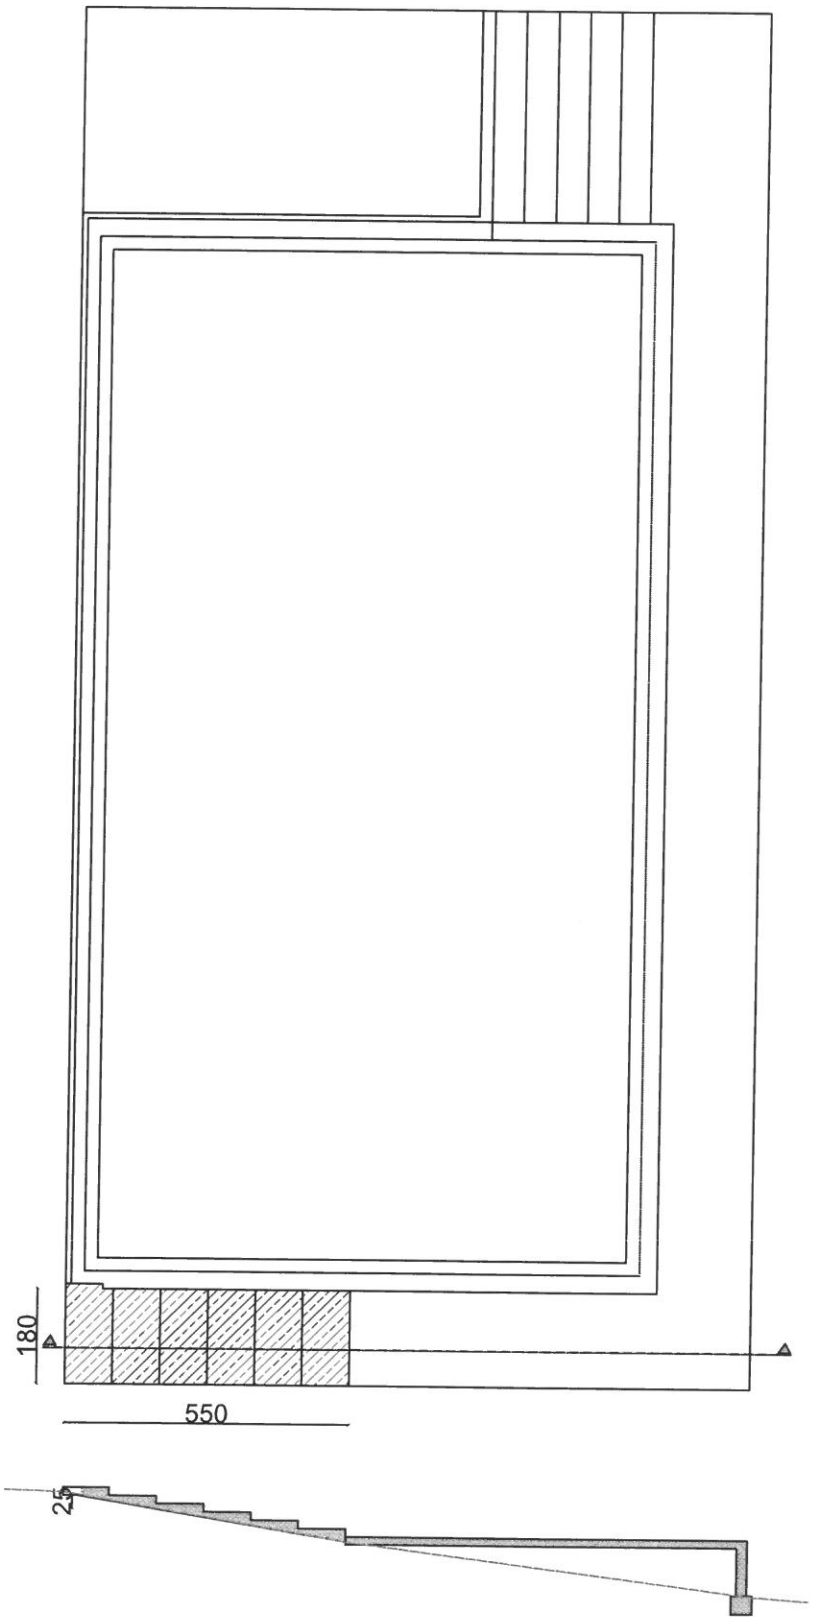

(5,50 x 1,80 x 0,25) = 2,475 m^3

OPIS RADOVA:
Betoniranje stubišnog kraka
Obračun po m^3

SKICA I DOKAZNICA MJERA

PRESJEK B-B



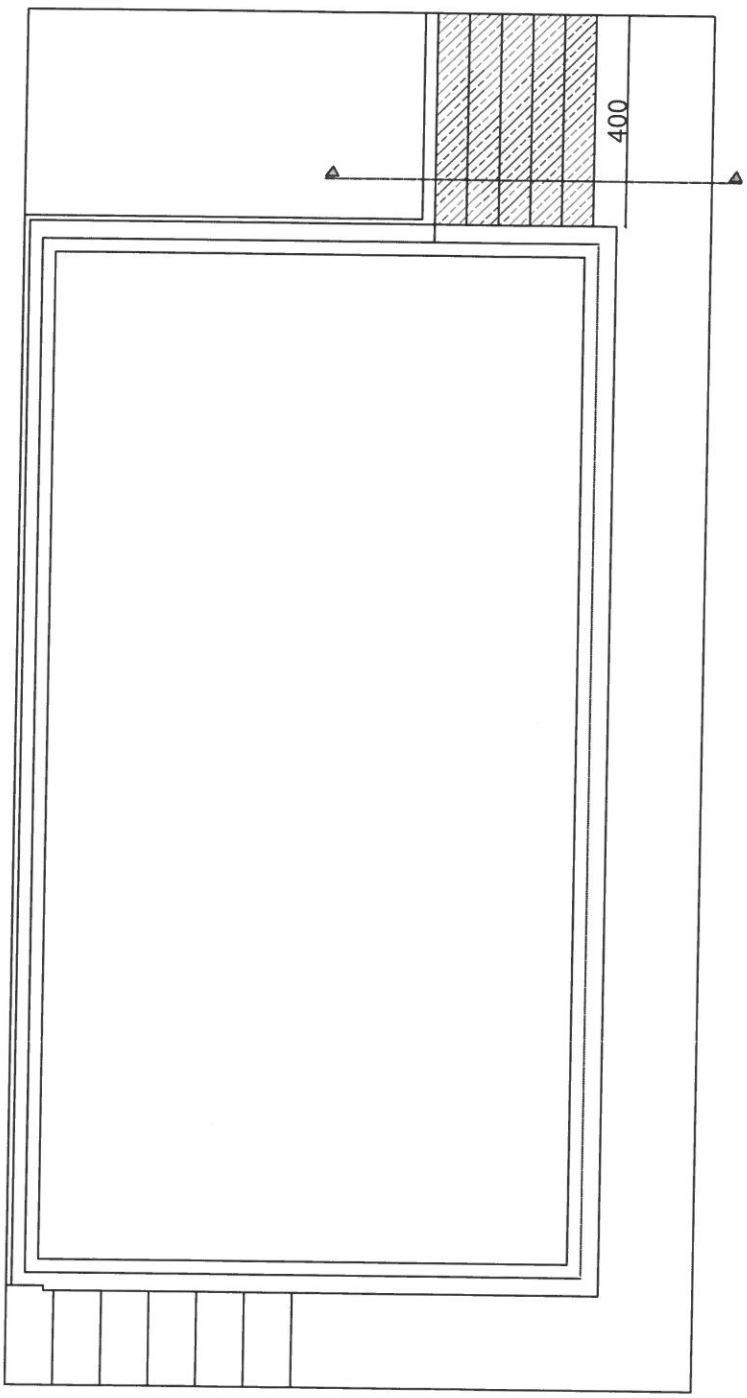

(4,00 x 3,00 x 0,25) = 3,00 m^3

OPIS RADOVA:
Betoniranje grede stubišnog kraka
Obračun po m^3

SKICA I DOKAZNICA MJERA

PRESJEK B-B

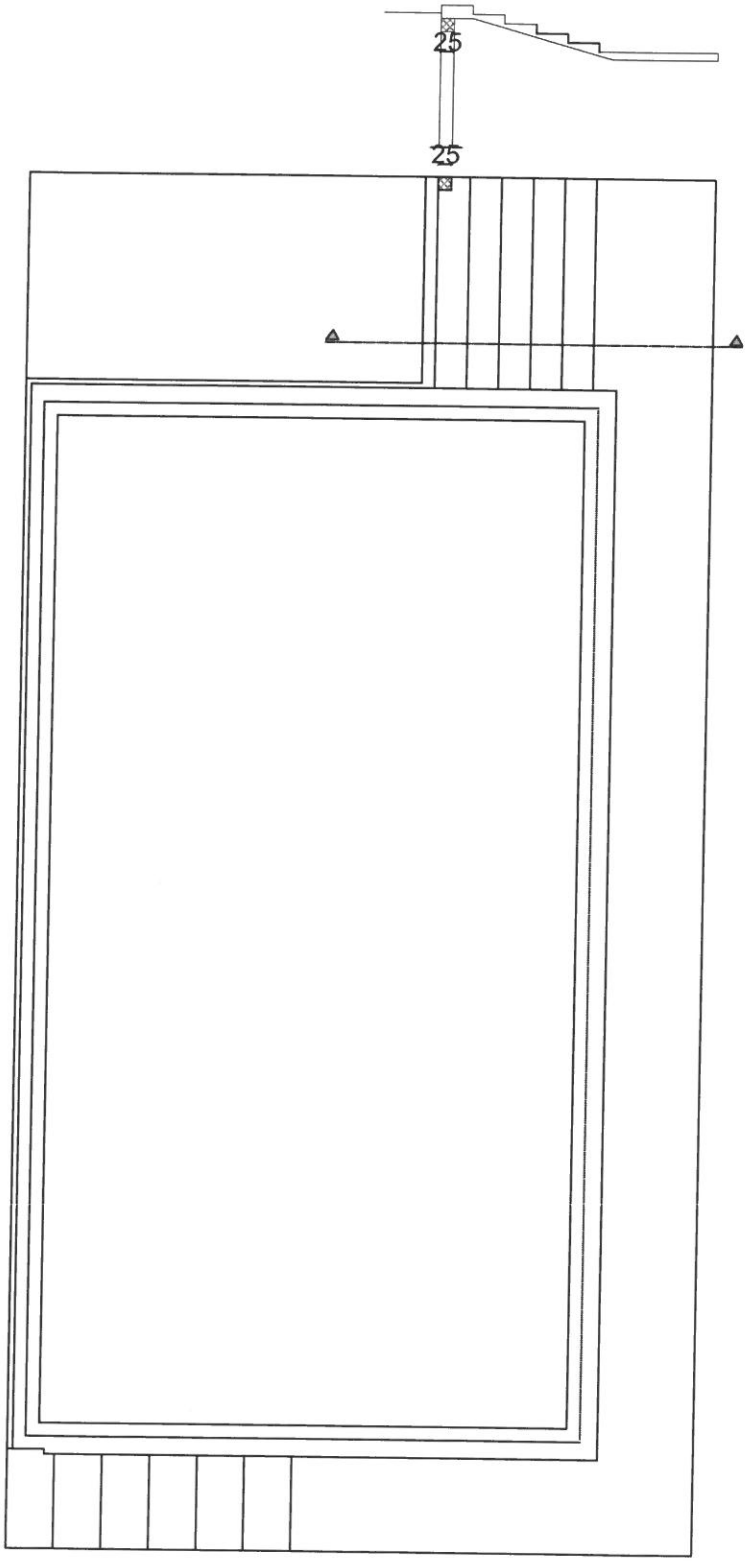

(3,00 x 0,25 x 0,25) = 0,187 m^3

OPIS RADOVA:
Betoniranje grede stubišnog kraka
Obračun po m^3

SKICA I DOKAZNICA MJERA

PRESJEK B-B



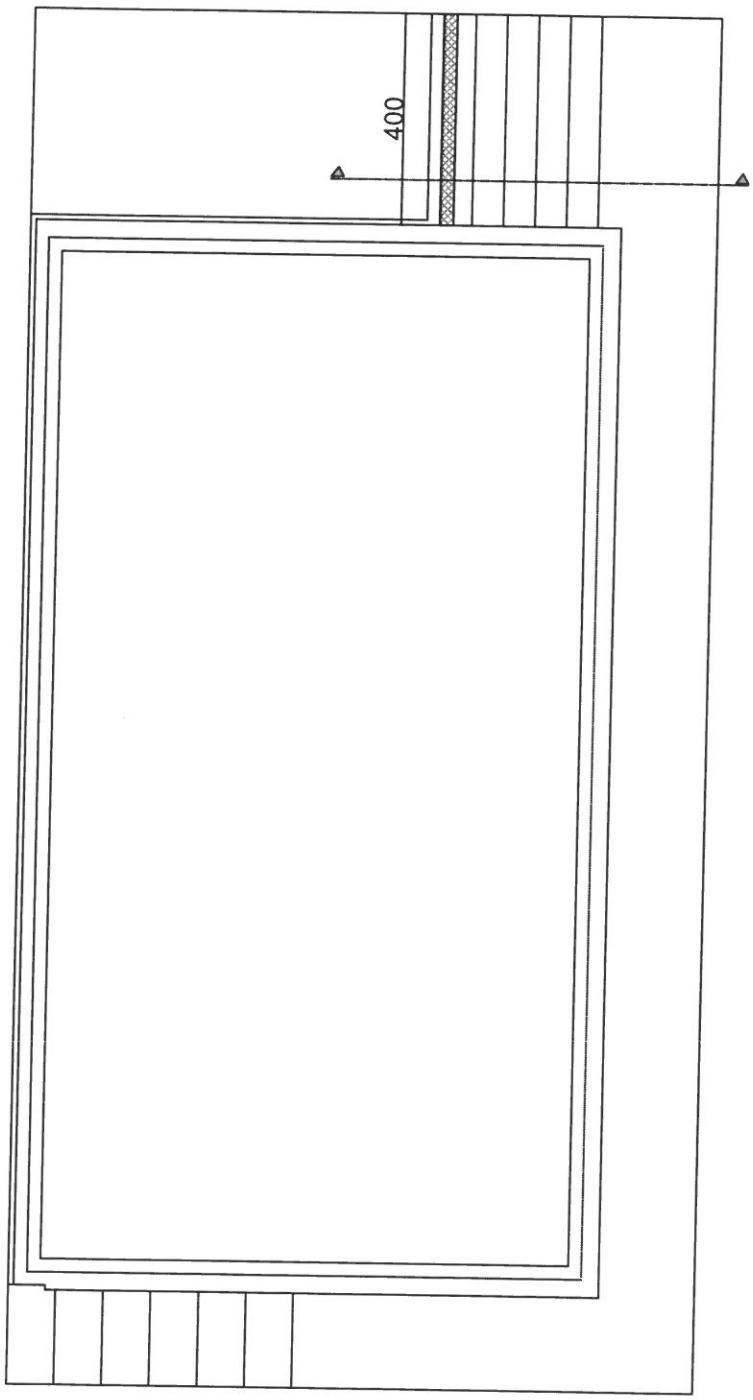

(4,00 x 0,25 x 0,25) = 0,25 m^3

OPIS RADOVA:
Betoniranje temelja stubišnog kraka
Obračun po m^3

SKICA I DOKAZNICA MJERA

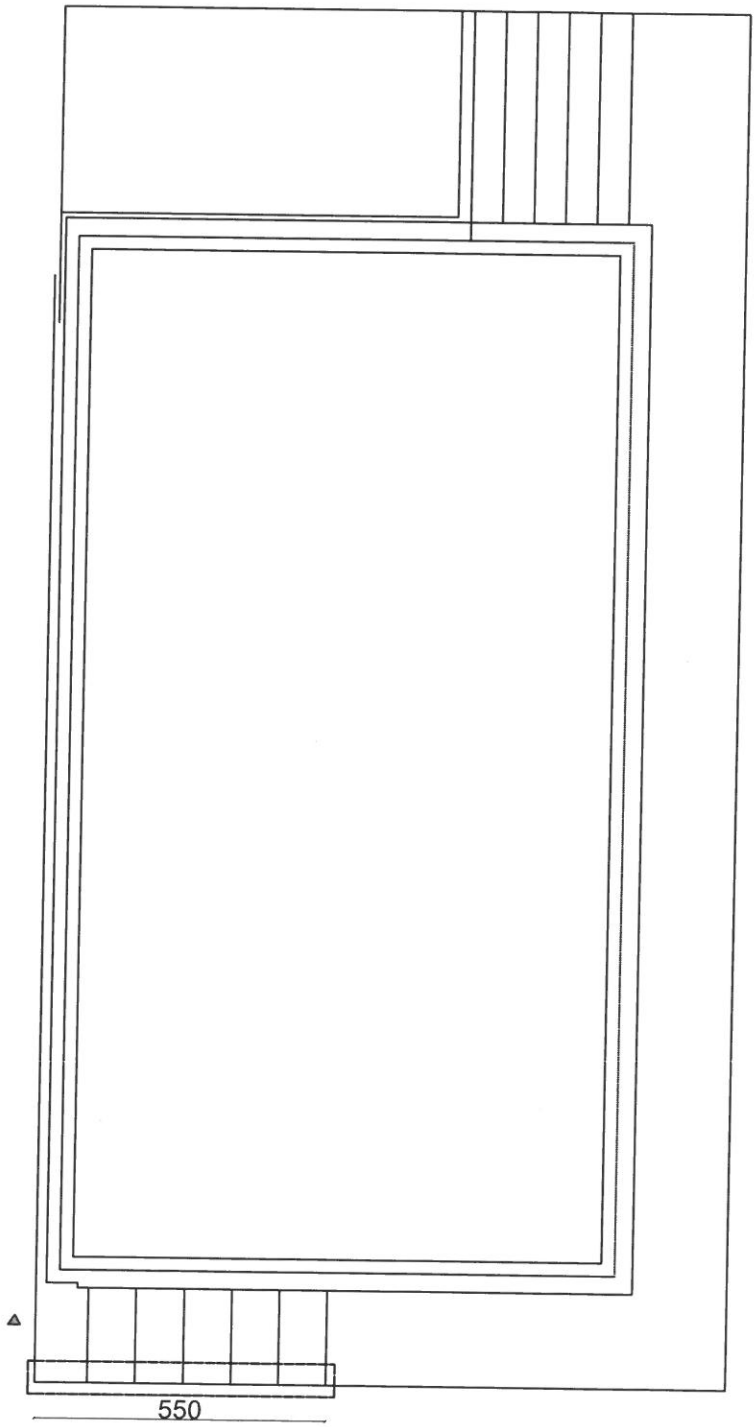

(5,50 x 0,40 x 0,25) = 0,55 m^3

OPIS RADOVA:
Ugradba ankera "L" profila (40 cm) postavljani svakih 30 cm
Obračun po ugrađenom komadu

SKICA I DOKAZNICA MJERA

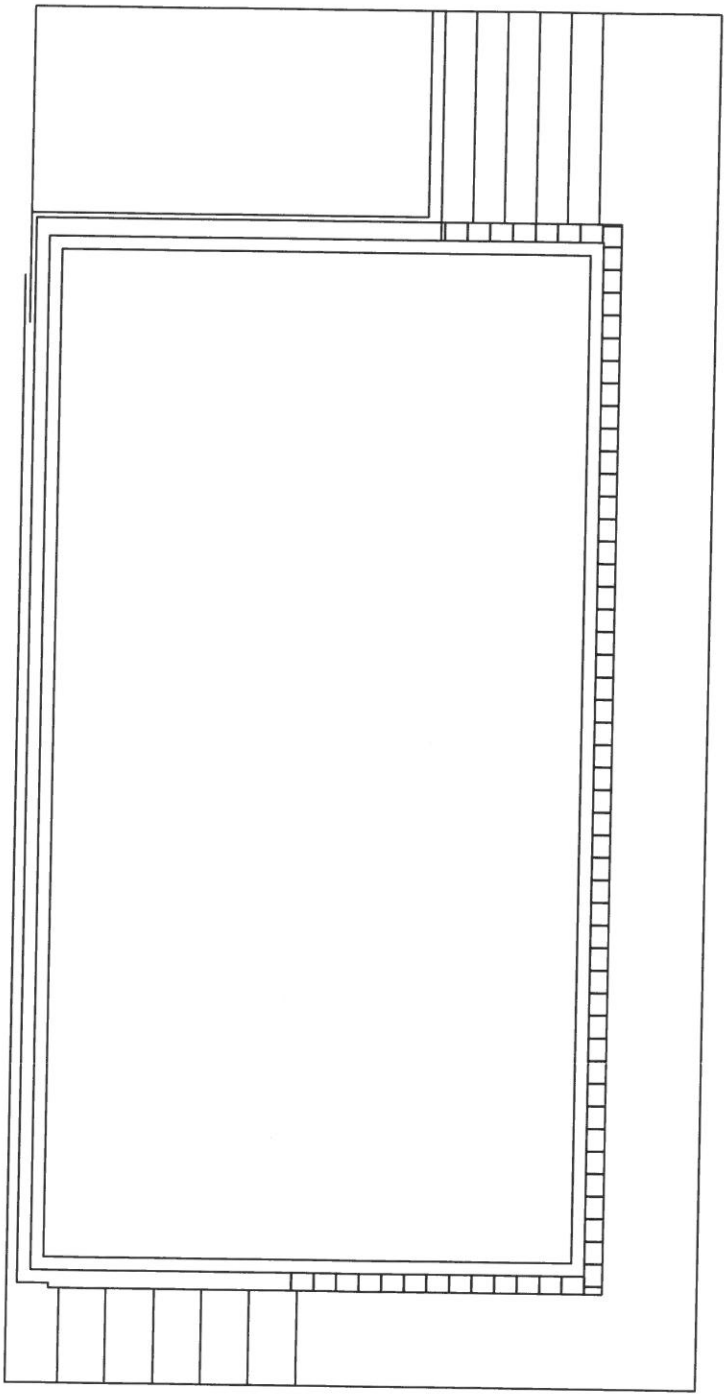

70 kom

ANGAR GRADITELJSTVO D.O.O.
JUDEVITA GAJA 57
R-22211 VODICE
IBAN račun: HR6023400091110910758

PP5-HANGAR KERAMIK
HR-22211 VODICE, LJUDEVITA GAJA 6
tel. 0989103190
e:makina.hangar@gmail.com
OIB:99031993004

VP Račun broj: 3/VP-PP5/1

RUDAN D.O.O.

LUKOVICA BB
52341 ŽMINJ

t: 052845500 f: 052814333 e: marko.grzic@rudan.com

Datum izdavanja:	**15.02.2021 18:17**
Datum isporuke (PDV):	**15.02.2021**
Valuta plaćanja:	**15.02.2021 (odmah)**
Mjesto izdavanja:	**VODICE**
Skladište:	PP5-Glavno skladište
Način otpreme:	**Kupac sam preuzima robu**
OIB kupca:	**84430586938, šifra:36**

Šifra	Naziv proizvoda ili usluge	Količina		PDV	Cijena	Iznos
1	ŠALOVANJE I BETONAŽA TROTOARA	8,37	M3	0%	1.600,00	13.392,0
1	ŠALOVANJE I BETONAŽA ZIDA	1,54	M3	0%	1.600,00	2.464,0
1	BETONAŽA TEMELJA ZIDA	1,2	M3	0%	1.200,00	1.440,0
1	TAMPONIRANJE I IZBIJANJE PODLOGE ZA TROTOAR	55,8	M2	0%	45,00	2.511,0
1	DOBAVA I POSTAVA GEOTEKSTILA	55	M2	0%	15,00	825,0
1	ŠALOVANJE , ARMIRANJE I BETONIRANJE STEPENICA	2,5	M3	0%	3.500,00	8.750,0
1	ŠALOVANJE, ARMIRANJE I BETONIRANJE ŠIROKIH STEPENICA	3	M3	0%	3.500,00	10.500,0
1	BETONIRANJE I ŠALOVANJE STUPA I GREDE STEPENICA	0,5	M3	0%	1.600,00	800,0
1	BETONIRANJE TEMELJA STEPENICA	0,75	M3	0%	1.200,00	900,0
1	POSTAVA ANKERA	93	KOM	0%	25,00	2.325,0
1	DOBAVA I POSTAVA ARMATURE	560	KG	0%	9,00	5.040,0
1	DOBAVA KAMENA (ZA ANTU) PAUŠAL	1	KOM	0%	2.500,00	2.500,0
		782,66			Ukupno:	51.447,0

Poziv na broj: 01 36-535000003-6

Slovima: pedesetjednatisuća četristočetrdesetsedam kuna

SVEUKUPNO Kn: 51.447,0(

NAPOMENA: Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.,čl.79.st.9 zakona o PDV-u
Način plaćanja: VIRMANSKI NA TRANSAKCIJSKI RAČUN HR6023400091110910758

Izvorne otpremnice: 3,

Registriran kod TS Zadar, SS Šibenik MBS 110076726. Temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cijelosti. Član uprave Antonija Juričev-Talijaš

Dokument izradio/Operater: Antonija Juričev Talijas

M.P.

Preuzeo: _____

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marina Paić-Čerin
Olge Ban 8, Pula
OIB: 87902022150, VAT ID: HR87902022150
Tel: 052/215-311, 380-605, Email: marina.paic-cerin@notar-cerin.hr

U Puli, 30.11.2021. 11:13

HANGAR UGOSTITELJSTVO d.o.o.
Ljudevita Gaja 57
22211 Vodice

Datum isporuke: 30.11.2021.
Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospijeća: 08.12.2021.

RAČUN Br. 795/1/2

OIB stranke: 99031993004

Rb	Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
1.	Ovršni postupak UPP/OS-Ovrv-32/2021 Ovršenik: RUDAN d.o.o. (OIB: 84430586938)	1	289,47 kn	0,00 kn	72,37 kn	0,00 kn	0,00 kn	361,84 kn
Ukupno			289,47 kn	0,00 kn	72,37 kn	0,00 kn	0,00 kn	361,84 kn

Porezna osnovica (nagrada i trošak)	289,47 kn
PDV (25%)	72,37 kn
UKUPNO ZA PLATITI	**361,84 kn**

Poziv na broj: 00 795-2021
Račun za uplatu: HR2224840081500194872

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Operater: SZ

Javni bilježnik
Marina Paić-Čerin

Napomena: Ovaj je račun izdan računalom te je stoga pravovaljan bez pečata i potpisa.
