


JV: Werkos d.o.o.
 Fracasso RI
 Godina d.o.o.



ДРУШТВО ЗА АУТОЧЕЛСТЕ У РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ Д.О.О.	
11-2013	СТОРИТЕВ
13	ПРИЛОЖЕ

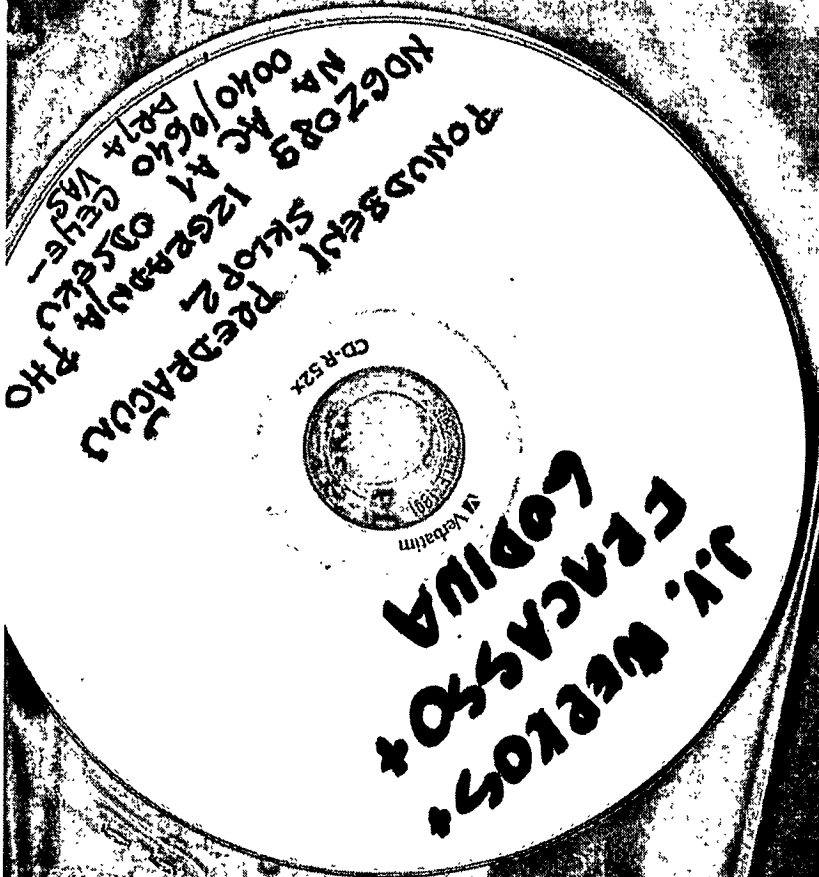

NAROČNIK:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d. 3000 Celje , Ulica XIV.Divizije 4
Izpostava Ljubljana
Dunajska 7
1000 Ljubljana

PONUDBA št.: N047/13 - JV

PONUDBNIKI:

JV: Werkos d.o.o.- Osijek , Osijek , Hrvaška
Fracasso RI d.o.o., Rijeka , Hrvaška
Godina d.o.o. , Kozina , Slovenija

Zadeva : Ponudba za javni razpis » Gradnjo protihrupnih ograj na AC – A1
odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640
Celje – Arja vas (sklop 2) «

Skladno z javnim razpisom , vam v prilogi pošiljamo ponudbo za : Gradnjo
protihrupnih ograj na AC – A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku
0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2) « .

Lep pozdrav.

Osijek , 28.november 2013.

Podpis ponudnika:

Priloga:

- ponudba

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (10)

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (10)

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (10)

11/07

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

ZA TUJE PONUDNIKE

1.

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

MŠS: 030016616

OIŠ: 84820806875

FIRMA/IME:

10 WERKOS Družba z omejeno odgovornostjo za inženiring v gradbeništvu

1 WERKOS d.o.o. - OSIJEK

SEDEŽ/NASLOV:

23 Osijek (Mesto Osijek)
Ulica borová 6

PRAVNO ORGANIZACIJSKA OBLIKA:

1 družba z omejeno odgovornostjo

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 45 | - Gradbeništvo |
| 1 | 70 | - Poslovanje z nepremičninami |
| 1 | 72 | - Računalniške in sorodne dejavnosti |
| 1 | 74.13 | - Raziskovanje trga in javnega mnenja |
| 1 | 74.14 | - Podjetniško in poslovno svetovanje |
| 1 | 74.40 | - Oglaševanje (reklama in propaganda) |
| 1 | * | - specializirana trgovina na drobno s stenskim tapetami, talnimi oblogami in sredstvi za čiščenje |
| 2 | 17.5 | - Proizvodnja drugih tekstilnih izdelkov |
| 2 | 25.2 | - Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas |
| 2 | * | - svetovanje in poslovi arhitekture |
| 2 | * | - ustanovitev in izdelava načrta (projektiranje) stavb |
| 2 | * | - nadzor nad gradnjo |
| 2 | * | - izdelava načrta strojev in industrijskih obratov |
| 2 | * | - inženiring, projektni management in tehnične dejavnosti |
| 2 | * | - inženiring na področju nizkogradenj, hidravlike, prometa, sistemski inženiring in varnostni inženiring |
| 2 | * | - razvoj in izvajanje projektov s področja gradbeništva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike in industrije |
| 2 | * | - izdelava investicijske dokumentacije, izdelava tehnološke dokumentacije in tehnični nadzor |
| 2 | * | - izdelava projektov za kondicioniranje zraka, hlajenje, projektov za sanitarno kontrolo in kontrolo onesnaževanja in projektov akustičnosti |

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 1 od 7

/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

16

/podpis nečitljiv/

24.10.2013

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

/besedilo pečatol
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---------|--|
| 2 | * | - geološke in raziskovalne dejavnosti: površinske meritve in opazovanja, namenjeno za ponujanje informacij o podzemnih strukturah in lokaciji podzemnih nahajališč nafte, zemeljskega plina, mineralov in podzemnih voda |
| 2 | * | - izdelava podlog in geodetskih elaboratov, izdelava parcelacijskih elaboratov |
| 3 | 14.1 | - pridobivanje kamna |
| 3 | 14.2 | - pridobivanje gramoza, peska in gline |
| 3 | 17.40 | - proizvodnja gotovih tekstilnih izdelkov (razen oblačil) |
| 3 | 26.6 | - proizvodnja izdelkov iz betona, mavca itd. |
| 3 | 28.11 | - proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov |
| 3 | 33.3 | - proizvodnja opreme za kontrolo ind. procesa |
| 3 | 52.5 | - trgovina na drobno z rabljenim blagom |
| 3 | 52.6 | - trgovina na drobno zunaj prodajaln |
| 3 | 52.7 | - popravilo izdelkov za osebno rabo in gospodinjstvo |
| 3 | 71.32 | - najem strojev in opreme za gradbeništvo in inženirstvo |
| 3 | 95 | - ZAPOSLENA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM |
| 5 | * | - Storitve izterjave terjatve |
| 8 | * | - Nakup in prodaja blaga razen orožja, streliva, zdravil in strupov na domačem in tujem trgu |
| 8 | * | - opravljanje trgovskega posredovanja na domačih in tujih trgih |
| 9 | * | - izvajanje investicijskih del v tujini |
| 11 | 55.1 | - hoteli |
| 11 | 55.21 | - planinski domovi in mladinska prenočišča |
| 11 | 55.22 | - kampi, vključno tudi za stanovanjske prikolice |
| 11 | 55.23.1 | - Druge nastanitve za bivanje turistov |
| 11 | 55.23.4 | - Druge nastanitve |
| 11 | 55.3 | - Restavracije |
| 11 | 55.4 | - Bari |
| 11 | 55.5 | - Kantine (menze) in oskrba s pripravljeno hrano (catering) |
| 11 | 61.10.1 | - pomorski in obalni potniški promet |
| 11 | 61.10.2 | - pomorski in obalni prevoz blaga |
| 11 | 61.10.3 | - taksi prevoz na vodi |
| 11 | 61.2 | - prevoz po notranjih plovniških poteh |
| 11 | 71.22 | - dajanje plovila v najem |
| 14 | * | - strokovni poslovi za varstvo okolja |
| 16 | * | - vodenje računovodskih poslov |
| 18 | * | - svetovanje o računalniški strojni opremi (hardver) |
| 18 | * | - svetovanje in opremljanje s programsko opremo (softver) |
| 18 | * | - obdelovanje podatkov |
| 18 | * | - dejavnosti, povezane z bazami podatkov |
| 18 | * | - ocenjevanje skladnosti proizvodnje hrane ter izdelkov z geografsko označbo, označbo porekla in označbo tradicionalnega ugleda |
| 18 | * | - laboratorijska analiza vzorcev zdravstvene |

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 2 od 7

24.10.2013

/besedilo pečatol
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

4/107

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠĆE V OSIJEKU

/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠĆE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---|--|
| | * | varnosti in kakovosti hrane |
| 18 | * | - proizvodnja in uvoz sadilnega materijala (sadike sadnih dreves, sadike vinske trte in okrasnih rastlin) |
| 18 | * | - tehnično in gospodarsko vzdrževanje vodnih virov, regulatornih in vodnih objektov in naprav |
| 18 | * | - tehnično in gospodarsko vzdrževanje melioracijskih sistema za odvodnjavanje in nadvodnjavanje |
| 18 | * | - tehnična dela potrebna za nadzor od poplav in drugih oblik zaštite za preprečavanje škodljivog delovanja voda in rokovanje s sistemom za navodnjavanje na vodah I. vrstnega reda (državne vode) in na vodah II. vrstnega reda (lokalne vode) |
| 18 | * | - urejanje vodotokov in drugih voda na vodah (regulacijska dela) na vodah I. vrstnega reda (državne vode) in na vodah II. vrstnega reda (lokalne vode) |
| 19 | * | - storitve ureditve in vzdrževanje krajine |
| 19 | * | - hidro sejanje |
| 21 | * | - zbiranje in prevoz na trajno odstranjevanje nenavnih in navnih odpadkov |
| 24 | * | - upravljanje in vzdrževanje stavb |
| 24 | * | - cestni tovorni promet |
| 24 | * | - prekladanje in skladišćenje tovara |
| 24 | * | - druge podporne dejavnosti v cestnem prometu |

USTANOVITELJI/ČLANI DRUŽBE:

- 24 Petar Velicki,
Osijek, Ružina 121
24 - edini član d.o.o.

OSEBE POOBlašĆENE ZA ZASTOPANJE:

- 24 Petar Velicki,
Osijek, Ružina 121
24 - član uprave
24 - direktor
24 - zastopa družbo samostojno in neomejeno.

OSNOVNI KAPITAL:

- 24 23.808.600,00 HRK

PRAVNI ODNOSI:

Ustanovitveni akt:

- 1 Izjava o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala s Zakonom o trgovinskih družbah z dne 18.12. 1995.
- 2 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju z dne 25.03.1996 leta.
- 3 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala s Zakonom o trgovinskih družbah z dne 25.03. 1998 leta, ki se nanaša na spremembo predmeta poslovanja i članov uprave.

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 3 od 7

24.10.2013

/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠĆE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

16
/podpis nečitljiv/

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---------|--|
| 2 | * | - geološke in raziskovalne dejavnosti: površinske meritve in opazovanja, namenjeno za ponujanje informacij o podzemnih strukturah in lokaciji podzemnih nahajališč nafte, zemeljskega plina, mineralov in podzemnih voda |
| 2 | * | - izdelava podlog in geodetskih elaboratov, izdelava parcelacijskih elaboratov |
| 3 | 14.1 | - pridobivanje kamna |
| 3 | 14.2 | - pridobivanje gramoza, peska in gline |
| 3 | 17.40 | - proizvodnja gotovih tekstilnih izdelkov (razen oblačil) |
| 3 | 26.6 | - proizvodnja izdelkov iz betona, mavca itd. |
| 3 | 28.11 | - proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov |
| 3 | 33.3 | - proizvodnja opreme za kontrolo ind. procesa |
| 3 | 52.5 | - trgovina na drobno z rabljenim blagom |
| 3 | 52.6 | - trgovina na drobno zunaj prodajaln |
| 3 | 52.7 | - popravilo izdelkov za osebno rabo in gospodinjstvo |
| 3 | 71.32 | - najem strojev in opreme za gradbeništvo in inženirstvo |
| 3 | 95 | - ZAPOSLENA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM |
| 5 | * | - Storitve izterjave terjatve |
| 8 | * | - Nakup in prodaja blaga razen orožja, streliva, zdravil in strupov na domačem in tujem trgu |
| 8 | * | - opravljanje trgovskega posredovanja na domačih in tujih trgih |
| 9 | * | - izvajanje investicijskih del v tujini |
| 11 | 55.1 | - hoteli |
| 11 | 55.21 | - planinski domovi in mladinska prenočišča |
| 11 | 55.22 | - kampi, vključno tudi za stanovanjske prikolice |
| 11 | 55.23.1 | - Druge nastanitve za bivanje turistov |
| 11 | 55.23.4 | - Druge nastanitve |
| 11 | 55.3 | - Restavracije |
| 11 | 55.4 | - Bari |
| 11 | 55.5 | - Kantine (menze) in oskrba s pripravljeno hrano (catering) |
| 11 | 61.10.1 | - pomorski in obalni potniški promet |
| 11 | 61.10.2 | - pomorski in obalni prevoz blaga |
| 11 | 61.10.3 | - taksi prevoz na vodi |
| 11 | 61.2 | - prevoz po notranjih plovnih poteh |
| 11 | 71.22 | - dajanje plovila v najem |
| 14 | * | - strokovni poslovi za varstvo okolja |
| 16 | * | - vodenje računovodskih poslov |
| 18 | * | - svetovanje o računalniški strojni opremi (hardver) |
| 18 | * | - svetovanje in opremljanje s programsko opremo (softver) |
| 18 | * | - obdelovanje podatkov |
| 18 | * | - dejavnosti, povezane z bazami podatkov |
| 18 | * | - ocenjevanje skladnosti proizvodnje hrane ter izdelkov z geografsko označbo, označbo porekla in označbo tradicionalnega ugleda |
| 18 | * | - laboratorijska analiza vzorcev zdravstvene |

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 2 od 7

24.10.2013

/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

4/407

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---|---|
| 18 | * | varnosti in kakovosti hrane |
| 18 | * | - proizvodnja in uvoz sadilnega materijala (sadike sadnih dreves, sadike vinske trte in okrasnih rastlin) |
| 18 | * | - tehnično in gospodarsko vzdrževanje vodnih virov, regulatornih in vodnih objektov in naprav |
| 18 | * | - tehnično in gospodarsko vzdrževanje melioracijskih sistema za odvodnjavanje in nadvodnjavanje |
| 18 | * | - tehnična dela potrebna za nadzor od poplav in drugih oblik zaštite za preprečevanje škodljivega delovanja voda in rokovanje s sistemom za navodnjavanje na vodah I. vrstnega reda (državne vode) in na vodah II. vrstnega reda (lokalne vode) |
| 18 | * | - urejanje vodotokov in drugih voda na vodah (regulacijska dela) na vodah I. vrstnega reda (državne vode) in na vodah II. vrstnega reda (lokalne vode) |
| 19 | * | - storitve ureditve in vzdrževanje krajine |
| 19 | * | - hidro sejanje |
| 21 | * | - zbiranje in prevoz na trajno odstranjevanje nenavnih in navnih odpadkov |
| 24 | * | - upravljanje in vzdrževanje stavb |
| 24 | * | - cestni tovorni promet |
| 24 | * | - prekladanje in skladiščenje tovara |
| 24 | * | - druge podporne dejavnosti v cestnem prometu |

USTANOVITELJI/ČLANI DRUŽBE:

- 24 Petar Velicki,
Osijek, Ružina 121
24 - edini član d.o.o.

OSEBE POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE:

- 24 Petar Velicki,
Osijek, Ružina 121
24 - član uprave
24 - direktor
24 - zastopa družbo samostojno in neomejeno.

OSNOVNI KAPITAL:

- 24 23.808.600,00 HRK

PRAVNI ODNOSI:

Ustanovitveni akt:

- 1 Izjava o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala s Zakonom o trgovinskih družbah z dne 18.12. 1995.
- 2 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju z dne 25.03.1996 leta.
- 3 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala s Zakonom o trgovinskih družbah z dne 25.03. 1998 leta, ki se nanaša na spremembo predmeta poslovanja i članov uprave.

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 3 od 7

24.10.2013

/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

/besedilo pečatal
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

IZPIS EK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

PRAVNI ODNOSI:

Ustanovitveni akt:

- 4 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z dne 16. septembra 1998 leta, ki se nanaša na spremembo članov uprave.
- 5 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z dne 09.03.1999, ki se nanaša na spremembo predmeta poslovanja in članov uprave.
- 6 Izjava z dne 10.03.2000 leta, o spremembi 4. člena in 7. člena Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 18.12.1995, ki se nanašajo na spremembo predmeta poslovanja in članov uprave.
- 7 Izjava z dne 09.04.2001 leta o spremembi 7. čl. Izjave o usklajevanju z dne 18.12.1995 leta, ki se nanaša na spremembo članov uprave in spremembo funkcije članov uprave.
- 8 Izjava o spremembi Izjave z dne 29.08.2002 leta, s katero se spremenijo določbe o predmetu poslovanja in osnovni kapital.
- 9 Izjava z dne 29.04.2003 leta o spremembi 4. čl. Izjave o usklajevanju, ki se nanaša na spremembo predmeta poslovanja.
- 10 Izjava o spremembi Izjave z dne 05.11.2003 leta s katero se spremenijo določbe o firmi.
- 11 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju z dne 25.11.2003 leta, ki se nanaša na spremembo predmeta poslovanja.
- 12 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju z dne 20. februarja 2004 leta, ki se nanaša na povečanje osnovnega kapitala.
- 13 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 13.12.2004 leta s katero se spremeni sedež družbe.
- 14 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 04.02.2005 leta s katero se spremeni predmet poslovanja družbe.
- 15 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 25.05.2005 leta v kateri se natančno ureja določba glede izplačila dobička v družbi.
- 16 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 20.07.2006 leta s katero se dopolnjuje predmet poslovanja-dejavnosti.
- 17 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 06.02.2007 leta, ki se nanaša na spremembo 9.čl., oziroma ustanavljanje podružnic.
- 18 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 19.03.2007 leta, ki se nanaša na spremembo predmeta poslovanja, s katero je spremenjen 4. čl. temeljnega akta.
- 19 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 27.03.2007 leta, ki se nanaša na spremembo predmeta poslovanja, s katero je spremenjen 4. čl. temeljnega akta.
- 20 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju z dne 30.12.2008 leta, ki se nanaša na spremembo 5. čl. temeljnega akta, oziroma povečanje osnovnega kapitala.
- 21 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju z dne 23.02.2009 leta

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 4 od 7

24.10.2013

/besedilo pečatal
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/

6/407

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

*/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU*

16
/podpis nečitljiv/

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

PRAVNI ODNOSI:

Ustanovitveni akt:

- ki se nanaša na spremembo 4. člena temeljnega akta, oziroma dopolnilo predmeta poslovanja
- 22 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 20.06.2011 leta, ki se nanaša na spremembo 5. čl. temeljnega akta – povečanje osnovnega kapitala.
- 24 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 15.01.2013 leta, v kateri se v 4. čl. opisujejo nove dejavnosti, v 5. čl. opisuje povečani osnovni kapital in v 7. čl. se spremenijo osebni podatki članov družbe. Prečiščeni tekst Izjave se dostavi Trgovskemu sodišču v Osijeku.

Spremembe osnovnega kapitala:

- 8 Osnovni kapital povečan je iz dobička družbe za znesek 1.100.000,00 HRK
- 20 Osnovni kapital se poveča iz zneska 5.296.600,00 HRK za znesek 13.422.000,00 HRK, tako da sedaj znaša 18.718.600,00 HRK in to z vnosom prava – patenta ocenjenih po revizijski hiši PLESLIĆ-REVIZIJA d.o.o. in to konsenzualnega patenta PK 20050807 »zložljiva mrežasta konstrukcija« in konsenzualnega patenta PK 20040756 »vodna pregrada« - sistem za zaščito škodljivega delovanja vode
- 22 Osnovni kapital se poveča iz zneska 18.718.600,00 HRK za znesek 5.000.000,00 HRK, tako da sedaj znaša 23.718.600,00 HRK in to s pretvorbo rezervi iz dobička družbe v osnovni kapital, s povečanjem sedanjega deleža na podlagi revidiranega letnega računovodskega izkaza za 2010 leto revizorja PLESLIĆ-REVIZIJA d.o.o. št. REV-18005/10 z dne 10.06.2011.
- 23 Izjava o spremembi Izjave o usklajevanju splošnih aktov in osnovnega kapitala z Zakonom o trgovinskih družbah z dne 13.03.2012 leta, s katero se v 3. čl. spremeni naslov družbe.
- Prečiščeni tekst je pošiljan Trgovskemu sodišču v Osijeku.
- 24 Osnovni kapital se poveča iz zneska 23.718.600,00 HRK za znesek 90.000,00 HRK, na znesek 23.808.600,00 HRK in to prevzemom osnovnega kapitala WOHUM d.o.o., na podlagi Sklepa o pripojitvi z dne 24.12.2012 izmed WOHUM d.o.o., kot pripojene družbe in WERKOS d.o.o., kot prevzemne družbe.

Statusne spremembe: subjektu vpisa pripojen drugi

- 24 Sklep o pripojitvi z dne 24.12.2012
Odločba članov družbe o dajanju soglasja z dne 24.12.2012. na Sklep o pripojitvi, izmed WERKOS d.o.o., ki je vpisan v register trgovskega sodišča v Osijeku pod MŠS: 030016616, kot družbe prevzemnice in WOHUM d.o.o., upisanega v register Trgovskega sodišča v Osijeku pod MŠS 030086578, kot pripojene družbe.

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 5 od 7

24.10.2013

*/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/*

7/407

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

/besedilo pečatal
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

OSTALI PODATKI:

22 OSTALE IZJAVE POOBlašČENIH OSEB:

Na podlagi 2. odst. 460. čl. ZTD-e vlagatelj prijave izjavlja da od dneva na katera se nanašajo letni računovodski izkazi, oziroma novi takšni izkazi do dneva vložitve prijave ni bilo sprememb v premoženju družbe, ki bi ogrožale sprejetju odločbe o povečanju osnovnega kapitala če bi se sprejela na dan vložitve prijave.

ZABELEŽKE:

Redna številka zabeležke: 1

25 - Registrsko sodišče pripojenega subjekta WOHUM d.o.o. za gradbeništvo, Osijek, Ulica borova 6, MŠS: 030086758, OIŠ: 56814652036 je Trgovsko sodišče v Osijeku.

FINANČNI IZKAZI:

	Datum predložitve	Leto	Obračunsko obdobje	Vrsta poročila
cu	27.06.13	2012	01.01.12 - 31.12.12	GFT-POD poročilo

Vpis v glavno knjigo so opravili:

RSO	Poslovna številka	Datum	Naziv sodišča
0001	Pš-95/1684-2	07.03.1996	Trgovsko sodišče v Osijeku
0002	Pš-96/229-2	05.04.1996	Trgovsko sodišče v Osijeku
0003	Pš-98/607-2	28.04.1998	Trgovsko sodišče v Osijeku
0004	Pš-98/1254-2	26.10.1998	Trgovsko sodišče v Osijeku
0005	Pš-99/422-2	26.03.1999	Trgovsko sodišče v Osijeku
0006	Pš-00/310-2	13.03.2000	Trgovsko sodišče v Osijeku
0007	Pš-01/453-2	09.04.2001	Trgovsko sodišče v Osijeku
0008	Pš-02/1795-3	02.09.2002	Trgovsko sodišče v Osijeku
0009	Pš-03/555-2	15.05.2003	Trgovsko sodišče v Osijeku
0010	Pš-03/1377-2	12.11.2003	Trgovsko sodišče v Osijeku
0011	Pš-03/1532-2	16.12.2003	Trgovsko sodišče v Osijeku
0012	Pš-04/205-2	20.02.2004	Trgovsko sodišče v Osijeku
0013	Pš-04/1504-2	24.12.2004	Trgovsko sodišče v Osijeku
0014	Pš-05/174-2	08.02.2005	Trgovsko sodišče v Osijeku
0015	Pš-05/832-4	23.06.2005	Trgovsko sodišče v Osijeku
0016	Pš-06/1390-3	26.09.2006	Trgovsko sodišče v Osijeku
0017	Pš-07/236-2	08.02.2007	Trgovsko sodišče v Osijeku
0018	Pš- 07/477-2	22.03.2007	Trgovsko sodišče v Osijeku
0019	Pš- 07/509-2	27.03.2007	Trgovsko sodišče v Osijeku
0020	Pš- 08/2149-2	31.12.2008	Trgovsko sodišče v Osijeku
0021	Pš- 09/341-4	04.03.2009	Trgovsko sodišče v Osijeku
0022	Pš-11/1521-2	30.06.2011	Trgovsko sodišče v Osijeku
0023	Pš-12/815-2	15.03.2012	Trgovsko sodišče v Osijeku

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 6 od 7

24.10.2013

/besedilo pečatal
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv

8/107

REPUBLIKA HRVAŠKA
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

*/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16
/podpis nečitljiv/*

Vpis v glavno knjigo so opravili:

RSO	Poslovna številka	Datum	Naziv sodišča
0024	Pš-13/503-4	26.02.2013	Trgovsko sodišče v Osijeku
0025	Pš-13/503-5	01.03.2013	Trgovsko sodišče v Osijeku
eu	/	26.06.2009	elektronski vpis
eu	/	10.06.2010	elektronski vpis
eu	/	27.06.2011	elektronski vpis
eu	/	28.06.2012	elektronski vpis
eu	/	27.06.2013	elektronski vpis

V Osijeku, 24. Oktobra 2013

Pooblaščen oseba

TA IZPISEK JE ISTOVETEN
IZVIRNIKU
ŠTEVILKA VPISNIKA POD
KATERIM JE IZPISEK IZDAN R3-
6482/13

TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU

Osijek, 24.10.2013

UPRAVA SODNEGA
REGISTRA
/podpis nečitljiv/

*/besedilo pečata/
Republika Hrvatska
TRGOVSKO SODIŠČE V OSIJEKU
16*

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stran: 7 od 7

Posl.št. 70/2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predsednika Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod popolnoma ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 28.10.2013

Marjana Repušić



13/10/13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030016616

OIB:

84820806875

TVRKA:

10 WERKOS Društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering u graditeljstvu

1 WERKOS d.o.o. - OSIJEK

SJEDIŠTE/ADRESA:

23 Osijek (Grad Osijek)
Ulica borova 6

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću


PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 45 | - Građevinarstvo |
| 1 | 70 | - Poslovanje nekretninama |
| 1 | 72 | - Računalne i srodne aktivnosti |
| 1 | 74.13 | - Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja |
| 1 | 74.14 | - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj. |
| 1 | 74.40 | - Promidžba (reklama i propaganda) |
| 1 | * | - specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama, prekrivačima za pod i sredstvima za čišćenje |
| 2 | 17.5 | - Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda |
| 2 | 25.2 | - Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa |
| 2 | * | - savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti |
| 2 | * | - zasnivanje i izrada nacрта (projektiranje) zgrada |
| 2 | * | - nadzor nad gradnjom |
| 2 | * | - izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja |
| 2 | * | - inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti |
| 2 | * | - inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering |
| 2 | * | - izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije |
| 2 | * | - izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor |
| 2 | * | - izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata za sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti |

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stranica: 1 od 7

24 -10- 2013



10/10/1

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 2 * - geološke i istražne djelatnosti: površinsko mjerenje i promatranje, namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaliji podzemnih nalazišta nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda
- 2 * - izrada podloga i geodetskih elaborata, izrada parcelacijskih elaborata
- 3 14.1 - Vadenje kamena
- 3 14.2 - Vadenje šljunka, pijeska i gline
- 3 17.40 - Proizv. got. tekstil. proizvoda (osim odjeće)
- 3 26.6 - Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.
- 3 28.11 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- 3 33.3 - Proizvodnja opreme za kontrolu ind. procesa
- 3 52.5 - Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 3 52.6 - Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 3 52.7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 3 71.32 - Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
- 3 95 - PRIVATNA KUĆANSTVA SA ZAPOSLENIM OSOBLJEM
- 5 * - Usluga naplate potraživanja
- 8 * - Kupnja i prodaja robe osim oružja, streljiva, lijekova i otrova na domaćem i stranom tržištu
- 8 * - Trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu
- 9 * - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- 11 55.1 - Hoteli
- 11 55.21 - Omladinski hoteli i planinarski domovi
- 11 55.22 - Kampovi, uključujući i za stambene autoprikolice
- 11 55.23.1 - Ostali smještaj za boravak turista
- 11 55.23.4 - Ostali smještaj
- 11 55.3 - Restorani
- 11 55.4 - Barovi
- 11 55.5 - Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
- 11 61.10.1 - Pomorski i obalni prijevoz putnika
- 11 61.10.2 - Pomorski i obalni prijevoz robe
- 11 61.10.3 - Taksiprijevoz na vodi
- 11 61.2 - Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima
- 11 71.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
- 14 * - Stručni poslovi zaštite okoliša
- 16 * - vođenje računovodstvenih poslova
- 18 * - Pružanje savjeta u računalnoj opremi (hardveru)
- 18 * - Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvera)
- 18 * - Obrada podataka
- 18 * - Izrada i upravljanje bazom podataka
- 18 * - Ocjenjivanje sukladnosti proizvodnje hrane te proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti i oznakom tradicionalnog ugleda
- 18 * - Laboratorijska analiza uzoraka zdravstvene

24-10-2013



11/107

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 18 * - ispravnosti i kakvoće hrane
- 18 * - Proizvodnja i uvoz sadnog materijala (voćnih sadnica, loznih cijepova i ukrasnog bilja)
- 18 * - Tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
- 18 * - Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
- 18 * - Tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda te rukovanje sustavom za navodnjavanje na vodama I. reda (državne vode) i na vodama II. reda (lokalne vode)
- 18 * - Uređenje vodotoka i drugih voda na vodama (regulacijski radovi) na vodama I. reda (državne vode) i na vodama II. reda (lokalne vode)
- 19 * - usluga uređenja i održavanja krajolika
- 19 * - hidroinženjering
- 21 * - Skupljanje i prijevoz na trajno zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada
- 24 * - upravljanje i održavanje zgrada
- 24 * - cestovni prijevoz robe
- 24 * - prekrcaj tereta i skladištenje
- 24 * - ostale prateće djelatnosti u cestovnom prometu

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 24 Petar Velicki,
Osijek, Ružina 121
- 24 - jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 24 Petar Velicki,
Osijek, Ružina 121
- 24 - član uprave
- 24 - direktor
- 24 - zastupa društvo samostalno i bez ograničenja.

TEMELJNI KAPITAL:

- 24 23.808.600,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- 1 Izjava o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD od 18.12.1995.
- 2 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju od 25.03.1996.god.
- 3 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD od 25.03.1998.godine, koji se odnosi na promjenu predmeta poslovanja i članova uprave.

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stranica: 3 od 7

24-10-2013

12/107

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- 4 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala od 16.rujna 1998.godine koja se odnosi na promjenu člana uprave.
- 5 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala od 09.03.1999.godine koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja i članova uprave.
- 6 Izjava od 10.03.2000.godine o izmjeni članka 4. i članka 7. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 18.12.1995.godine, koje se odnose na promjenu predmeta poslovanja i članova uprave.
- 7 Izjava od 09.04.2001. godine o izmjeni čl.7. Izjave o usklađenju od 18.12.1995. godine, koja se odnosi na promjenu članova uprave i promjenu funkcije člana uprave.
- 8 Izjava o izmjeni Izjave od 29.08.2002.godine kojom se mijenjaju odredbe o predmetu poslovanja i temeljni kapital.
- 9 Izjava od 29.04.2003. godine o izmjeni čl.4. Izjave o usklađenju koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja.
- 10 Izjava o izmjeni Izjave od 05.11.2003.godine kojom se mijenjaju odredbe o tvrtki.
- 11 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju od 25.11.2003. godine koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja.
- 12 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju od 20. valjače 2004. godine koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala.
- 13 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 13.12.2004. godine kojom se mijenja sjedište društva.
- 14 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD od 04.02.2005.godine kojom se mijenja predmet poslovanja društva.
- 15 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 25.05.2005. godine u kojoj se pobliže regulira odredba u pogledu isplate dobiti u društvu.
- 16 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 20.07.2006. godine kojom se dopunjuje predmet poslovanja-djelatnosti.
- 17 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD od 06.02.2007. godine koja se odnosi na izmjenu čl.9. odnosno osnivanje podružnica.
- 18 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD od 19.03.2007. koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja, a kojom je izmijenjen čl. 4. temeljnog akta.
- 19 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD od 27.03.2007. koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja, a kojom je izmijenjen čl.4. temeljnog akta.
- 20 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju od 30.12.2008. godine koja se odnosi na izmjenu čl. 5. temeljnog akta, odnosno povećanje temeljnog kapitala.
- 21 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju od 23.02.2009. godine

21-10-2013

13/107

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- koja se odnosi na izmjenu članka 4. temeljnog akta, odnosno dopunu predmeta poslovanja
- 22 Izjava o izmjeni izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD-om od 20.06.2011. koja se odnosi na izmjenu čl. 5 temeljnog akta - povećanje temeljnog kapitala.
- 24 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD-om od 15.01.2013. godine u kojem se u čl.4. upisuju nove djelatnosti, u čl.5. upisuje povećani temeljni kapital, a u čl.7. mijenja se osobni podaci člana društva. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen Trgovačkom sudu u Osijeku.

Promjene temeljnog kapitala:

- 8 Temeljni kapital povećan je iz dobiti društva za iznos od 1.100.000,00 kn na.
- 20 Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 5.296.600,00 kn za iznos od 13.422.000,00 kn, tako da sada iznosi 18.718.600,00 kn i to unošenjem prava - patenata procijenjenih po revizorskoj kući PLESLIĆ-REVIZIJA d.o.o., i to konsenzualnog patenta PK 20040807 "sklopiva mrežasta konstrukcija" i konsenzualnog patenta PK 20040756 "vodena barijera" - sustav za zaštitu štetnog djelovanja vode
- 22 Temeljni kapital povećava se sa iznosa 18.718.600,00 kn za iznos od 5.000.000,00 kn, tako da sada iznosi 23.718.600,00 kn i to pretvaranjem rezervi iz dobiti društva u temeljni kapital, povećanjem postojećeg udjela, a temeljem Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za 2010.g. revizora PLESLIĆ-REVIZIJA d.o.o. Br. REV-18005/10 od 10.06.2011.
- 23 Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 13.03.2012. kojom se u čl. 3. mijenja adresa društva.
- 24 Pročišćeni tekst dostavljen Trgovačkom sudu u Osijeku.
- 24 Temeljni kapital povećava se sa iznosa 23.718.600,00 kn za iznos 90.000,00 kn, na iznos od 23.808.600,00 kn i to preuzimanjem temeljnog kapitala WOHUM d.o.o., temeljem Ugovora o pripajanju od 24.12.2012. između WOHUM d.o.o. kao pripojenog društva i WERKOS d.o.o., kao društva preuzimatelja.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 24 Ugovor o pripajanju od 24.12.2012.
Odluka člana društva o davanju suglasnosti od 24.12.2012. na Ugovor o pripajanju, između WERKOS d.o.o., upisanog u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS:030016616, kao društva preuzimatelja i WOHUM d.o.o., upisanog u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030086578, kao pripojenog društva.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

22 OSTALE IZJAVE OVLAŠTENIH OSOBA:

Tem. čl. 460 st. 2 ZFD-a podnositelj prijave izjavljuje da od dana na koji se odnose godišnja financijska izvješća, odnosno nova takva izvješća do dana podnošenja prijave nije bilo izmjena u imovini društva koje bi smetale donošenju odluke o povećanju temeljnog kapitala ako bi se ona donijela na dana podnošenja prijave.

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
25 - RegistarSKI sud pripojenog subjekta WOHUM d.o.o. za graditeljstvo, Osijek, Ulica borova 6, MBS:030086758, OIB:56814652034, je Trgovački sud u Osijeku.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Prodano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 27.06.13	2012	01.01.12 - 31.12.12	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/1694-2	07.03.1996	Trgovački sud u Osijeku
0002 Tt-96/229-2	05.04.1996	Trgovački sud u Osijeku
0003 Tt-98/607-2	28.04.1998	Trgovački sud u Osijeku
0004 Tt-98/1254-2	26.10.1998	Trgovački sud u Osijeku
0005 Tt-99/422-2	26.03.1999	Trgovački sud u Osijeku
0006 Tt-00/310-2	13.03.2000	Trgovački sud u Osijeku
0007 Tt-01/453-2	09.04.2001	Trgovački sud u Osijeku
0008 Tt-02/1795-3	02.09.2002	Trgovački sud u Osijeku
0009 Tt-03/555-2	15.05.2003	Trgovački sud u Osijeku
0010 Tt-03/1377-2	12.11.2003	Trgovački sud u Osijeku
0011 Tt-03/1532-2	16.12.2003	Trgovački sud u Osijeku
0012 Tt-04/205-2	20.02.2004	Trgovački sud u Osijeku
0013 Tt-04/1504-2	24.12.2004	Trgovački sud u Osijeku
0014 Tt-05/174-2	08.02.2005	Trgovački sud u Osijeku
0015 Tt-05/832-4	23.06.2005	Trgovački sud u Osijeku
0016 Tt-06/1390-3	26.09.2006	Trgovački sud u Osijeku
0017 Tt-07/236-2	08.02.2007	Trgovački sud u Osijeku
0018 Tt-07/477-2	22.03.2007	Trgovački sud u Osijeku
0019 Tt-07/509-2	27.03.2007	Trgovački sud u Osijeku
0020 Tt-08/2149-2	21.12.2008	Trgovački sud u Osijeku
0021 Tt-09/341-4	04.03.2009	Trgovački sud u Osijeku
0022 Tt-11/1521-2	30.06.2011	Trgovački sud u Osijeku
0023 Tt-12/315-2	15.03.2012	Trgovački sud u Osijeku

D004, 2013-10-24 09:21:23

Stranica: 6 od 7

2 - 10 2013

15/10/13

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upis u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0024 Tt-13/503-4	26.02.2013	Trgovački sud u Osijeku
0025 Tt-13/503-5	01.03.2013	Trgovački sud u Osijeku
eu /	26.06.2009	elektronički upis
eu /	10.06.2010	elektronički upis
eu /	27.06.2011	elektronički upis
eu /	28.06.2012	elektronički upis
eu /	27.06.2013	elektronički upis

U Osijeku, 24. listopada 2013.

Ovlaštena osoba

OVAJ IZVADAK VJERAN JE IZVORNOM
PROJ UPISNIKA IZ REGISTRA
IZDAN R8-64813/13

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Osijek,

UPRAVA SUDSKOG
REGISTRA

24-10-2013

SUBJEKT UPISA

MBS:

040064257

OIB:

02744205849

TVRTKA:

4 FRACASSO RI d. o. o. za proizvodnju i trgovinu

4 FRACASSO RI d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

13 Rijeka (Grad Rijeka)
Trpimirova 4

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|------|---|
| 1 | 51 | - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima |
| 1 | 63.3 | - Djelatnost putničkih agencija i turoperatora |
| 3 | 27 | - PROIZVODNJA METALA |
| 3 | 28 | - PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME |
| 4 | 70 | - POSLOVANJE NEKRETNINAMA |
| 4 | 71 | - IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO |
| 4 | * | - Zastupanje stranih i domaćih, fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu |
| 4 | * | - Proizvodnja, opremanje i postavljanje zaštitinih i signalnih naprava na prometnicama |
| 4 | * | - Kupnja i prodaja robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu |
| 13 | * | - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina |
| 13 | * | - nadzor nad gradnjom |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|----|---|
| 10 | METALMECCANICA FRACASSO S. P. A., Italija, Broj iz registra: 00166750273, Naziv registra: Registar komore za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu, Nadležno tijelo: Komora za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu, OIB: 88523539944 Italija, Fiesse D'Artico (VE), Via Barbariga 7 |
| 11 | - jedini član d.o.o. |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

9 Adriano Fracasso, putovnica:

Italija

D004, 2013-08-26 10:07:23

Stranica: 1 od 3

17/10/1



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- Italija, Flesso D Artico (VE)
- 4 - član uprave
- 4 - zastupa samostalno i pojedinačno
- 15 Milivoj Miljković,
Oprić, Put Braće Honovića 20
- 15 - član uprave
- 15 - zastupa pojedinačno i samostalno, s danom 7. veljače
2013. godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 11 2.000.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- 1 Izjava o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima
sastavljena dana 08. prosinca 1995. godine.
- 2 Odlukom osnivača od 17. prosinca 1997. godine izmijenjena je
Izjava o usklađenju u odredbama o temeljnom kapitalu.
- 3 Odlukom člana društva od 28. prosinca 2000. godine
izmijenjen je članak 6. (predmet poslovanja) Izjave o
usklađenju.
- 4 Temeljem Ugovora o prijenosu poslovnog udjela i temeljnog
uloga i Odlukom članova društva od 24. travnja 2001. godine
izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju, a posebice
tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, odredbe o članovima
društva i Upravi društva, te je oblik akta promijenjen u
Društveni ugovor.
- 11 Odlukom člana društva od 27. listopada 2011. godine
Društveni ugovor izmijenjen je u 3.1. (članovi društva) i
čl. 6.2. (temeljni kapital i poslovni udjeli). Pročišćeni
tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 13 Odlukom člana društva od 14. lipnja 2012. godine Društveni
ugovor izmijenjen je u čl. 5.1. (sjedište društva) i čl.
6.1. (predmet poslovanja-djelatnosti). Pročišćeni tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 odlukom osnivača od 17. prosinca 1997. godine povećan je
temeljni kapital društva sa iznosa od 3.712,82 kune za iznos
od 15.287,18 kuna na iznos od 19.000,00 kuna.
- 11 Odlukom člana društva od 27. listopada 2011. godine povećan
je temeljni kapital društva sa iznosa od 19.000,00 kn za
iznos od 1.981.000,00 kn na iznos od 2.000.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt do sada upisan u registarskom ulošku broj 1-20698-
00 Trgovačkog suda u Rijeci.

ZABILJEŽBE:

D004, 2013-08-26 10:07:23

Stranica: 2 od 3

12/101

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
6 - Ugovorom o osiguranju od dana 21. lipnja 2006. godine zaključenim između Borisa Rosanda, Rijeka, A. Barca 12 i Zvonimira Pošćić, Praha, Velehradska 20, Češka Republika, dozvoljava se upis založnog prava u korist Borisa Rosanda na 30% (tridesetposto)

- Redni broj zabilježbe: 2
6 - poslovnih udjela Zvonimira Pošćić u društvu FRACASSO RI d. o. o. Škrljevo, Kukuljanovo bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040064257.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 29.06.13	2012	01.01.12 - 31.12.12	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/7542-3	07.02.1997	Trgovački sud u Rijeci
0002 Tt-97/3607-6	08.05.1998	Trgovački sud u Rijeci
0003 Tt-01/133-3	06.02.2001	Trgovački sud u Rijeci
0004 Tt-01/1729-5	08.06.2001	Trgovački sud u Rijeci
0005 Tt-05/246-2	28.01.2005	Trgovački sud u Rijeci
0006 Tt-06/1357-4	28.07.2006	Trgovački sud u Rijeci
0007 Tt-09/490-2	17.03.2009	Trgovački sud u Rijeci
0008 Tt-09/955-2	06.05.2009	Trgovački sud u Rijeci
0009 Tt-09/1778-7	22.09.2009	Trgovački sud u Rijeci
0010 Tt-10/3990-2	24.11.2010	Trgovački sud u Rijeci
0011 Tt-11/7490-4	23.11.2011	Trgovački sud u Rijeci
0012 Tt-11/7843-2	02.12.2011	Trgovački sud u Rijeci
0013 Tt-12/3767-4	26.06.2012	Trgovački sud u Rijeci
0014 Tt-12/6461-2	08.11.2012	Trgovački sud u Rijeci
0015 Tt-13/941-4	28.02.2013	Trgovački sud u Rijeci
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	30.09.2011	elektronički upis
eu /	29.06.2012	elektronički upis
eu /	29.06.2013	elektronički upis

U Rijeci, 26. kolovoza 2013.

Ovlaštena osoba

D004, 2013-08-26 10:07:23

Stranica: 3 od 3

19/10/13

Ta prevod sestoji iz 5 strani / 10 lista(ov)	
Številka overjenega prevoda	943/2013
Datum	

OVERJENI PREVOD IZ HRVAŠKEGA JEZIKA

22/10/1

70

Ta prevod sestoji iz 3 strani / 10 lista(OV)	
Številka overjenega prevoda	943/2013
Datum	21.10.2013

(pečat: REPUBLIKA HRVAŠKA - TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI)
 REPUBLIKA HRVAŠKA
 TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

MŠS:
 040064257

OIB:
 02744205849

PODJETJE:

- 4 FRACASSO RI d. o. o. za proizvodnjo in trgovino
- 4 FRACASSO RI d. o. o.

SEDEŽ/NASLOV:

- 13 Reka (Mesto Reka)
- Trpimirova 4

PRAVNA OBLIKA:

1 družba z omejeno odgovornostjo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 51 - Trgovina na debelo in posredovanje v trgovini, razen trgovine z motornimi vozili in motocikli
- 1 63.3 - Dejavnost potniških agencij in turoperaterjev
- 3 27 - PROIZVODNJA KOVINE
- 3 28 - PROIZVODNJA IZDELKOV IZ KOVINE, RAZEN STROJEV IN OPREME
- 4 70 - POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
- 4 71 - NAJEM STROJEV IN OPREME, BREZ UPRAVLJAVCA IN PREDMETOV ZA OSEBNO UPORABO IN GOSPODINSTVO
- 4 * - Zastopanje tujih in domačih, fizičnih in pravnih oseb v državi in tujini
- 4 * - Proizvodnja, opremanje in postavljanje zaščitnih in signalnih naprav na prometnicah
- 4 * - Nakup in prodaja blaga ter trgovsko posredovanje na domačem in tujem tržišču
- 13 * - projektiranje, graditev, uporaba in odstranitev zgradb
- 13 * - nadzor nad graditvijo

USTANOVITELJI/ČLANI DRUŽBE:

- 10 METALMECCANICA FRACASSO S. P. A., Italija, Številka iz registra: 00166750273, Naziv registra: Register komore za trgovino, industrijo, obrt in kmetijstvo, Pristojno telo: Komora za

Ta prevod sestoji iz 5 strani / 10 listâ(ov)	
Številka overjenega prevoda	943/2013
Datum	21.10.2013

(pečat: REPUBLIKA HRVAŠKA - TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI)
 REPUBLIKA HRVAŠKA
 TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

USTANOVITELJI/ČLANI DRUŽBE:

trgovino, industrijo, obrt in kmetijstvo, OIB: 88523539944 Italija, Fiesso D'Artico (VE), Via
 Barbariga 7

11 - edini član d.o.o.

OSEBE POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE:

9 Adriano Fracasso, Italija
 Italija, Fiesso D Artico (VE)
 4 - član uprave
 4 - zastopa samostojno in posamezno

15 Milivoj Miljković, (Oprić, Put Braće Honovića 20
 15 - član uprave
 15 - zastopa posamezno in samostojno, z dnem 7. februarja 2013

OSNOVNI KAPITAL:

1 2.000.000,00 kun

PRAVNI ODNOSI:

Osnovni akt:

- 1 Izjava o uskladitvi z Zakonom o trgovskih družbah je sestavljena dne 08. decembra 1995.
- 2 Z odločbo ustanovitelja z dne 17. decembra 1997 je spremenjena Izjava o uskladitvi v določbah o osnovnem kapitalu.
- 3 Z odločbo člana družbe z dne 28. decembra 2000 je spremenjen 6. člen (predmet poslovanja) Izjave o uskladitvi.
- 4 Na podlagi Pogodbe o prenosu poslovnega deleža in osnovnega vložka in z Odločbo članov družbe z dne 24. aprila 2001 so spremenjene določbe Izjave o ustanovitvi, posebej pa podjetje, sedež, predmet poslovanja, določbe o članih družbe in Upravi družbe, ter je oblika akta spremenjena v Družbena pogodba.
- 11 Z odločbo člana družbe z dne 27. oktobra 2011 je Družbena pogodba spremenjena v čl. 3.1. (člani družbe) in 6.2. (osnovni kapital in poslovni deleži). Prečiščeni tekst Pogodbe je dostavljen v zbirko listin.
- 13 Z odločbo člana družbe z dne 14. junija 2012 je Družbena pogodba spremenjena v čl. 5.1. (sedež družbe) in 6.1. (predmet poslovanja-dejavnosti). Prečiščeni tekst Pogodbe je dostavljen v zbirko listin.

Ta prevod sestoji iz 5 strani / 10 lista(ov)	
Številka overjenega prevoda	943/2013
Datum	21.10.2013

(pečat: REPUBLIKA HRVAŠKA - TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI)
 REPUBLIKA HRVAŠKA
 TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

PRAVNI ODNOSI:

Spremembe osnovnega kapitala:

2 z odločbo ustanovitelja z dne 17. decembra 1997 je povečan osnovni kapital družbe iz zneska 3.712,82 kun za znesek 15.287,18 kun na znesek 19.000,00 kun.

11 Z odločbo člana družbe z dne 27. oktobra 2011 je povečan osnovni kapital družbe iz zneska 19.000,00 kn za znesek 1.981.000,00 kn na znesek 2.000.000,00 kn.

OSTALI PODATKI:

I Subjekt do sedaj vpisan v registrskem vložku številka 1-20698-00 Trgovskega sodišča na Reki.

ZAZNAMKI:

Zaporedna številka zaznamka: 1

6 - S pogodbo o zavarovanju z dne 21. junija 2006, sklenjeno med Borisom Rosanda, Reka, A. Barca 12 in Zvonimirja Poščića, Praha, Velehradská 20, Češka Republika, se dovoli vpis zastavne pravice v dobro Borisa Rosanda na 30% (tridesetodstotkov)

Zaporedna številka zaznamka: 2

6 - poslovnih deležev Zvonimirja Poščića v družbi FRACASSO RI d. o. o. Škrlevo, Kukuljanovo bb, vpisano v sodni register Trgovskega sodišča na Reki pod MŠS 040064257.

FINANČNA POROČILA:

	Oddano	Leto	Za obdobje	Vrsta poročila
eu	29.06.2013	2012	01.01.12- 31.12. 12	GFI-POD poročilo

Vpise v glavno knjigo so opravili:

RBU	Tt	Datum	Naziv sodišča
0001	Tt-95/7542-3	07.02.1997	Trgovsko sodišče na Reki
0002	Tt-97/3607-6	08.05.1998	Trgovsko sodišče na Reki
0003	Tt-01/133-3	06.02.2001	Trgovsko sodišče na Reki

Ta prevod sestoji iz 5 strani / 10 lista(ov)	
Številka overjenega prevoda	943/2013
Datum	21.10.2013

(pečat: REPUBLIKA HRVAŠKA - TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI)
 REPUBLIKA HRVAŠKA
 TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA

SUBJEKT VPISA

FINANČNA POROČILA:

0004	Tt-01/1729-5	08.06.2001	Trgovsko sodišče na Reki
0005	Tt-05/246-2	28.01.2005	Trgovsko sodišče na Reki
0006	Tt-06/1357-4	28.07.2006	Trgovsko sodišče na Reki
0007	Tt-09/490-2	17.03.2009	Trgovsko sodišče na Reki
0008	Tt-09/955-2	06.05.2009	Trgovsko sodišče na Reki
0009	Tt-09/1778-7	22.09.2009	Trgovsko sodišče na Reki
0010	Tt-10/3990-2	24.11.2010	Trgovsko sodišče na Reki
0011	Tt-11/7490-4	23.11.2011	Trgovsko sodišče na Reki
0012	Tt-11/7843-2	02.12.2011	Trgovsko sodišče na Reki
0013	Tt-12/3767-4	26.06.2012	Trgovsko sodišče na Reki
0014	Tt-12/6461-2	08.11.2012	Trgovsko sodišče na Reki
0015	Tt-13/941-4	28.02.2013	Trgovsko sodišče na Reki
eu	/	30.06.2009	elektronski vpis
eu	/	30.06.2010	elektronski vpis
eu	/	30.09.2011	elektronski vpis
eu	/	29.06.2012	elektronski vpis
eu	/	29.06.2013	elektronski vpis

Na Reki, 26. avgusta 2013

Ta prevod sestoji iz 5 strani / 10 lista(ov)	
Številka overjenega prevoda	943/2013
Datum	21.10.2013

(pečat: REPUBLIKA HRVAŠKA - TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI)
 REPUBLIKA HRVAŠKA
 TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA


SUBJEKT VPISA

(pečat: REPUBLIKA HRVAŠKA - TRGOVSKO SODIŠČE NA REKI - 12)

Pooblaščen oseba
 (podpis nečitljiv)

Podpisana Diana Jenul, sodna tolmačka za slovenski jezik, imenovana s sklepom predsednika Okrožnega sodišča na Reki o ponovnem imenovanju, z dne 03. marca 2010., št. 4.Su.-37/10, potrjujem, da se ta prevod popolnoma ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v hrvaškem jeziku.

Številka: 943/2013
 Reka, 21.10.2013



Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

1.

IZJAVA PONUDNIKA

**seznanjem s predpisi s področja gradenj v Republiki Sloveniji, da spoštuje
veljane zakone Republike Slovenije na splošno in priznava veljanost
pravnega reda Republike Slovenije**


VODILNI PARTNER

Werkos d.o.o.

Ulica borova 6

31000 Osijek, Hrvatska

Izjava ponudnika




Petar Velicki potvrđuje, da je ponudnik WERKOS d.o.o. Osijek seznanjen s predpisi s područja gradnje u Republici Sloveniji, da spoštuje veljavne zakone Republike Slovenije na splošno in priznava veljavnost pravnega reda Republike Slovenije.

V Osijeku, 11.11.2013.

Podpis ponudnika

žig



WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (12)

Werkos d.o.o. za inženjering u graditeljstvu • OIB 84820806875 • PDV ID broj HR84820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 030016616 • Član uprave: Petar Velicki

Poslovni računi: Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb HR0724810001123000894 • Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka HR3824020061100438154

Societe Generale-Splitska banka d.d., Split HR9223300031100413286 • Zagrebačka banka d.d., Zagreb HR4723600001101273504

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb HR6224840081102646054 • Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb HR9423400091100135774

OTP banka Hrvatska d.d., Zadar HR8124070001100372609 • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

WERKOSGROUP

27/107




PARTNER

GODINA d.o.o.
Hrpelje, OIC – Hrpelje 22
6240 KOZINA


Izjava ponudnika

Maks Godina potrjuje, da je ponudnik GODINA d.o.o. seznanjen s predpisi s področja gradnje v Republiki Sloveniji, da spoštuje veljavne zakone Republike Slovenije na splošno in priznava veljavnost pravnega reda Republike Slovenije.

Datum: Hrpelje, 5.11.2013



Podpis ponudnika

A handwritten signature in black ink.

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

2.

POGLAVJE 1

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 1

NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, september 2013

31/6/1

V S E B I N A

A. SPLOŠNO

1. Obseg ponudbenih del
2. Viri sredstev
3. Primernost ponudnikov
4. Najvišja sprejemljiva vrednost ponudb
5. Pogoji za udeležbo ponudnika na javnem razpisu
6. Ena ponudba od vsakega ponudnika
7. Stroški za izdelavo in predložitev ponudbe
8. Ogled gradbišča

B. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

9. Vsebina razpisne dokumentacije
10. Pojasnjevanje razpisne dokumentacije
11. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

C. PRIPRAVA PONUDBE

12. Jezik ponudbe
13. Sestavni deli ponudbe
14. Ponudbena cena
15. Valute ponudbe in plačil
16. Veljavnost ponudbe
17. Garancija za resnost ponudbe
18. Priprava variantne ponudbe
19. Sestanek pred oddajo ponudbe
20. Oblika ponudb

D. ODDAJA PONUDBE

21. Pečatenje in označevanje ponudb
22. Skrajni rok za predložitev ponudbe
23. Nepravočasno dostavljene ponudbe
24. Spremembe, dopolnitve in umik ponudbe

E. ODPIRANJE, PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

25. Javno odpiranje ponudb
26. Pregled in ocenjevanje ponudb
27. Zaupnost postopka
28. Dopustne dopolnitve ponudb

F. ODDAJA DEL

29. Oddaja del
30. Zavrnitev vseh ponudb, ustavitev postopka, odstop od izvedbe javnega naročila
31. Odločitev o oddaji naročila
32. Sklenitev pogodbe
33. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
34. Dodatne gradnje ali storitve

POGLAVJE 1

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

A. SPLOŠNO

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., 3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z določilom 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/06 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) in v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31.07.2006, str. 25), Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31.7.2006, str. 79), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS 43/2011 s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN), razpisuje oddajo javnega naročila po odprtem postopku za izvedbo del:

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Navedena dela se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012).

Ponudba se pripravi v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

1. Obseg ponudbenih del

- 1.1 Javno naročilo za gradnjo protihrupnih ograj na odseku AC A1 0039/0639 Dramlje-Celje in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas se oddaja v dveh sklopih:

SKLOP 1 - Gradnja PHO na odseku AC-A1 0039/0639 Dramlje-Celje

- Izdelava PZI, razen za parcelno ograjo APO-PO-1
- Gradnja protihrupnih ograj APO-5, APO-8, APO-9, APO-11, APO-12, APO-17, APO-17.1, APO-19, APO-21, APO-3, APO-4, APO-6, APO-7, APO-10, APO-13, APO-14, APO-15, APO-16, APO-20, APO-22 + PO-2, APO-18, APO-23 + PO-1, APO-PO-1

SKLOP 2 - Gradnja PHO na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas

- Izdelava PZI
- Gradnja protihrupnih ograj APO-5, APO-8, APO-9, APO-10, APO-14, APO-15, APO-17, APO-19, APO-3, APO-4, APO-6, APO-7, APO-11, APO-12, APO-13, APO-18

Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predračun) in Poglavja 9 razpisne dokumentacije.

4. Najvišja sprejemljiva vrednost ponudb

Ponudba, katere vrednost bo brez DDV presegala vrednost

- 13.140.000,00 EUR za sklop 1,
- 14.650.000,00 EUR za sklop 2,

bo ocenjena kot nesprejemljiva in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

5. Pogoji za udeležbo ponudnika na javnem razpisu

- 5.1 Da bi bili ponudniki upravičeni sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju v podčlenih 5.1 (a) do 5.1 (o). Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden pri posameznem pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov in podizvajalcev so podani v Poglavju 10.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve iz 79. člena ZJN-2 oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Naročnik lahko pri preverjanju podatkov upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je ponudnik predložil v drugih postopkih oddaje javnega naročila in niso starejši od štirih mesecev pred skrajnim rokom za predložitev ponudb po tem javnem naročilu.

Vsebinska izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v razpisni dokumentaciji, ne glede na način izpolnjevanja.

- a) Podatki o ponudniku s seznamom pooblaščenih predstavnikov ponudnika s primerki njihovih podpisov z navedbo podlage, na osnovi katere navedene osebe podpisujejo dokumente v imenu in za račun ponudnika (zakoniti zastopnik, prokurist ali pooblaščenec). V seznam pooblaščenih predstavnikov morajo ponudniki navesti vse zakonite zastopnike. Prokuriste in pooblaščenca je potrebno v seznamu navajati le v primeru, da le-ti podpisujejo dokumente, ki so predloženi v ponudbi. V primeru navajanja pooblaščenca morajo biti seznamu priložena pooblastila za podpis.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku (Ur.l.Rs 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, v nadaljevanju ZUP).

V zvezi z navedenim morajo ponudniki izpolniti priloženo 5.1 (a) v Poglavju 10 - Sposobnost

- (b) Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem organu in imeti v temeljnem aktu družbe določeno dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo

V zvezi z navedenim morajo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji v ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano IZJAVO 1 v Poglavju 10. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva še predložitev ustreznih dokazil v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

V primeru, da ponudnik v temeljnem aktu družbe nima določene katere od dejavnosti, ki so predmet javnega naročila za katero daje ponudbo, navedeni pogoj lahko izpolnjuje skupaj s podizvajalcem. V tem primeru mora dokazilo v zvezi z izpolnjevanjem pogoja iz te točke predložiti tudi podizvajalec.

(c) **Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik** (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2:

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- Izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- Jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V zvezi z navedenim morajo ponudniki priložiti dokazila iz uradne evidence (za ponudnika kot pravno osebo in vse njegove zakoniti zastopnike, navedeno ne velja za prokuriste). Dokazila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb in morajo odražati zadnje dejansko stanje. V skladu s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. V tem primeru mora v ponudbi priložiti Izpolnjeno Izjavo 2 in Izjavo 2/A za vse ponudnikove zakoniti zastopnike (navedeno ne velja za prokuriste) z natančno navedbo naziva in naslova organa, ki vodi uradno evidenco o teh podatkih.

(d) Ponudnik ni v stečajnem postopku.

V zvezi z navedenim morajo ponudniki v ponudbi priložiti Izpolnjeno in podpisano IZJAVO 4 v Poglavju 10.

(e) Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

V zvezi z navedenim morajo ponudniki v ponudbi priložiti Izpolnjeno in podpisano IZJAVO 4 v Poglavju 10.

(f) Ponudnik na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi z s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50. eurov ali več.

V zvezi z navedenim morajo ponudniki v ponudbi priložiti Izpolnjeno in podpisano IZJAVO 4 v Poglavju 10.

(g) Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega javnega naročila, ni imel blokiranega posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki v ponudbi priložiti Izpolnjeno in podpisano IZJAVO 3 v poglavju 10. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril iz javno dostopnih evidenc (AJPES, gvin.com...). V primeru dvoma o resničnosti navedb v izjavi bo naročnik podatke preveril neposredno pri bankah, pri katerih imajo ponudniki odprte transakcijske račune, zato morajo ponudniki predložiti pooblastilo naročniku (po pripadajočem vzorcu v poglavju 10 sposobnost), na podlagi katerega bo naročnik lahko pridobil podatke glede morebitnih blokad računov pri vseh bankah, pri katerih imajo odprte račune.

(h) Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V zvezi z navedenim morajo ponudniki v ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano IZJAVO 5 v Poglavju 10 - Sposobnost, da imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

- (i) Ponudnik ima vsakoletni čisti prihodek od prodaje v letih 2010, 2011 in 2012, v višini 5.000.000,00 EUR. V kolikor podjetje posluje krajši čas, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno, zahteva po čistem prihodku od prodaje proporcionalno zniža glede na obdobje delovanja podjetja.

Za dokazovanje navedenega pogoja morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (i) v Poglavju 10 Sposobnost - Poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).

- (j) Ponudnik mora imeti v zadnjih sedmih letih od objave predmetnega javnega naročila uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) ali podizvajalec za:

- izvedbo protihrupnih ograj v skupni vrednosti najmanj 2.500.000,00 EUR (brez DDV), pri čemer mora biti vsaj eno naročilo v vrednosti ne manjši od 500.000,00 EUR (brez DDV).

V primeru, da so bila referenčna dela izvedena v sklopu drugih del, se zgoraj navedene vrednosti nanašajo le na zahtevano vrsto del in ne na vrednost celotnega naročila.

Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (j) v poglavju 10 - Sposobnost - Seznam najpomembnejših opravljenih referenčnih del. V kolikor je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupnem nastopanju, mora izpolniti tudi kolono »odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju«. Pri ocenjevanju izpolnjevanja pogoja iz podčlena 5.1 (j) v segmentu vrednosti referenčnih del bo naročnik upošteval vrednost referenčnih del le v odstotku ponudnikove udeležbe pri navedenem delu. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podan v Poglavju 10 - Sposobnost kot PRILOGA št. 1. V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 1.

Ponudnik lahko, v kolikor navaja uspešne izkušnje, ki jih je pridobil kot podizvajalec, v ponudbi namesto potrdila naročnika predloži fotokopijo sklenjene pogodbe za izvedbo referenčnih del in končne situacije ali končnega obračuna.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna dokazila.

Ponudnik lahko pogoje iz tega podčlena izpolnjuje skupaj s podizvajalcem. V takšnem primeru, mora ponudnik ta gospodarski subjekt v ponudbi imenovati kot svojega podizvajalca tako, da bo slednji sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v delu, v katerem tudi izkazuje referenco. Hkrati mora zanj izpolniti ustrezne obrazce in predložiti dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenega referenčnega pogoja (seznam najpomembnejših referenčnih del podizvajalca in potrdila naročnikov del) ter druga z razpisno dokumentacijo zahtevana dokazila.

Poleg navedenega mora podizvajalec, s katerim ponudnik dokazuje pogoj iz podčlena 5.1 (j) izpolnjevati pogoje iz podčlena 5.1 (g), zato mora tak podizvajalec predložiti izpolnjeno in podpisano Izjavo 3 v poglavju 10 in pooblastilo naročniku (po pripadajočem vzorcu v poglavju 10 sposobnost), na podlagi katerega bo naročnik lahko pridobil podatke glede morebitnih blokad računov pri vseh bankah pri katerih ima podizvajalec odprte račune.



Ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

V primeru sklicevanja na reference nominiranega podizvajalca mora ponudnik naročniku predložiti tudi dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, če ponudnik zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

- (k) Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način), do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitvev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kakovosti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.

Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki podpisati IZJAVO 6 (Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del) v Poglavju 10.

- (l) Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del in sicer:

Odgovorni projektant mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s 45. členom Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02 in spremembe) ob upoštevanju določil Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 123/03, 56/05 in 108/09).

Odgovorni projektant mora imeti vsaj eno referenčno delo v zadnjih 5 letih kot odgovorni projektant za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI protihrupnih ograj na AC ali HC ali glavnih cestah ali železnicah, pri čemer mora referenčno delo obsegati protihrupne ograje skupne površine vsaj 5.000 m².

Odgovorni vodja del mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02 in spremembe) ob upoštevanju določil Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 123/03, 56/05 in 108/09).

Odgovorni vodja del mora imeti vsaj eno referenco v zadnjih 5 letih kot odgovorni vodja del pri izvedbi protihrupnih ukrepov ali kot odgovorni vodja del pri novogradnji ali obnovi AC, HC ali glavne ceste.

Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (l) v poglavju 10 - Sposobnost - Seznam kadrov, kjer mora navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. V ponudbi mora ponudnik predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za odgovornega projektanta (kopijo prve strani vodilne mape in delov projektne dokumentacije, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanega pogoja ali potrdilo naročnika referenčnega dela) in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za odgovornega vodjo del (kopijo odločbe o imenovanju ali potrdilo naročnika referenčnega dela).

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna dokazila.

Ponudnik se lahko v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2 za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete (kadre) drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo kadre, potrebne za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen, iz katerega bo jasno razvidno, katere kadre bo imel ponudnik na voljo (navesti polmensko).



- (m) Ponudnik lahko posamezni del naročila odda v podizvajanje. Vsi podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izbranim ponudnikom), v petih dneh od njene sklenitve.

Za potrebe 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

V primeru navajanja podizvajalcev ponudnik izpolni obrazec 5.1 (m) v Poglavju 10 - Sposobnost, v katerega navede vse svoje podizvajalce vključno z navedbo, ali podizvajalec v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V primeru, da pri podizvajalcu, navedenem v obrazcu 5.1 (m) v Poglavju 10 - Sposobnost gre za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, mora ponudnik v ponudbi predložiti izpolnjen obrazec 5.1 (m-Povezani), ki ga izpolni podizvajalec, ki v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in namerava angažirati svoje podizvajalce.

Za vsakega od podizvajalcev, navedenega v obrazcu 5.1 (m) ali 5.1 (m-Povezani) mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec: »PODATKI O PODIZVAJALCU«, v katerem izpolni vse navedene rubrike in soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava njegovo terjatev do glavnega izvajalca (predložitev soglasja ni potrebna za podizvajalce, ki v razmerju do ponudnika izpolnjujejo kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe). Poleg tega je potrebno za vsakega od podizvajalcev navedenega v obrazcu 5.1 (m) ali 5.1 (m-Povezani) predložiti še Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2.

Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2 so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Izpolnjevanje pogoja v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi države, v kateri ima podizvajalec sedež, ali določbami države naročnika in izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, kjer ima podizvajalec sedež, ali določbami države naročnika, podizvajalci izkažejo z dokazilom iz uradne evidence ali navedejo v kateri evidenci in kateri državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco o izpolnjenih obveznostih v zvezi s plačili davkov in prispevkov in so zato dolžni v ponudbi priložiti izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 v Poglavju 10.

- (n) Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotoviti zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, zemljišča za svojo upravno tehnično bazo, zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo, kadar postavitve omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.

Za izpolnitev navedenega pogoja morajo ponudniki podpisati Izjavo 8 v Poglavju 10 - Izjava o zagotovitvi uporabe zemljišča.

(o) Ponudbi je potrebno priložiti tudi naslednjo izjavo:

- IZJAVA 9 - Izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisa.

5.2 Skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

a) Ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja v skupini izvajalcev posebej vsa dokazila iz podčlenov 5.1 (a) - 5.1 (h) in 5.1 (o).

Za dokazila, zahtevana v podčlenih 5.1 (i), 5.1 (j), 5.1 (k), 5.1 (l) in 5.1 (n) zadošča, da jih predloži eden od partnerjev, v kolikor je iz njih razvidno zadoščanje navedenemu pogoju.

Dokazila, zahtevana v podčlenu 5.1 (m) v ponudbi predložijo partnerji, ki nominirajo podizvajalce

b) Skupina izvajalcev mora v ponudbi predložiti sporazum o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila, s katerim opredeli zlasti odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila ter prevzem neomejene solidarne odgovornosti vseh partnerjev v skupini izvajalcev do naročnika za izvedbo pogodbenih del skladno s pogoji po pogodb.

Enega od partnerjev se mora v sporazumu o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila imenovati za vodilnega partnerja ter ga hkrati pooblastiti za podpis in sklenitev pogodbe za izvedbo del v imenu in za račun vsakega od partnerjev v skupini izvajalcev. V ta namen je vsak od partnerjev v skupini izvajalcev dolžan podpisati pooblastilo vodilnemu partnerju za podpis in sklenitev pogodbe (priloga Poglavja 7: »vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe«).

Vodilni partner mora biti hkrati pooblaščen za prevzem in prenos navodil v imenu in za račun vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupini izvajalcev.

c) Prav tako se mora skupina izvajalcev v sporazumu o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila dogovoriti in določiti predstavnika izvajalca v obrazcu pogodbe.

d) Skupina izvajalcev, katerih ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, mora naročniku najkasneje v 20 delovnih dneh po prejemu sklenjene pogodbe predložiti zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim:

- izvajalci kot partnerji natančno opredelijo medsebojno delitev del, ki so predmet javnega naročila (po vsebini in vrednosti)
- prevzamejo neomejeno solidarno odgovornost za izvedbo del, ki so predmet pogodbe

5.3 V primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, se zmogljivosti posameznih partnerjev v skupini izvajalcev seštevajo, da se ugotovi izpolnitev pogojev po podčlenih 5.1 (i), 5.1 (j), 5.1 (k), 5.1 (l) in 5.1 (n) teh Navodil ponudnikom.

6. Ena ponudba od vsakega ponudnika

6.1 Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo, bodisi svojo lastno, bodisi kot partner v ponudbi skupine izvajalcev.

7. Stroški za izdelavo in predložitev ponudbe

7.1 Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe.



8. Ogled gradbišča in dokumentacije

- 8.1 Ponudniku se priporoča, da si ogleda bodoče gradbišče in okolico in si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za gradnjo del. Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.
- 8.2 Ogled projektne dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru oz. najavi pri g. Miran Šmonu, tel: 01-300-98-48 od ponedeljka do petka med 08:00 in 12:00 uro, v prostorih naročnika DARS d.d., Dunajska 7, soba 505 (5. nadstropje).

B. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

9. Vsebina razpisne dokumentacije

9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- Poglavje 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe;
- Poglavje 2 Izjava o poznavanju in sprejemanju Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999; (rumena knjiga);
- Poglavje 3 Posebni pogoji pogodbe;
- Poglavje 4 Tehnični pogoji za izvedbo del in Izjava o seznanjenosti s Poglavjem 4;
- Poglavje 5 Obrazec ponudbe, Dodatek "A" k ponudbi, Vzorec garancije za resnost ponudbe, priloge C, D, D1; za sklop 1 in/all 2
- Poglavje 6 Ponudbeni predračun (popis del s količinami) za sklop 1 in/all 2;
- Poglavje 7 Osnutek pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe;
- Poglavje 8 Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;
- Poglavje 9 Smernice za gradnjo protihrupnih ograd na AC odseku Dramlje - Celje -Arja vas
Izvillečki iz projektne dokumentacije
Informativni popisi del
- Poglavje 10 Obrazci in IZJAVE za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov v skladu z zahtevami Poglavja 1.

Sestavni del dokumentacije so tudi Pojasnila, izdana skladno s členom 10 teh Navodil ponudnikom in Dodatki, izdani skladno s členom 11 teh Navodil ponudnikom.

- 9.2 Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija na Portalu javnih naročil razen Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 00315/2012. Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna za 1. sklop je NO6Z084 in za 2. sklop NO6Z085) lahko ponudniki pridobijo na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.
- 9.3 Ponudnik mora skrbno pregledati vso razpisno dokumentacijo in ob predložitvi ponudbe izpolniti vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora oddati ponudbo v tiskani obliki, zato celotno razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na portalu javnih naročil, natisnejo in oddajo na način, kot je opisan v podčlenu 13.1 teh Navodil ponudnikom.

10. Pojasnjevanje razpisne dokumentacije

- 10.1 Potencialni ponudnik, ki potrebuje pojasnila k razpisni dokumentaciji, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanja naročniku postavi preko portala javnih naročil. Naročnik bo odgovoril na vsako prošnjo za dodatno pojasnilo pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva, ki jo bo naročnik prejel preko portala javnih naročil do datuma in ure, kot sta določena za prejem vprašanj v objavi predmetnega naročila. Vsako tako izdano Pojasnilo postane del razpisne dokumentacije



skladno s podčlenom 9.1 teh Navodil ponudnikom. Podpisano kopijo vsakega Pojasnila mora ponudnik predložiti v svoji ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

11. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

11.1 Naročnik si pridržuje pravico, ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, vendar ne pozneje kot šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Dodatkov, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

11.2 Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije skladno s podčlenom 9.1 teh Navodil ponudnikom. Podpisano kopijo vsakega Dodatka mora ponudnik predložiti v svoji ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil in spremembo roka objavil na način, kot je bil objavljen razpis.

C. PRIPRAVA PONUDBE

12. Jezik ponudbe

Ponudbe in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

13. Sestavni deli ponudbe

13.1 Ponudba, ki jo predloži ponudnik mora vsebovati naslednje dokumente:

a) za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, ki nastopajo samostojno ali kot partnerji v skupini izvajalcev:

1. Dokazilo o vpisu v register poklicev ali trgovski register v skladu s predpisi države, v kateri je registriral dejavnost,

b) za domače in tuje ponudnike (kot posameznike ali kot skupino izvajalcev):

1. Pisno izjavo pooblaščen osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik seznanjen s predpisi s področja gradenj v Republiki Sloveniji, da spoštuje veljavne zakone Republike Slovenije na splošno in priznava veljavnost pravnega reda Republike Slovenije.
2. Podpisano Poglavlje 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3. Podpisano Izjavo o poznavanju in sprejemanju Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999; (rumena knjiga),
4. Podpisano Poglavlje 3 - Posebni pogoji pogodbe (podpisana mora biti vsaka stran Posebnih pogojev pogodbe),
5. Izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen z vsebino Poglavlja 4 in da ga je upošteval pri pripravi ponudbe,
6. Izpolnjeno in podpisano Poglavlje 5 (Obrazec ponudbe, Dodatek "A" k ponudbi, Vzorec garancije za resnost ponudbe, priloge C, D, D1) za sklop 1 in/ali sklop 2
7. Bančno garancijo za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice (po vzorcu iz Poglavlja 5),
8. Ponudbeni predračun - Poglavlje 6 - za sklop 1 in/ali sklop 2 v naslednji obliki:

Ponudnik pridobi Ponudbeni predračun v elektronski obliki, izdelani s sistemom PIS na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike pod šifro predračuna N06Z084 za 1. sklop in pod šifro predračuna N06Z085 za 2. sklop. Datoteki N06Z084.md3 in N06Z085.md3 ponudniku služita kot osnova za pripravo Ponudbenega predračuna v tiskani in elektronski obliki.

Projektno informacijski sistem (PIS) je sestavljen iz petih neodvisnih modulov in glavnega modula iPIS, ki omogočajo popoln pregled projektov nizkih gradenj. Ta sistem zajema vse faze od priprave projektantovih popisov do poteka razpisnih postopkov in do spremljanja fizične in finančne realizacije projekta nizkih gradenj v smislu mesečnih situacij, ki jih izvajalcu potrjuje nadzor. Modul iPIS je ključni modul celotnega sistema in služi za kontrolo in kot povezava med ostalimi moduli.

Ponudnik mora na osnovi prejete dokumentacije izdelati Ponudbeni predračun (Poglavlje 6) z uporabo informacijskega sistema PIS.

45/107

Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati na vsaki strani podpisan Ponudbeni predračun v tiskani obliki in ponudbeni predračun v elektronski obliki, izdelani s sistemom PIS (.md4 datoteka).

V slučaju neskladja bo veljala tiskana oblika, zvezana z vrvico in zapečaten. Enako velja tiskana oblika, zvezana z vrvico in zapečaten tudi v primeru, da elektronske oblike ponudbenega predračuna ni mogoče prenesti v sistem PIS

9. Izpolnjeno in podpisano Poglavlje 7 - Osnutek pogodbe (podpisana mora biti vsaka stran), v primeru skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, mora ponudba vsebovati tudi pooblastilo/a vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe v skladu z vzorcem pooblastila, kot je podan v razpisni dokumentaciji (pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti za vse partnerje),
10. Podpisano Poglavlje 8 (Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku),
11. Izjavo o seznanjenosti s Poglavljem 9 in njegovim upoštevanjem pri pripravi ponudbe in izvedbi del,
12. Izpolnjeno podpisano Poglavlje 10 vključno z vsemi zahtevanimi dokazili,
13. Eno podpisano kopijo vsakega Pojasnila, izdanega v skladu s členom 10 teh Navodil ponudnikom in Dodatka, sprejetega v skladu s členom 11 teh Navodil ponudnikom,
14. V primeru Skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, mora ponudba vsebovati tudi kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupine izvajalcev in kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom.

Zaželeno je, da so vsi sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi v vrstnem redu, kot sledi iz podčlena 13.1 teh Navodil ponudnikom, opremljeni s pregradnimi kartoni, zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov, in zapečateni.

13.2 Merilo za izbiro ponudbe

Edino merilo za izbiro ponudbe je najnižja cena.

V primeru, da dva ali več ponudnika/ov ponudita/jo enako najnižjo ponudbeno ceno, bo izbrana ponudba, ki je bila prej predana na naslov, kot je naveden v podčlenu 22.1 teh Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Ponudbena cena

- 14.1 Šteje se, da je Izvajalec pred oddajo svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal bodoče gradbišče in okolico, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vires za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov, povračil - odškodnin za škodo povzročeno v času gradnje in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
- 14.2 Ponudbena cena mora vključevati vse stroške za Izvajalčevo opremo (vozila, stroji in naprave), transport, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanja, dajatve in vse ostale stroške vključno z morebitnimi licenčninami, ki so potrebni za izvedbo del, skupaj z vsemi splošnimi risiki, odgovornostmi in obveznostmi navedenimi in prikazanimi v Splošnih pogojih pogodbe, Posebnih pogojih in Dodatkih (Addendumih).

h6/407

- 14.3 Ponudbena cena mora vključevati vse stroške za izdelavo elaborata zapore ceste (začasna prometna ureditev za čas izvajanja del) in tehnološkega elaborata.

Naročnik ima že izdelan PZI za izvedbo parcelne ograje APO-PO1 na AC odseku Dramlje-Celje (sklop 1) in posebne strokovne podlage (PSP) na nivoju projekta PGD za gradnjo PHO za vsak sklop posebej.

Izvleček iz PSP za gradnjo PHO naročnik podaja v tej razpisni dokumentaciji kot neobvezujočo rešitev. Dovoljuje se sprememba montažnega dela in načina temeljenja, pri čemer mora biti ohranjen obseg del iz točke 2. Smernic za gradnjo protihrupnih ograj na AC Dramlje-Celje-Arja vas. Ohranjene morajo biti oblika, barve in tehnične karakteristike PHO kot je predvideno v PSP. Izbranemu izvajalcu se dovoljuje izbor materiala certificiranih protihrupnih panelov (aluminij, jeklo ali beton) z enakimi karakteristikami. Za PHO, ki so locirane na brežini, je kot material certificiranih protihrupnih panelov dovoljen tudi les z enakimi karakteristikami (AC odsek Dramlje-Celje: APO-6, APO-8, APO-12, APO-14, APO-15, APO-17.1 in APO-PO-1; AC odsek Celje-Arja vas: APO-9, APO-12 in APO-15). Uporaba drugih materialov ni dovoljena. Spremembe projektnih rešitev ne smejo poslabšati zahtevanih akustičnih in drugih karakteristik vgrajenih elementov. Uspešni Ponudnik, ki bo izbran za izvajalca del, je dolžan izdelati projekt za izvedbo (PZI) za vsak odsek vsakega sklopa. Rešitve podane v PZI morajo v celoti izpolnjevati vse zahteve podane v Smernicah za gradnjo protihrupnih ograj na AC Dramlje-Celje-Arja vas. Naročnik bo PZI projekt predal v recenziranje oz. revidiranje, izbrani izvajalec del pa bo dolžan popraviti PZI projekt po pripombah recenzentov (revidentov) in ga predložiti naročniku najkasneje v roku 10 dni po prejemu Zapisnika recenzijske (revizijske) obravnave. V ceni izdelave PZI je potrebno upoštevati tudi stroške projektantskega nadzora v času gradnje.

Projekti faze PZI popravljeni po pripombah recenzentov/revidentov morajo biti predloženi Naročniku v 6 (šestih) izvodih v tiskani obliki ter dveh izvodih v elektronski obliki.

V ponudbeni ceni mora biti upoštevan tudi geotehnični nadzor.

V ponudbeni ceni morajo ponudniki upoštevati tudi vse morebitne stroške začasnih deponij, odprava morebitnih poškodb komunalnih in drugih vodov.

Stroški za nadzor upravljavcev komunalnih vodov pri gradnji so zajeti v poglavju 6 - Ponudbeni predračun (št. NO6Z084 za sklop 1), 1 - Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, v postavki 0005, normativ N 11 026, kjer je potrebno upoštevati za znesek nadzora upravljavcev komunalnih vodov vrednost 12.800,00 EUR (brez DDV) in Ponudbeni predračun (št. NO6Z085 za sklop 2), 1 Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, v postavki 0011, normativ N 11 023, kjer je potrebno upoštevati za znesek nadzora upravljavcev komunalnih vodov vrednost 11.200,00 EUR (brez DDV). V poglavju 6 ponudbenega predračuna je citirana postavka že ovrednotena in je ponudnik ne sme spreminjati. Obračun nadzora upravljavcev komunalnih vodov se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa upravljavca komunalnih vodov.

Začasno vodenje prometa po vzporednih državnih cestah v fazi 3 in fazi 4 pri gradnji sklopa 1 so zajeti v poglavju 6 - Ponudbeni predračun (št. NO6Z084 za sklop 1), 1 - Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, v postavki 0002, normativ N 1 2 101, kjer je potrebno upoštevati za znesek začasnega vodenja prometa po vzporednih državnih cestah vrednost 5.000,00 EUR (brez DDV). V poglavju 6 ponudbenega predračuna je citirana postavka že ovrednotena in je ponudnik ne sme spreminjati. Obračun začasnega vodenja prometa po vzporednih državnih cestah se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa upravljavca državnih cest.

47/404

- 14.4 Ponudniki so pozvani, da predložijo ponudbe po načelu »Ključ v roke« za vsa razpisana dela razen za pripravljalna in zaključna dela.

Za pripravljalna in zaključna dela so ponudniki pozvani, da predložijo ponudbe na osnovi enotnih cen iz Ponudbenega predračuna.

- 14.5 Ponudnik izpolni cene za vse pozicije del opisane v Predračunu (Poglavje 6), ne glede na to ali je zahtevana ponudba na osnovi enotnih cen ali po načelu "Ključ v roke". Pri tem nobena od cen ne sme biti enaka 0.

- 14.6 Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške povezane z organizacijo gradbišča in s faznostjo gradnje, vključno s stroški varnostnih ukrepov (varovanje prometa in gradbišča).

Ponudnik je tako v ponujenih cenah dolžan upoštevati tudi vse stroške izdelave potrebne dokumentacije za izvedbo prometnih zapor ter vse stroške pridobivanja ustreznih soglasij in dovoljenj za postavitve prometne signalizacije.

V skladu z določili 7. odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/2010, 48/2012) bo zaporo ceste postavil DARS d.d. (razenčasne varnostne ograje in začasnih talnih označb), ki bo v okviru rednega nadzora stanja ceste zagotovil tudi nadzor stanja začasne prometne signalizacije. Izvajalec del mora imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste. Odstranitev začasne prometne signalizacije in prometne opreme po končanih delih izvede DARS d.d. (razenčasne varnostne ograje in začasnih talnih označb). Stroški za zaporo (razen stroškov postavitve in odstranitve začasne varnostne ograje in začasnih talnih označb) za ponujeni rok izvedbe del niso predmet te pogodbe in jih krije naročnik.

V primeru daljšega skupnega trajanja zapor, ki je posledica razlogov na strani izvajalca, stroške za zaporo izven ponujenega roka izvedbe del nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del sam na lastne stroške pridobiti vse podatke o obstoječih komunalnih vodih, ker bo sicer odgovarjal za škodo, če bo le-te kakorkoli poškodoval.

Stroški za projektantski nadzor v času izvajanja parcelne ograje APO-PO1 so zajeti v Poglavju 6 - Ponudbeni predračun (št. N06Z084), 1 - Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, v postavki št. 0004, normativ S 7 9 311, kjer je potrebno upoštevati za znesek projektantskega nadzora vrednost 1.600,00 EUR brez DDV. V poglavju 6 Ponudbenega predračuna /popis del/ je citirana postavka že ovrednotena in je ponudnik ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.

- 14.7 Vse dajatve, takse in drugi izdatki, ki jih mora plačati izvajalec v skladu z zakonodajo, veljavno na 14. dan pred iztekom roka za predložitev ponudb, morajo biti vsebovani v enotnih količinah in cenah kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, ki jo predloži ponudnik.

Za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 10/10 - ur.p.b.) tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik, upošteva tudi stališče iz uradnega pojasnila MF, DURS, Generalnega davčnega urada, štev: 4230-48/2009 01032-01 z dne 05.02.2010 glede na pretežnost gradbenih storitev. Davek na dodano vrednost (DDV) pri ponudbeni ceni mora biti izkazan posebej, kot je navedeno v rekapitulacijah Ponudbenega predračuna - Poglavje 6.

- 14.8 Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

- 14.9 V primeru, ko se zahteva za izvedbo Del, da Ponudnik ponudi ceno po načelu "Ključ v roke", so količine, ki so podane v projektantskem popisu del, podanem v Poglavju 9, okvirne in razlike do dejanskih količin ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnegakoli doplačila pri oddaji Del po načelu "Ključ v roke".

14.10 Popusti na ponudbeno ceno niso dovoljeni. V kolikor ponudnik želi spremeniti ponudbeno ceno, mora to storiti na način, kot je naveden v podčleni 24.1 Navodil ponudnikom.

15. Valute ponudbe in plačil

15.1 Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izključno v valuti, ki je uradno plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji.

16. Veljavnost ponudbe

16.1 Ponudbe, brez kakršnihkoli popravkov ponudbenih cen ostanejo v veljavi do vključno dne 25.4.2014

16.2 Naročnik lahko pred iztekom predvidenega roka za veljavnost ponudbe pozove ponudnike k podaljšanju roka veljavnosti ponudbe za dodaten čas. Zahteva, oziroma odgovori nanjo, morajo potekati v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik v takem slučaju podaljša veljavnost garancije za resnost ponudbe za čas podaljšanja, vse v skladu s členom 17 teh Navodil ponudnikom. Ponudnik lahko odkloni tako zahtevo.

17. Garancija za resnost ponudbe

17.1 Ponudnik predloži kot sestavni del ponudbe Garancijo za resnost ponudbe v znesku 473.000,00 EUR za Sklop 1 in Garancijo za resnost ponudbe v znesku 527.000,00 EUR za Sklop 2.

17.2 Garancija za resnost ponudbe mora biti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnicah ter izdana od:

a) banke v državi naročnika ali

b) tuje banke, preko korespondenčne banke v državi naročnika,
ali v obliki kavcijskega zavarovanja izdanega s strani zavarovalnice.

Oblika garancije naj bo v skladu z vzorcem bančne garancije v prilogi "B" Ponudbe - Poglavlje 5 razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik priloži kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, mora biti vsebina skladna z vzorcem, kot je podan za bančno garancijo za resnost ponudb v poglavju 5 predmetne razpisne dokumentacije.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi do vključno dne 5.5.2014

17.3 Garancije za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjene potem, ko bo naročnikova odločitev o oddaji naročila pravomočna. Garancija za resnost ponudbe bo izbranemu ponudniku vrnjena potem, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo z naročnikom in predloži zahtevano Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, ko naročnik ne sprejme odločitve o oddaji naročila, pa bodo garancije za resnost ponudbe vsem ponudnikom vrnjene po pravomočnosti naročnikove odločitve v predmetnem postopku javnega naročanja.

17.4 Garancija za resnost ponudbe je unovčljiva:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne vrne podpisane pogodbe naročniku v roku 10 dni od prejema (podčlen 32.3 Navodil ponudnikom) ali
 - ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, kot je določen v podčlenu 33.1 Navodil ponudnikom).

18. Priprava variantne ponudbe

18.1 Za navedeno javno naročilo variantne ponudbe niso sprejemljive. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo brez kakršnihkoli odstopanj.

19. Sestanek pred oddajo ponudbe

19.1 Naročnik ne bo imel sestanka pred oddajo ponudb. Za pojasnjevanje bistvenih vprašanj, ki zadevajo razpisno dokumentacijo in postopek oddaje del, se uporabijo navodila v členu 10 teh Navodil ponudnikom.

20. Oblika ponudb

20.1 Ponudnik mora ponudbo pripraviti v enem izvodu na način, kot je to opisano v podčlenu 13.1 teh Navodil ponudnikom.

20.2 Razpisne dokumentacije ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati.

D. ODDAJA PONUDBE

21. Pečatenje in označevanje ponudb

- 21.1 Ponudnik bo ponudbo zapečatil oziroma zaprl v ovojnico tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako kot je bila predana in jo naslovil na naročnika na sledeči naslov:

**Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje
izpostava Ljubljana, Dunajska 7**

- 21.2 Ovoj mora biti opremljen s sledečimi podatki (navedeno v okvirju):

<p style="text-align: center;">PONUDBA za Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 1. SKLOP - Gradnja PHO na odseku AC-A1 0039/0639 Dramlje-Celje 2. SKLOP - Gradnja PHO na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas NE ODPIRAJ PRED 5.11.2013 do 11:00 ure</p>
--

Ponudnik naj na ovoj navedel le tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Poleg tega mora biti na ovoj naveden pošiljatelj, kar bo omogočilo vračilo neodprte ponudbe, ki bi skladno s členom 23 teh Navodil ponudnikom bila razglašena za "nepravočasno".

V kolikor ovoj ni zapečaten oziroma ustrezno zaprt in označen, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe.

22. Skrajni rok za predložitev ponudbe

- 22.1 Ponudba mora biti vložena na naslov **DARS d.d. Dunajska 7, Ljubljana, v glavno pisarno, do 10:00 ure, dne 5.11.2013.** Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.
- 22.2 Naročnik lahko podaljša skrajni rok za oddajo ponudb v skladu s členom 11 teh Navodil ponudnikom. Podaljšanje roka bo naročnik objavil v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil.

23. Nepravočasno dostavljene ponudbe

- 23.1 Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po izteku roka, določenega za prejem ponudb, navedenem v členu 22 teh Navodil ponudnikom bo nepravočasna in se z navedbo, da je nepravočasna, neodprta vrne pošiljatelju.

24. Spremembe, dopolnitve in umik ponudbe

- 24.1 S spremembo ali dopolnitvijo ponudbe mora ponudnik dopolniti oziroma spremeniti in nadomestiti že predloženi del ponudbe z novim.

5/1/2013

V kolikor sprememba ponudbe vsebuje tudi spremembo ponudbene cene, mora ponudnik v Spremembi ponudbe predložiti novo Poglavlje 5 - Ponudba (razen garancije za resnost ponudbe in Dodatka »A« k ponudbi), izpolnjen osnutek Pogodbe (Poglavje 7) in ponudbeni predračun (Poglavje 6) in pripadajoče spremembe podatkov o podizvajalcih. Sprememba ponudbene cene mora biti zajeta v vseh enotnih cenah ponudbenega predračuna.

- 24.2 Ponudnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo ponudbo po predložitvi ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku spremembo, dopolnitev ali umik ponudbe pred skrajnim rokom za predložitev ponudb.
- 24.3 Spremembo, dopolnitev ali umik ponudbe je ponudnik dolžan predložiti v skladu z določili členov 20 in 21 teh Navodil ponudnikom in dodatno in primerno označeno s »SPREMEMBA«, »DOPOLNITEV« ali "UMIK". V primeru predložitve spremembe in/all dopolnitve ponudbe, bo strokovna komisija v postopku javnega odpiranja ponudb le-te odprla in prebrala pred odprtjem osnovne ponudbe.
- 24.4 Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. Kadar to storil po poteku roka za oddajo ponudb, mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe.

E. ODPIRANJE, PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

25. Javno odpiranje ponudb

25.1 Strokovna komisija za pregled in ocenjevanje ponudb, ki jo bo imenoval naročnik, bo odpirala ponudbe, vključno s spremembami oziroma umiki v skladu s členom 24 teh Navodil ponudnikom v prisotnosti predstavnikov ponudnika, ki žele biti navzoči, **v Ljubljani, v sejni sobi 509, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, 5.11.2013 ob 11:00 uri**. Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.

Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom.

25.2 Obvestila o umiku in spremembi se bodo odpirala in objavila pred ponudbo. Ponudbe za katere je prispelo obvestilo o umiku, v skladu s členom 24 teh Navodil ponudnikom, se ne bodo odpirale, temveč se bodo vrstile ponudnikom.

25.3 Imena ponudnikov, ponudbene cene (brez DDV), predložitvev oziroma ne predložitvev Garancije za resnost ponudbe in vse ostale podrobnosti, ki jih naročnik smatra za primerne bo naročnik objavil na odpiranju. Ponudbe (in spremembe oz. dopolnitve predložene v skladu s 24 členom teh Navodil ponudnikom), ki na odpiranju ne bodo odprte ali prebrane se v postopku ocenjevanja ponudb ne bodo upoštevale ne glede na okoliščine.

25.4 Strokovna komisija za pregled in ocenjevanje ponudb, ki jo je imenoval naročnik, bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščen predstavniki ponudnikov.

26. Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pravočasne ponudbe razvrstil glede na merila in preveril ali je ponudba, ki je glede na merilo prvo uvrščena, popolna. V kolikor bo ugotovil, da je prvo uvrščena ponudba glede na merila nepopolna, bo preveril popolnost naslednje ponudbe v skladu z razvrstitvijo po merilih.

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnika naknadno zahteva še pojasnilo glede cen za postavke, za katere meni, da je to potrebno.

27. Zaupnost postopka

27.1 Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, štejejo za osebne ali ki se glede na določbe zakona, ki ureja tajne podatke štejejo za tajne podatke ali ki se glede na določbe zakona o gospodarskih družbah štejejo kot poslovna skrivnost.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dele ponudbene dokumentacije, pri katerih gre za podatke, ki imajo značaj poslovne skrivnosti skladno določilom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009 ur.p.b. in spremembe), mora ponudnik v ponudbi označiti kot poslovno skrivnost.

28. Dopustne dopolnitve ponudb

28.1 V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, bo, v kolikor določenega dejstva ne more sam preveriti, dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Dopolnitev ponudbe mora izkazovati stanje na dan, ki je določen kot skrajni rok za oddaje ponudbe po tem javnem naročilu. Če ponudnik v roku, kot ga bo v zahtevi določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil.

Ponudnik sam ne sme spreminjati:

- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

28.2 Računske napake

Naročnik bo preveril ponudbe glede očitnih računskih napak. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Ponudnik je dolžan posredovati zahtevano soglasje v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika.

Računske napake bo naročnik popravil na sledeč način:

- a) kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženi z besedami;
- b) kjer obstaja razlika med cenami na enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen na enoto in količinami, bo merodajna cena na enoto, kot je navedena.

28.3 Znesek, naveden v obrazcu ponudbe, bo naročnik popravil v skladu z zgoraj navedenim postopkom za popravilo napak s soglasjem ponudnika in se bo smatral za ponudnika obvezujoč. V kolikor ponudnik ne soglaša s korigirano ponudbeno ceno v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika, bo njegova ponudba zavržena kot nepravilna.

F. ODDAJA DEL

29. Oddaja del

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku sprejel odločitve o oddaji naročila. Svoje odločitve bo obrazložil in navedel ugotovitve ter razloge zanje.

V kolikor v predmetnem postopku v skladu s prvim odstavkom 79. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-2) ne bo mogoče sprejeti odločitve o oddaji naročila, naročnik lahko izvede nov postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

30. Zavrnitev vseh ponudb, ustavitve postopka, odstop od izvedbe javnega naročila

- 30.1 Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo in svoj nadzorni organ. Navedeno odločitev mora naročnik objaviti na način, kot je objavil obvestilo o javnem naročilu.

Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

- 30.2 Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih ob tem obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja. Navedeno odločitev mora naročnik objaviti na način, kot je objavil obvestilo o javnem naročilu.

- 30.3 Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike, ki so predložili ponudbo.

31. Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila.

V kolikor odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do nelzbranega ponudnika, lahko ta ponudnik v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Ponudnik lahko vloži tudi zahtevek za revizijo v skladu z določili ZJN-2 in v skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le temu v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati naslednje podatke, kot so opredeljeni v trinajstem odstavku 71. člena ZJN-2:

Št. projekta: 2012/000315


Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili teh Navodil ponudnikom, da smo jih razumeli
ter soglašamo, da so sestavni del pogodbe.

Datum: 11. 11. 2013.

Podpis:

 **WERKOS**
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)



Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

3.

IZJAVA

**o poznavanju in sprejemanju Pogojev Pogodb pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno in za
gradbena in inženirska dela , ki jih načrtuje izvajalec , FIDIC prva izdaja
1999; (rumena knjiga)**



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

Izjava o poznavanju in sprejemanju Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje Izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999; (rumena knjiga);

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Celje, marec 2013

59/407

SPLOŠNI POGOJI POGODBE

IZJAVA

Ponudba in izvajanje del morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999 (rumena knjiga), ki jih je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:

FIDIC
P.O. Box 86 CH - 1000 Lausanne 12, Switzerland
Telefon: +41 21653 5003
Fax: +41 21 653 5432
e-mail fidic@pobox.com
<http://www.fidic.org>

Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije
ZISPS - Združenje inženirsko svetovalnih podjetij
Dimičeva ul. 13
1000 Ljubljana


Telephone: +386 01 589 80 00
Fax: +386 01 589 81 00
<http://www.gzs.si>

Ti Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, so podvrženi spremembam in dodatkom prikazanim v Poglavju 3, Posebnih pogojev pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999, in tudi razpolaga z njo. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitve izvoda teh Splošnih pogojev, podpisane od osebe, ki je tudi pooblaščen za podpis ponudbe.

Datum: 11. 11. 2012.

Podpis ponudnika:

 **WERKOS**
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)



Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

SPLOŠNI POGOJI POGODBE

IZJAVA

Ponudba in izvajanje del morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999 (rumena knjiga), ki jih je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:

FIDIC
P.O. Box 86 CH - 1000 Lausanne 12, Switzerland
Telefon: +41 21653 5003
Fax: +41 21 653 5432
e-mail fidic@pobox.com
<http://www.fidic.org>

Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije
ZISPS - Združenje inženirsko svetovalnih podjetij
Dimičeva ul. 13
1000 Ljubljana

Telephone: +386 01 589 80 00
Fax: +386 01 589 81 00
<http://www.gzs.si>

Ti Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, so podvrženi spremembam in dodatkom prikazanim v Poglavju 3, Posebnih pogojev pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999, in tudi razpolaga z njo. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda teh Splošnih pogojev, podpisane od osebe, ki je tudi pooblaščen za podpis ponudbe.

Datum:

22.11.2013

Podpis ponudnika:

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trplmirova 4

4

61/107

SPLOŠNI POGOJI POGODBE

IZJAVA

Ponudba in izvajanje del morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999 (rumena knjiga), ki jih je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:

FIDIC
P.O. Box 86 CH - 1000 Lausanne 12, Switzerland
Telefon: +41 21653 5003
Fax: +41 21 653 5432
e-mail fidic@pobox.com
<http://www.fidic.org>

Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije
ZISPS - Združenje inženirsko svetovalnih podjetij
Dimičeva ul. 13
1000 Ljubljana

Telephone: +386 01 589 80 00
Fax: +386 01 589 81 00
<http://www.gzs.si>

Ti Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, so podvrženi spremembam in dodatkom prikazanim v Poglavju 3, Posebnih pogojev pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999, in tudi razpolaga z njo. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitve izvoda teh Splošnih pogojev, podpisanega od osebe, ki je tudi pooblaščen za podpis ponudbe.

Datum: 22.11.2013.

Podpis ponudnika:

 **GODINA**
d.o.o.
Ost-Hrpele 22, KOZINA

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) In odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

4.

POGLAVJE 3

Posebni pogoji pogodbe

63/107



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 3



II. DEL - POSEBNI POGOJI

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AČ-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje in odseku
0040/0640 Celje-Arja vas**

Celje, september 2013

64/107

Pogoji Pogodbe vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo *Pogoje Pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec*, Prva Izdaja 1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) (rumena knjiga) in v nadaljevanju navedene *Posebne pogoje*, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev.

POSEBNI POGOJI

Člen 1 - Splošne določbe

Doda se:

1.1 Definicije

Pri pogodbenih pogojih (»teh pogojih«), ki vključujejo Posebne pogoje in te Splošne pogoje, imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomen. Besede, ki označujejo osebe ali stranke, pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo zahteva drugačen pomen.

1.1.1.5 V »zahteve naročnika« so vključeni vsi podatki naročnika v razpisni dokumentaciji, Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki in TSC, Ponudbeni predračun (Popis del), zahteve po izdelavi dokumentacije (tehnološki elaborat, terminski in finančni plan, izpolnitev obrazcev, itd), Smernice za izgradnjo protihrupnih ograj na AC Dramlje-Celje-Arja vas.

1.1.2 Stranke in osebe

1.1.2.2 »Naročnik« je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..

1.1.2.4 »Inženir« je DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni: konzorcij podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.1.2.11 »Odgovorna oseba naročnika, ponudnika oziroma podizvajalca« je oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, odgovorna za prekršek, ki je bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva.

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje

Podpis: _____



1
65/404

1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni: čas za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje Potrdila o prevzemu do končnega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi, po katerem se zadržani znesek vrne izvajalcu.

1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del.

1.1.3.11 Za »dokument o končni poravnavi« (podčlen 14.12) se smatra »zapisnik o končnem obračunu - kolavdacijski zapisnik«

1.1.4 Denar in plačila

1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 (pogodbena cena in plačilo) in ki ni potrdilo o končnem plačilu.

Potrdilo o vmesnem plačilu se za obseg pripravljanih in zaključnih del vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih del, ter se vodi v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08).

1.1.4.12 »Cena po enoti mere« pomeni ceno po enoti količine, ki je navedena v ponudbenem predračunu za obseg pripravljanih in zaključnih del.

1.1.5.1 Dela in blago

1.1.5.6 »Odsek« ne vključuje samo določenega zaključenega odseka ceste, ampak tudi vsakršne vrste del, posebej označene v pogodbi.

1.1.6 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso nacionalno (ali državno) zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in podzakonske akte katerekoli zakonito postavljene oblasti Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08).

Podčlen 1.3 - Sporočanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov naročnika je:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija
Predsednik uprave mag. Matjaž Knez
Telefon št.: 03 / 544 20 00
Telefax št.: 03 / 544 20 01

Podpis: _____

2

66/hvj

Naziv in naslov inženirja je:

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
ki jo zastopa poslovodstvo v sestavi Saša Kovačič, univ.dipl.inž.grad. kot generalni
direktor in Tadej Veber, univ.dipl.inž.arh. kot član poslovodstva
Telefon št.: 01 / 306 81 00
Telefax št.: 01 / 306 81 70

Podčlen 1.4- Pravo in jezik

Podčlen se spremeni in se glasi:

- (a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
- (b) Za vse izvajalce bo za tolmačenje merodajen slovenski jezik.

Podčlen 1.5 - Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se zbríše in nadomesti z novim zaporedjem dokumentov, kot sledi:

- (1) Pogodba/Pogodbeni sporazum
- (3) Ponudbo in Prilogo »A« k ponudbi
- (4) Posebni pogoji pogodbe
- (5) Splošni pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, Prva izdaja 1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Consells (FIDIC) (rumena knjiga)
- (6) Zahteve naročnika (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki in TSC, Ponudbeni predračun (Popis del), zahteve po izdelavi dokumentacije (tehnološki elaborat, terminski in finančni plan, izpolnitev obrazcev, itd), Smernice za gradnjo protihrupnih ograd na AC Dramlje-Celje-Arja vas)
- (7) Predračuni
- (8) Terminski in finančni plani
- (9) Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev
- (10) Soglasja podizvajalcev
- (11) Dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.

Podčlen 1.10 -Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika

Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

"Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan predloge za ukrepe podati izvajalec in jih, v skladu s Pogodbo, tudi finančno ovrednotiti".

Nov podčlen:

Člen 1.15 - Zaupne podrobnosti

Izvajalec bo celotno vsebino pogodbe smatral kot zasebno in zaupno in jo hranil kot takšno in v ta namen ter je ne bo razkrival v celoti ali delno v nobeni tržni reviji ali tehnični reviji ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru spora glede potrebnosti objave ali razkritja za potrebe pogodbe bo odločal naročnik.

Podpis: _____

3

67/404

Člen 3 - Inženir

Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu podčlena se doda:

Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo:

- (a) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členu 13;
- (b) določil podaljšanje roka po členu 8.4;
- (c) odobril spremembe (po členu 13);
- (d) določil cene po členu 12.

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu s členom 13 in bo skladno s tem obvestil izvajalca in s kopijo naročnika.

Člen 4 - Izvajalec

Podčlen 4.1 - Splošne obveznosti izvajalca

Na koncu Podčlena 4.1 se doda sledeče:

Izbrani izvajalec del mora za vsak odsek znotraj posameznega sklopa za katerega je sklenil pogodbo, razen za parcelno ograjo APO-PO-1, izdelati projekt za izvedbo (PZI), vključno z vsemi potrebnimi elaborati, raziskavami materialov in konstrukcij, geomehanskimi in geotehničnimi raziskavami temeljnih tal in geodetskimi načrti. Rešitve podane v projektu za izvedbo (PZI) morajo v celoti izpolnjevati vse zahteve podane Smernicah za gradnjo protihrupnih ograj na AC Dramlje-Celje-Arja vas.

Naročnik ima že izdelane projekte - posebne strokovne podlage (PSP) - na nivoju PGD, tako za Sklop 1 kot za Sklop 2 ter PZI za parcelno ograjo APO-PO-1. Izvlečke iz PSP-ja naročnik podaja v tej razpisni dokumentaciji kot neobvezujočo rešitev. Dovoljuje se sprememba montažnega dela in načina temeljenja, pri čemer mora biti ohranjen obseg del iz točke 2. Smernic za izgradnjo protihrupnih ograj na AC Dramlje-Celje-Arja vas. Ohranjene morajo biti oblika, barve in tehnične karakteristike PHO kot je predvideno v PSP. Izbranemu izvajalcu se dovoljuje izbor materiala certificiranih protihrupnih panelov (aluminij, jeklo ali beton) z enakimi karakteristikami, upoštevajoč oblikovalska izhodišča iz točke 2.1 Smernic za izgradnjo protihrupnih ograj na AC Dramlje-Celje-Arja vas. Za PHO, ki so locirane na brežini, je kot material certificiranih protihrupnih panelov dovoljen tudi les z enakimi karakteristikami (AC odsek Dramlje-Celje: APO-6, APO-8, APO-12, APO-14, APO-15, APO-17.1 in APO-PO-1; AC odsek Celje-Arja vas: APO-9, APO-12 in APO-15). Uporaba drugih materialov ni dovoljena. Spremembe projektnih rešitev ne smejo poslabšati zahtevanih akustičnih in drugih karakteristik vgrajenih elementov. PZI projekt za posamezni odsek posameznega sklopa mora biti predložen naročniku v potrditev najkasneje v roku 45 oziroma 90 dni po sklenitvi pogodbe za posamezni sklop. Naročnik bo PZI projekt predal v revidiranje oz. recenziranje, izbrani izvajalec del pa bo dolžan popraviti PZI projekt za posamezen odsek po pripombah revidentov/recenzentov in ga predložiti naročniku najkasneje v roku 10 dni po prejemu pripomb. Projekti faze PZI, popravljeni po pripombah revidentov/recenzentov, morajo biti predloženi naročniku v 6 (šestih) izvodih v tiskani obliki in dva izvoda v elektronski obliki.

Podpis: _____



Podčlen 4.5 - Imenovani podizvajalci

Podčlen se v celoti črta.

Podčlen 4.9 - Zagotavljanje kakovosti

Podčlenu se doda:

"Izvajalec bo izdelal in dostavil naročniku pred pričetkom gradbenih del Tehnološke elaborate za izvedbo posameznih del, izdelke in njihovo montažo po tej pogodbi, katerega bo potrdil inženir. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehnični pogoji.

Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji."

Podčlen 4.18 - Varstvo okolja

Na koncu člena se doda:

Izvajalec bo v času trajanja del na svoje stroške podvzel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja kot to zahtevajo oblasti, ki so pristojne za uveljavljanje zakonodaje. Stroške za varstvo in zaščito okolja bo ponudnik vključil v enotne cene in cene "na ključ" v ponudbenem predračunu.

V času izvajanja del mora izvajalec del proučiti veljavno zakonodajo na področju zaščite okolja in podzakonske akte.

Izvajalec mora zagotoviti nemoteno oskrbo javnih dobav po obstoječih javnih vodih in napravah.

Podčlen 4.25 Garancija za odpravo napak

Na koncu podčlena se doda:

"Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.1. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v Dodatku k ponudbi in ne more biti daljši od 10 let za vsa razpisana dela.

Izvajalec mora pred prejetjem "Potrdila o izvedbi", predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del brez DDV). Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:

a) banka v državi naročnika ali

b) tuja banka, preko korespondenčne banke v državi naročnika,

Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta v uporabo ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega kateri rok je zgodnejši. Za predajo objekta v uporabo se šteje sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da predlaga izdajo Dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur na dan. "

Podčlen 5.6 - Dokumenti Izvedenih del

Podpis: _____

Na koncu podčlena se doda:

"Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju načrte izvedenih del (PID), podatke za kataster GJI, Navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsa dela in geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v tiskani in elektronski obliki. Navedeno dokumentacijo mora predložiti naročniku v 4 (štirih) izvodih v tiskani in elektronski obliki

Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:

- grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,
- tekstualni del v formatu .doc,
- tabelarični del v formatu .xls."

Člen 6 - Kadri in delavci

Podčlen 6.8 - Nadzor s strani izvajalca

Vstavi na koncu podčlena:

Primeren del nadzornega osebja izvajalca mora imeti delovno znanje slovenskega jezika ali pa mora imeti na gradbišču na razpolago zadostno število prevajalcev med celotnim delovnim časom (določeno v podčlenu 1.4).

Člen 7 - Obratna oprema, materiali in izdelava

Podčlen 7.4 - Preskušanje

Zadnji stavek podčlena se zbrše in na koncu podčlena se doda:

»V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Člen 8 - Začetek, zamude in ustavitve

Podčlen 8.1 - Začetek del

Podčlen 8.1 se spremeni tako, da glasi:

»Izvajalec je dolžan pričeti z izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za gradnjo PHO takoj po sklenitvi pogodbe. Z gradnjo PHO je izvajalec dolžan pričeti takoj po delni uvedbi izvajalca v delo za posamezen odsek.«

Podčlen 8.3 - Program

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. V kolikor bodo dela oddana več izvajalcem, morajo ti predložiti inženirju medsebojno usklajen mrežni plan napredovanja del. Če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel inženir na stroške izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene. Terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega časa, dnevne količine in kumulativne količine po posamezni postavki

Podpis: _____

Sestavni del terminskega plana je finančni plan, iz katerega bo glede na časovno določene posamezne faze del možno ugotoviti mesečno realizacijo del.

Izvajalec bo izdelal in dostavil naročniku pred pričetkom gradbenih del Tehnološke elaborate za izvedbo posameznih del, izdelke in njihovo montažo po tej pogodbi, katerega bo potrdil inženir. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavlja 4 - Posebni tehnični pogoji.

Izvajalec del si mora pred pričetkom izvajanja del izdelati ali pridobiti elaborat zapore ceste, soglasje ali dovoljenje za zaporo vozišča in druga eventualno potrebna soglasja in dovoljenja po zakonsko določenem postopku na svoje stroške.

V skladu z določili 7. odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/2010, 48/12) bo zaporo ceste na AC postavil DARS d.d. (razen začasne varnostne ograje), ki bo v okviru rednega nadzora stanja ceste zagotovil tudi nadzor stanja začasne prometne signalizacije. Izvajalec del mora imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste. Odstranitev začasne prometne signalizacije in prometne opreme po končanih delih izvede DARS d.d. (razen začasne varnostne ograje). Stroški za zaporo zaporo (razen strošek začasne varnostne ograje) za pogodbeni rok izvedbe del niso predmet te pogodbe in jih krije naročnik.

V primeru daljšega skupnega trajanja zapor, ki je posledica razlogov na strani izvajalca, stroške za zaporo izven pogodbenega roka izvedbe del nosi izvajalec sam.

Pri izvedbi del na odseku 0039/0639 Dramlje-Celje je potrebno zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev preusmeritve prometa na odsek 0639 (smer Maribor) dela najprej izvesti na odseku 0639 (smer Maribor).

Na odseku 0040/0640 Celje-Arja vas je predvidena obnova voziščne konstrukcije. Izbrani izvajalec mora v primeru sočasne izvedbe sodelovati z izbranim izvajalcem obnove voziščne konstrukcije.

Izvajalec mora pred pričetkom del sam na lastne stroške pridobiti vse podatke o obstoječih komunalnih vodih, ker bo sicer odgovarjal za škodo, če bo le-te kakorkoli poškodoval.

Izvajalec mora izvajati dela vsaj ves svetli del dneva, vse dni v tednu, tudi ob sobotah in nedeljah. V primeru, da bo zaradi kakršnih koli vzrokov (doseganja pogodbenega roka, tehnologije izvedbe del, tip in čas zapore prometa itd.) izvajal dela v nočnem času, mora izvajalec zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete predhodno pridobiti soglasje inženirja za opravljanje teh del. V primeru izvajanja del v nočnem času izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila.

Izvajalec del se je dolžan v roku 24 ur odzvati in pripraviti odgovore v sodelovanju s projektantom zapore ceste na vsa novinarska vprašanja, ki so mu posredovana s strani naročnika.

Podčlen 9.1 - Obveznosti izvajalca

Spremeni se tretji odstavek (vključno s točkami a, b, c) in nadomesti z:

»Izvajalec je dolžan izvesti vse preskuse ob dokončanju skladno z zahtevami pogodbe in poskrbeti vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.«

Člen 10 - Prezem s strani naročnika

10.1 - Prezem del in odsekov del

Črtajo se 2., 3. in 4. Odstavek podčlena in se nadomestijo z naslednjim:

»Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da se lahko izda Dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali

Podpis: _____

cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo.«

Člen 13 - Spremembe in prilagoditve

Podčlen 13.8 - Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen se v celoti spremeni in glasi:

»Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.«

Člen 14 - Pogodbena cena in plačilo

Podčlen 14.1 - Pogodbena cena

Na koncu podčlena se doda:

Izvajalec prevzame in izvede dela »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje« oziroma »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas« po sistemu »ključ v roke« tako, da na osnovi zahtev naročnika objekt projektira ter zgradi. Plačila izvedenih del na objektu po sistemu »ključ v roke« se izvedejo v mesečnih zneskih v skladu z deležem izvedenih del.

V pogodbeni vrednosti del, ki se izvedejo po sistemu »ključ v roke« so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo (ne glede na to, ali jo je zagotovil naročnik ali izvajalec), pa tudi dela in dobave, ki s projektno dokumentacijo niso predvidene, so pa predpisane z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebne za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta v skladu z njegovim namenom določenim s pogodbo. Pogodbena vrednost del, ki se izvedejo po sistemu »ključ v roke«, že vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manj del. Za izvedbo morebitnih dodatnih del naročnik in izvajalec skleneta aneks k osnovni pogodbi, v rokih, ki so potrebni za njegovo sestavo, potrditev in podpis.

Plačila izvedenih del za pripravljalna in zaključna dela se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih od inženirja v knjigi obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen. Za izvedbo morebitnih dodatnih del, presežnih oziroma več del ter manjkajočih oziroma manj del ter nepredvidenih del, naročnik in izvajalec skleneta aneks k osnovni pogodbi, v rokih, ki so potrebni za njegovo sestavo, potrditev in podpis.

Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja.

Merjenje izvedenih del je določeno v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih z dodatki (Poglavje 4 razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe."

Podčlen 14.2 - Predplačila

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila.

Podčlen 14.3 - Prošnja za potrdilo o vmesnem plačilu

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:

»Izvajalec bo dostavil naročniku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 kopij situacij. Situacije mora podpisati pooblaščen predstavnik izvajalca, in jih potrditi inženir v obliki, kakršno bo odobril naročnik (uporaba informacijskega sistema I-PIS - tiskana in elektronska oblika). Situacija mora biti podpisana s strani pooblaščenega predstavnika izvajalca in potrjena s strani inženirja.

Podčlen 14.7 - Plačilo

Črta se alineja (a) Podčlena, v alineah (b) in (c) pa se številka 56 zamenja s številko 30 (v tridesetih dneh).

Podčlen 14.10 Obračun (situacija) ob dokončanju

Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Potrdila o prevzemu del predložiti inženirju šest kopij obračuna (situacije) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja:

- (a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo do datuma, navedenega v Potrdilu o prevzemu del;
- (b) vse druge vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen, in
- (c) oceno vseh drugih zneskov, za katere izvajalec meni, da bo postal do njih upravičen po Pogodbi. Ocenjene zneske je treba posebej prikazati v tem končnem obračunu (situaciji).

Inženir mora potem izdati potrdilo v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu].

Podčlen 14.15 - Valute plačil

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče:

»Plačila izvajalcu s strani naročnika se bodo vršila v valuti, v katerih je plačljiva pogodbeni cena, na bančni račun ali račune, ki so določeni v pogodbi«.

Člen 15 - Odstop od pogodbe s strani naročnika

Podčlen 15.2 - Odstop od pogodbe s strani naročnika

v prvem odstavku se doda točka (g), ki glasi:

- (g) brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

Člen 16 - Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca

Člen 16.1 - Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:

»Če inženir ne da potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in podčlenom 14.7 [Plačilo] za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po

obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.

Člen 18 - Zavarovanje

Podčlen 18.1 - Splošne zahteve za zavarovanje

Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:

»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo, s pooblaščenimi zavarovalnimi družbami, ki jih je odobril naročnik in v skladu s predpisi Republike Slovenije«.

Podčlen 18.2 - Zavarovanje izvajalčevih del in opreme

Doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:

»Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode

V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je 1.000.000 EUR.

Podčlen 18.4 - Zavarovanje osebja izvajalca

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

"Zavarovanje bo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in bo strošek izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije".

Člen 20 - Zahtevki, spori in arbitraža

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim:

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani".

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili teh Posebnih pogojev pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del pogodbe.

Datum: 11. 11. 2013.

Podpis ponudnika:

POWERKOS
d.o.o. za inženiring in graditeljstvo
Cesta barjavske h. - Opatje (12)

Podpis: _____

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

5.

IZJAVA

**o seznanjenosti z vsebino Poglavja 4 in njegovem upoštevanju pri pripravi
ponudbe**

7/6/07



Naložba v vašo prihodnost
OPRAVILJO IDELNO FINANCIJA EVROPSKA UNIJA
Kohizijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 4

TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL
In
IZJAVA O SEZNANJENOSTI S POGLAVJEM 4
za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, marec 2013

47/107

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

VSEBINA:

**I. PREGLED VELJAVNOSTI SPLOŠNIH IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJEV TER OSTALE
TEHNIČNE REGULATIVE ZA GRADNJO CEST**

II. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

In IZJAVA O SEZNANJENOSTI S POGlavJEM 4



7/8/1707

I. PREGLED VELJAVNOSTI SPLOŠNIH IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJEV TER OSTALE TEHNIČNE REGULATIVE ZA GRADNJO CEST

V splošnih in posebnih tehničnih pogojih za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP) so v osmih knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj materialov in tehnoloških postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v PTP predvidenih postopkov, kar je pretežno zajeto v dopolnilih PTP od I do VI, izdanih v letih 1996 (I. dopolnitev), 1997, 2000, 2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev).

Po uveljavitvi navedenih TSC, ki v veliki meri nadomeščajo PTP, knjigo IV, ostanejo v veljavi le še naslednja poglavja iz PTP, knjiga IV:

3.3 Tlakovane obrabne plasti

3.4 Robni elementi vozišč

3.5 Bankine.

Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. I: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Navodila:

Dopolnilo k posebnim tehničnim pogojem za zemeljska dela in temeljenje

Hidroizolacije na premostitvenih objektih

Vertikalne hidroizolacije objektov na AC

Dopolnilo PTP, Knjiga 6 - Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije

Dopolnitev poglavja 5.7

Opis del za zaščito podtalnice

Zap. št. 1: Knjiga 6 - Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije
Dopolnitev: tč. 5.7 Hidroizolacije, Splošno - 3 odstavki

Zap. št. 3: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaže
Dopolnitev: tč. 4.2.3.2 Drenažne cevi

Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. II: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Navodila:

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti gotovih betonskih izdelkov

Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona, odpornega na mraz in soli

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste armature

Naloge tehničnega osebja izvajalca pri betonarskih delih

Priporočila za zaščito in nego betona

Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu

Navodilo za vezanje armature in uporabo distančnikov

70/107

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti izdelave hidroizolacije iz brizganega poliuretana

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob AC

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih cevovodov (sistemi za odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi)

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti talnih označb na voziščih

Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Navodila:

Navodilo za vgradnjo trajnih geotehničnih sider

Navodilo za določanje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za voziščne konstrukcije na avtocestah

Navodilo za barvanje sten predorov

Navodilo za preskušanje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo št. 1

Spremembe in dopolnitve Posebnih tehničnih pogojev (PTP)

- Zap. št. 7: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Robni elementi vozišč
Dopolnitev: tč. 3.5.3 Kakovost materialov
- Zap. št. 8: Knjiga 5 - Gradbena in obrtniška dela, Dela s cementnim betonom
Dopolnitev: tč. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe
- Zap. št. 9: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: tč. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo
- Zap. št. 11: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Drenažni trakovi
Dopolnitev: tč. 4.2.3.4 Drenažni trakovi
- Zap. št. 13: Knjiga 7 - Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4 Popis del
- Zap. št. 19: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Jaški in Prepusti
Dopolnitev: tč. 4.4.2.2 Materiali za jaške
Dopolnitev: tč. 4.5.2.2 Materiali za prepuste
- Zap. št. 20: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Jaški in Prepusti
Dopolnitev: tč. 4.4 Jaški, Popis del
Dopolnitev: tč. 4.5 Prepusti, Popis del

80/107

Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. IV: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Spremembe in dopolnitve Posebnih tehničnih pogojev (PTP)

- Zap. št. 21: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Izkopi
Sprememba: tč. 2.1.3.1 Razvrstitev zemljin in kamenin
Sprememba: tč. 2.1.4.7.1
- Zap. št. 22: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Planum, temeljnih tal
Dopolnitev: tč. 2.2.3.1 Zemljine
Sprememba: tč. 2.2.5 Kakovost izvedbe
Dopolnitev in sprememba: tč. 2.2.5.2. Nosilnost
Dopolnitev: tč. 2.2.8.2.3 Zgoščenost in nosilnost
- Zap. št. 23: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Nasipi, zasipni klini, posteljica
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.4.3.2 Kamnitne
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.4.5.2 Nosilnost
- Zap. št. 24: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Drenažne in filtrske plasti, povozni plato
Spremembe in dopolnitve: tč. 2.3.3.2 Kamniti materiali za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato
Spremembe: tč. 2.3.3.3 Nekamniti materiali za drenažne in filtrske plasti
- Zap. št. 25: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Brežine in zelenice, Razprostiranje odvečnega materiala
Dopolnitve: popis del tč. 21 111 do 25 122
Dopolnitve: popis del tč. 29 121 do 29 126
- Zap. št. 26: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Vezane spodnje nosilne plasti
Dopolnitev: tč. 2.1.2.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Spremembe in dopolnitve: tč. 3.1.2.5.1 Zahtevane lastnosti preskušancev
- Zap. št. 28: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Knjiga 6 - Gradbena in obrtniška dela, Nosilne in obrabne plasti - cementni beton, Dela s cementnim betonom
Sprememba: tč. 3.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti - kakovost izvedbe
Dopolnitev: tč. 5.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti - kakovost izvedbe
- Zap. št. 29: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Bankine
Dopolnitev: tč. 3.6.2 Osnovni material
Dopolnitev: tč. 3.6.3 Kakovost materiala
Dopolnitev: tč. 3.6.4 Način izvedbe
Dopolnitev: tč. 3.6.5 Kakovost izvedbe
Dopolnitev: tč. 3.6.6 Preverjanje kakovosti
Dopolnitve: popis del tč. 36 511 do 36 534
- Zap. št. 30: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaže
Sprememba: tč. 4.2.2.3 Materiali za zasip drenaž
Dopolnitev: tč. 4.2.3.2 Drenažne cevi
Spremembe in dopolnitve: tč. 4.2.3.3.1 Zmesi kamnitih zrn
Sprememba: tč. 4.2.3.4 Drenažni trakovi
- Zap. št. 31: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: tč. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo
Sprememba: Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III, Zap. št. 9
Dopolnitev: tč. 4.3.4.6.4
Dopolnitev: Popis del

8/1/2017

Zap. št. 32: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Jaški
Dopolnitev: tč. 4.4.2.2 Materiali za jaške
Dopolnitev: Popis del

Zap. št. 33: Knjiga 5 - Odvodnjavanje, Prepusti
Dopolnitev: tč. 4.5.3.2.3 Cevi iz polimernih materialov

Zap. št. 34: Knjiga 6 - Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije
Dopolnitev: tč. 5.7.3.9 Polimerne folije in polsti.

Zap. št. 35: Knjiga 7 - Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Ograde za zasneževanje
Dopolnitev: Splošno
Dopolnitev: tč. 6.4.1.3 Opis - Ograde za zasneževanje
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4.2.4 Osnovni materiali - Ograde za zasneževanje
Sprememba in dopolnitev: tč. 6.4.3.4 Kakovost materialov - Ograde za zasneževanje
Dopolnitev: tč. 6.4.4.3 Način izvedbe - Ograde za zasneževanje
Dopolnitev: tč. 6.4.6 Preverjanje kakovosti izvedbe
Dopolnitev: tč. 6.4.7 Merjenje in prevzem del

Zap. št. 36: Knjiga 7 - Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Zaščitne ograde
Sprememba in dopolnitev: 6.4.1.2. Opis - Zaščitna ograja
Dopolnitev: tč. 6.4.2.3 Osnovni materiali - Zaščitna ograja
Dopolnitev: tč. 6.4.4.2 Način izvedbe - Zaščitna ograja
Sprememba in dopolnitev: Popis del tč. 64 211 do 64 242 in Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III, Zap. št. 13

Zap. št. 37: Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. III,
Sprememba: Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanja skladnosti materialov trajnih geotehničnih sider, tč. 2.3, razpredelnica 2

Kontrolni listi za spremljanje izvedbe: - Protikorozijske zaščite
- Vgrajenega sidra
- Sidranega objekta

Navodila:

Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojačitve polimernih kanalizacijskih cevi

Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela

Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo žične varovalne ograde na mestih, kjer prihaja do večjih fizičnih obremenitev

Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, ojačenega z jeklenimi vlakni

82/107

Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. V: Veljavna so še sledeča dopolnila:

Spremembe in dopolnitve Posebnih tehničnih pogojev (PTP)

Zap. št. 38: Knjiga 1 - Splošni tehnični pogoji, Tehnični predpisi, Obvezni tehnični predpisi:
Dopolnitev tč. 2.2.4 Tehnične specifikacije za javne ceste (TSC)

Z navedenim dopolnilom so bile v tehnično regulativo za dela na cestah uvedene Tehnične specifikacije za ceste (TSC), ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004.

V dopolnilu navedeni seznam se spremeni in dopolni z veljavnimi tehničnimi specifikacijami za javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za ceste (DRSC).

Zap. št. 39: Knjiga 1 - Splošni tehnični pogoji, Preverjanje in vrednotenje kakovosti, Osnove za finančno vrednotenje:
Dopolnitev: tč. 3.6 Osnove za finančno vrednotenje
Dopolnitev: tč. 3.6.1 Obseg dela
Dopolnitev: tč. 3.6.2 Finančni odbitki

Zap. št. 40: Knjiga 3 - Zemeljska dela in temeljenje, Drenažne in filtrske plasti, povozni plato:
Sprememba in dopolnitev: tč. 2.3.3.3 Geosintetiki za ločilne, drenažne in filtrske plasti

Zap. št. 41: Knjiga 4 - Voziščne konstrukcije, Nevezane nosilne plasti:
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.3.1 Zrnastost zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.4.4 Deponiranje zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.3.2 Mehanske lastnosti
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.6.1 Tekoče preiskave
Sprememba in dopolnitev: tč. 3.1.1.6.2 Kontrolne preiskave

Zap. št. 42: Knjiga 5 - Gradbena in obrtniška dela, Hidroizolacije:
Sprememba in dopolnitev: tč. 5.7.4.1 Priprava površine
Dopolnitev: tč. 5.7.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Navodila:

Navodilo za izdelavo tehnološko-ekonomskega (TEE) elaborata - dopolnilo Splošnih tehničnih pogojev, Knjiga 3 - Dopolnilo št. 1, Tč. 6 Potrjevanje TEE

Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje

Navodilo za dobavo in vgrajevanje ležišč na premostitvenih objektih

Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih

Navodilo za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cementnobetonskih vozišč na cestninskih postajah

Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih objektih

Navodilo za transport asfaltnih zmesi na gradbiščih

Smernice:

Smernice za načrtovanje in rabo geosintetikov za ločilne, filterske in drenažne plasti v cestogradnji

Priporočila:

8.3/107

Priporočila za projektiranje in izvedbo vijačnih prehodov na avtocestah

Dopolnila Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev št. VI: Veljavna je sledeča vsebina:

Prevzemanje gradbenih proizvodov namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest

- Dodatek I - Tehnična regulativa za potrjevanje skladnosti
- Dodatek II - Naloge inštitucije pri zunanji kontroli vgrajevanja
- Dodatek III - Tehnična zakonodaja in regulativa

V letu 2003 so bile izdane in uveljavljene smernice za:

Smernice za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa in

Smernice za vzdrževanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omrežju v republiki Sloveniji

II. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

Na osnovi 7. člena Zakona o javnih cestah izdaja Minister za promet za svoje področje tehnične specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Z dopolnilom PTP št. V so v tehnično regulativo za dela na cestah uvedene nove TSC, ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004.

V dopolnilu navedeni seznam se spremeni in dopolni z veljavnimi tehničnimi specifikacijami za javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za ceste (DRSC).

Uvedene so sledeče TSC:

- 02.210:2012 Varnostne ograje - Pogoji in način postavitve
- 02.203: 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih
- 02.401:2012 Označbe na vozišču; Oblika in mere
- 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa
- 03.341:2012 Krožna križišča
- 04.100:2000 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS
- 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato
- 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti
- 06.320:2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi
- 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi
- 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti
- 06.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke
- 06.417:2001 Vezane obrabne in zaporne plasti, Površinske prevleke
- 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton
- 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesí na dilatacijah
- 06.511:2009 Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev
- 06.512:2003 Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji
- 06.520:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij
- 06.530:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij
- 06.541:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij
- 06.610.2003 Lastnosti vozniš površin, Ravnost
- 06.620:2002 Lastnosti vozniš površin, Torna sposobnost

84/107

- 06.630:2002 Lastnosti voznih površin, Podajnost
- 06.640:2003 Lastnosti voznih površin, Hrupnost
- 06.711:2001 Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom
- 06.712:2003 Meritve gostote, Nadomestni postopki
- 06.713:2005 Meritve gostote, Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev
- 06.720:2003 Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov
- 06.740:2003 Gradnja preskusnih polj
- 06.751: 2006 Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi
- 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic, Laboratorijski preskusi
- 06.753:2006 Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti
- 06.800:3001 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje
- 08.311/1:2005 Redno vzdrževanje cest, Vzdrževanje prometnih površin, Asfaltna vozišča (1 del, 2 del)
- 08.312:2005 Redno vzdrževanje cest, vzdrževalna dela izven vozišč javnih cest
- 08.512:2005 Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na vozni površinah
- 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest

Poleg objavljenih tehničnih specifikacij za javne ceste, se PTP nadgrajuje s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste TSC 07 - Objekti na cestah.

Za objekte na cestah so uvedene sledeče TSC:

TSC 07.100 PREMOSTITVENI OBJEKTI

- TSC 07.101 Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov; (12/2006)
- TSC 07.102 Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah; (12/2006)
- TSC 07.103 Ograje na cestnih objektih; (12/2006)
- TSC 07.104 Hidrolizolacija cestnih objektov; (7/2001)
- TSC 07.105 Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.106 Ležišča premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.107 Dilatacije premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.108 Krilni zidovi; (7/2001)
- TSC 07.109 Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče; (7/2001)
- TSC 07.110 Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.111 Opaži, obdelave in obloge betonskih površin; (7/2001)
- TSC 07.112 Oprema in projekt za vzdrževanje premostitvenih objektov; (7/2001)
- TSC 07.113 Napeljave; (7/2001)
- TSC 07.114 Premostitveni objekti v območju železniških prog; (7/2001)
- TSC 07.115 Smernice za projektiranje prepustov; (7/2001)
- TSC 07.116 Rege; (7/2001)
- TSC 07.117 prenapenjanje brez sovprežnosti; (7/2001)
- TSC 07.118 Konstrukcije iz vodonepropustnega betona; (7/2001)
- TSC 07.119 Temeljenje na uvrtnih kolih; (12/2003)
- TSC 07.120 Temeljenje na vodnjakih; (12/2003)

TSC 07.200 PODPORNE KONSTRUKCIJE

- TSC 07.201 Splošne tehnične specifikacije za podporne konstrukcije; (11/2003)
- TSC 07.202 Geotehnična sidra; (7/2001)
- TSC 07.203 Težnostni zidovi; (4/2004)
- TSC 07.204 Sidrani zidovi; (12/2003)
- TSC 07.205 Pilotne stene; (12/2003)

SS/107

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Razvoj materialov in tehnoloških postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v TSC 07 predvidenih postopkov, kar je pretežno zajeto v okrožnicah k TSC 07, izdanih v letih 2007 do 2009.

- Splošna okrožnica o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splošna okrožnica 6/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splošna okrožnica 7/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splošna okrožnica 8/2008 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
- Splošna okrožnica 9/2009 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah



86/11.7

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehničnih pogojev) se upošteva določila dokumenta, ki je bil izdan zadnji.

V Poglavju 4- Splošni in posebni tehnični pogoji za gradnjo cest z dopolnili I do VI, ostanejo v veljavi vsi tehnični pogoji, kot so podani v navedenih knjigah, in opisani v dokumentu »Pregled veljavnosti splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter ostale tehnične regulative za gradnjo cest.« Postavke s šiframi pa so bile izdelane na novo in v celoti in se uporabljajo v programu IPIS. Datoteke s celotnim naborom standardnih postavk ponudniki lahko pridobijo v *.pdf formatu na istem spletnem naslovu, kot ponudbeni predračun, torej **pls.dars.si**, ne veljajo pa več šifre in opisi postavk v Poglavju 4- Splošni in posebni tehnični pogoji za gradnjo cest z dopolnili I do VI.



87/405

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

POGLAVJE 4

IZJAVA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

- Splošnimi in posebnimi pogoji za gradnjo cest, z dopolnili v knjigah I do VI,
- Tehničnimi specifikacijami za javne ceste in
- Tehničnimi specifikacijami TSC 07 - Objekti na cestah,
- ter ostalo tehnično regulativo za gradnjo cest,

da smo v ponudbi upoštevali vse navedene tehnične zahteve in bomo dela izvedli v skladu z navedenimi zahtevami.

v OSJEKU, dne 11. 11. 2013.

PONUĐNIK
(podpis)

 **WERKOS**
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica barova 6 - Osijek (12)

88/407

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

POGLAVJE 4

IZJAVA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

- Splošnimi in posebnimi pogoji za gradnjo cest, z dopolnili v knjigah I do VI,
- Tehničnimi specifikacijami za javne ceste in
- Tehničnimi specifikacijami TSC 07 - Objekti na cestah,
- ter ostalo tehnično regulativo za gradnjo cest,

da smo v ponudbi upoštevali vse navedene tehnične zahteve in bomo dela izvedli v skladu z navedenimi zahtevami.

v Reki, dne 22.11.2013.

PONUĐNIK
(podpis)


FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

4

89/1037

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protitrupnih ograd na AC-AI odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

POGLAVJE 4

IZJAVA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

- Splošnimi in posebnimi pogoji za gradnjo cest, z dopolnili v knjigah I do VI,
- Tehničnimi specifikacijami za javne ceste in
- Tehničnimi specifikacijami TSC 07 - Objekti na cestah,
- ter ostalo tehnično regulativo za gradnjo cest,

da smo v ponudbi upoštevali vse navedene tehnične zahteve in bomo dela izvedli v skladu z navedenimi zahtevami.

V HRPOVAH _____, dne 5.11.2013

PONUĐNIK
(podpis)

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

6.

POGLAVJE 5

- **Obrazec ponudbe za gradnjo protihrupnih ograj na AC – A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje (sklop 1)**
- **Dodatek » A «**
- **Priloga » B «**
- **Priloga » C «**
- **Priloga » C1«**
- **Priloga » D «**
- **Priloga »D1«**
- **Garancio za resnost ponudbe**



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 5

PONUDBA

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1)

Celje, september 2013

92/107

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

VSEBINA

I. PONUDBA IN DODATEK K PONUDBI

Obrazec ponudbe

Dodatek "A" k ponudbi

II. DODATKI (OBRAZCI) K PONUDBI

B. Vzorec garancije za resnost ponudbe (Bančna garancija)

C. Dodatki (Obrazci) C

D. Dodatki (Obrazci) D, D1

Podpis: 

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:

(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)

Vodilni partner: WERKOS d.o.o. - OSIJEK

Sedež: ULICA BOROVA 6, 31000 OSIJEK, HRVAŠKA

Partner: FRACASSO RI d.o.o.

Sedež: TRPIMIROVA 4, 51000 RIJEKA, HRVAŠKA

Partner: GODINA d.o.o.

Sedež: OIC- HRPELJE 22, 6240 KOZINA, SLOVENIJA
(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

št. N047/13-JV z dne 28.11.2013.

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1)

Za: Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.

Spoštovani!

1. Potem ko smo pregledali Pogodbene pogoje, Specifikacijo (Opis del), Načrte, Ponudbene predračune in Dopolnila (Adendume) št. JN2937/2013..... za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del za znesek:

vrednost brez DDV za sklop 1: 8.877.669,30 EUR
osem milijonov osemsto sedeminsedemdeset tisoč
(z besedo: šest devetinšestdeset evrov trideset stotin EUR)

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša: 1.953.087,25 EUR

Skupna vrednost z DDV znaša 10.830.756,55 EUR

WERKOS
d.o.o. za in izvedbo gradbenih del
Ulica Borova 6, 31000 Osijek (13)

Podpis: _____

2

94/107

2. Izjavljamo, da Priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
3. Zavezuje se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe dela izvedli v sledečih rokih :
- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 1. Sklop za odsek 0639: **45 dni od sklenitve pogodbe;**
 - o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 1. Sklop za odsek 0039: **90 dni od sklenitve pogodbe;**
 - o izdelava popravkov PZI projekta za posamezni odsek po pripombah revidentov/recenzentov: **10 dni po prejemu Zapisnika recenzijske obravnave;**
 - o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0639 Dramlje - Celje : **100 dni od delne uvedbe v delo;**
 - o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0039 Dramlje - Celje: **120 dni od delne uvedbe v delo;**
 - o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0195 priključek Celje-vzhod: **7 dni od delne uvedbe v delo;**
 - o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0138 priključek Celje-center: **10 dni od delne uvedbe v delo.**

Rok za izvršitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo "Potrdila o izvedbi" je 4 mesecev po dokončanju gradbenih del. Kot dokončanje gradbenih del se šteje sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da se lahko izda Dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo.

4. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezuje do vključno dne 25.4.2014. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne 28.11.2013.

Podpisnik (ime in priimek) PETAR VELICKI
DIREKTOR:
Podpis [podpis] v funkciji WERKOS d.o.o. - OSIJEK
s poimnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu JV: WERKOS d.o.o. - OSIJEK/
FRACASSO RI d.o.o. / GODINA d.o.o.

(napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami)

[podpis]
d.o.o. za projektiranje in gradnjo
Ulica Ljubljane 10, 1000 Ljubljana (SI)

Podpis: [podpis]

Dodatek "A"

Dodatek k Ponudbi

Pod-člen

Rok za izdelavo PZI za odsek 0639 in predaja naročniku v potrditev	5.1	45	dni po sklenitvi pogodbe
Rok za izdelavo PZI za odsek 0039 in predaja naročniku v potrditev	5.1	90	dni po sklenitvi pogodbe
Izdelava popravkov PZI po pripombah recenzentov		10	dni po prejemu zapisnika recenzijske obravnav
Višina garancije za dobro izvedbo	4.2	10	odstotkov od pogodbene cene (vrednost brez DDV)
Minimalni znesek za zavarovanje tretje osebe	18.3	1	milijon EUR na dogodek, z neomejenim številom dogodkov
Rok za izdajo obvestila o pričetku	8.1		Uvedba Izvajalca v delo je predvidena v letu 2014 in prvi polovici leta 2015
Rok za izvršitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo "Potrdila o izvedbi" in pridobitev "Potrdila o izvedbi"	8.2	4	mesece po dokončanju gradbenih del
Višina vnaprej dogovorjene škode zaradi zakasnitve	8.7	1	promil (%) / dan
Omejena višina vnaprej dogovorjene škode zaradi zakasnitve	8.7	10	odstotkov od pogodbene cene
Znesek premije za zgodnje dokončanje Del	10.2	0	EUR
Omejena višina premije	10.2	0	EUR
Doba za odpravo napak in pomanjkljivosti	11.1	4	mesece

Podpis: _____

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Omejena višina	14.3	10	odstotkov od vsake situacije do zadržanega zneska max 5% Pogodbene vrednosti
Garancija	11.3	10	let za vsa razpisana dela
Obrestna mera na neplačane zneske	14.8		po zakonsko določeni obrestni meri

Ponudnik:

WERKOS
d.o.o. z o.o. za gradnjo in arhitektstvo
Ulica Borova 6 - Osijek (1)

Podpis:

Podpis:

Priloga "B"

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

garant

kraj in datum

upravičenec

Garancija št.

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka, z dne, za izvedbo:

1.
2.
3.

za potrebe naročnika Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini EUR.

Garant se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne vrne podpisane pogodbe naročniku v roku 8 dni od prejema (podčlen 32.3 Navodil ponudnikom)
 - ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, kot je določen v podčlenu 33.1 Navodil ponudnikom)

Zavezuje se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original garancije št. / ter originalni morebitnih dodatkov h garanciji..

Podpis: _____

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Oblika predložitve zahtevka za unovčenje: Priporočeno po pošti ali s katerokoli obliko hitre pošte.

Kraj predložitve:

(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev zahtevka za unovčenje. Če kraj predložitve ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je izdal garancijo).

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. v primeru, ko naročnik ne sprejme odločitve o oddaji naročila, do pravnomočnosti naročnikove odločitve v predmetnem postopku javnega naročanja, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Garant

(podpis)

Podpis: _____

7

59/407

CENIK GRADBENE MECHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV, KI BODO UPORABLJENI PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE Priloga "C"

Zap. št.	Naziv	Tip	Kapaciteta	Kalkulativni učinek	Ponudbena cena EUR/uro	
					neto cena	
1	2	3	4	5	6	

GLEJ PRILOGO!

POSLOVNA
SKRIVNOST

V OŠRSEK4
Datum: 11.11.2013.
PONUDNIK: (podpis)

WERKOS
10.0. za inženjering u graditeljstvu
10.0. Ljika bariča 6 - Osijek (12)

Priloga "C"

CENIK GRADBENE MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV
KI BO UPORABLJENA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE

Zap. Štev.	Naziv	Tip	Kapaciteta	Kalkulativni učinek	Prodajna cena neto cena / k/c
1	2	3	4	5	6
1	NAKLADAČ	CATERPILLAR 938F	po spec.proizvaj.	80%	40,00
2	NAKLADAČ	CATERPILLAR 980G	po spec.proizvaj.	80%	70,00
3	BULDOŽER	CATERPILLAR D6N XL	po spec.proizvaj.	80%	50,00
4	DEMPER	CATERPILLAR DUMPER 725	po spec.proizvaj.	80%	25,00
5	MINI NAKLADAČ	JCB 170	po spec.proizvaj.	80%	25,00
6	MINI NAKLADAČ	JCB 170	1,3 m3	80%	32,00
7	KOMBINIRKA-ROVOKOPAČ	JCB 4CX	1,3 m3	80%	32,00
8	KOMBINIRKA-ROVOKOPAČ	JCB 4CX	1,3 m3	80%	32,00
9	KOMBINIRKA-ROVOKOPAČ	JCB 4CX	1,0 m3	80%	32,00
10	KOMBINIRKA-ROVOKOPAČ	JCB 4CX	po spec.proizvaj.	80%	27,00
11	MINI BAGER	JCB 8017	1,31 m3	80%	45,00
12	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 215	1,45 m3	80%	47,00
13	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 245	1,45 m3	80%	47,00
14	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 245 MM	1,65 m3	80%	52,00
15	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 305	1,65 m3	80%	52,00
16	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 305 EL	2,10 m3	80%	60,00
17	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 385 EL	po spec.proizvaj.	80%	45,00
18	BAGER - GUMAŠ	NEW HOLLAND 5.6	po spec.proizvaj.	80%	45,00
19	BAGER - GUMAŠ	NEW HOLLAND MH PLUS	po spec.proizvaj.	80%	30,00
20	TRAKTOR + PRIKOLICA	NEW HOLLAND TL 90	po spec.proizvaj.	80%	35,00
21	TRAKTOR + PRIKOLICA	NEW HOLLAND TM 120	po spec.proizvaj.	80%	27,00
22	MINI BAGER	BOBCAT 323	po spec.proizvaj.	80%	30,00
23	MINI BAGER	BOBCAT 435 CD	po spec.proizvaj.	80%	35,00
24	MINI BAGER	BOBCAT 442	po spec.proizvaj.	80%	35,00
25	MINI BAGER	BOBCAT 442	po spec.proizvaj.	80%	50,00
26	VALJAR	BOMAG 213 D3	po spec.proizvaj.	80%	30,00
27	VALJAR	BOMAG BW 100 AD	po spec.proizvaj.	80%	30,00
28	VALJAR ZA ASFALT	BOMAG BW 120 AD	po spec.proizvaj.	80%	30,00
29	VALJAR	BOMAG BW 100 AD	po spec.proizvaj.	80%	25,00
30	ROČNI VALER	BOMAG BW 65 H	po spec.proizvaj.	80%	25,00
31	ROČNI VALER	BOMAG BW 65 H	po spec.proizvaj.	80%	30,00
32	VALJAR	BOMAG BW 90 AD2	po spec.proizvaj.	80%	30,00
33	VALJAR	BOMAG BW 90 AD2	po spec.proizvaj.	80%	65,00
34	FINIŠER	VOEGELE 1300-2	po spec.proizvaj.	80%	38,00
35	VALJAR ZA ASFALT	CAT 534DXW	po spec.proizvaj.	80%	48,00
36	4 osni kiper	4144K 8x4/4 actros	po spec.proizvaj.	80%	49,00
37	vlačilec+priklopnik kiper	1848 LS	po spec.proizvaj.	80%	40,00
38	3 osni kiper	2644 K 6x4	po spec.proizvaj.	80%	40,00
39	3 osni kiper	ACTROS 3346 K 6x4	po spec.proizvaj.	80%	55,00
40	vlačilec+priklopnik kiper	2755 ACTROS LS	po spec.proizvaj.	80%	49,00
41	vlačilec+priklopnik kiper	1848 LS	po spec.proizvaj.	80%	55,00
42	vlačilec+priklopnik kiper	2646 ACTROS	po spec.proizvaj.	80%	35,00
43	2 osni kiper	1846 ACTROS KIPLER 2 DVIG	po spec.proizvaj.	80%	48,00
44	4 osni kiper	MB ACTROS 4144K	po spec.proizvaj.	80%	48,00
45	4 osni kiper	MB 4146K	po spec.proizvaj.	80%	35,00
46	2 osni kiper	MB 1529 ATEGO+DV.GALD	po spec.proizvaj.	80%	38,00
47	2 osni kiper	MB ACTROS 1844	po spec.proizvaj.	80%	35,00
48	2 osni kiper	MB 1833K+DVIGAL O	po spec.proizvaj.	80%	35,00

datum: 01.11.2013.

Zig:
VERKOB
L.O. ZA DELA NA PROJEKTOVANJE
10.11.2013. LOKAL. 11.

podpis ponudnika.

101/407

Prilog "C"
dodatak

**CENIK GRADBENE MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV
KI BO UPOREBLETNA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE**

Zap. Štev.	N A Z I V	Tip	Kapaciteta	Kalkulativni učinek	Prodajana cena	
					neto cena/euro/uro	
1.	Manipulator hidraulič. ručkom 17 m	JCB 540-170	po spec. proizvaj.	80%		46
2.	RADNI STROJ - KOMBINIRKA	JCB 4CX	1,3 m3	80%		32
3.	BAGER GOSENIČAR	HYUDAI Robex 210 NLC7	po spec. proizvaj.	80%		64
4.	Vrtna oprema z lastnim pogonom	KLEMM 802-1	po spec. proizvaj.	80%		58
5.	CONCRETE PUMP	PUTZMEISTER BSA 1002 D	po spec. proizvaj.	80%		52
6.	KOMPRESOR	MULTI	po spec. proizvaj.	80%		45
7.	KOMPRESOR	INGERSOLL RAND 12/56	po spec. proizvaj.	80%		80
8.	AGREGAT - DIESEL	INGERSOLL RAND 9/270	po spec. proizvaj.	80%		12
9.	AGREGAT	PS30 CJDR POWER	po spec. proizvaj.	80%		12
10.	AGREGAT	ENDRESS ESE 3000 BS-V	po spec. proizvaj.	80%		12
11.	AGREGAT	ENDRESS ESE 300 BS-V; WX.87	po spec. proizvaj.	80%		12
12.	AGREGAT BRIGGS & STRATTON PROWELD	BRIGGS & STRATTON ESE 404 HS	po spec. proizvaj.	80%		12
13.	Tovornjak platforma in hidravlično roko - 17 m	B & S PROWELDEW 200 DC	po spec. proizvaj.	80%		60
14.	Tovornjak platforma in hidravlično roko - 17 m	MAN 26403	po spec. proizvaj.	80%		60
15.	Tovornjak platforma in hidravlično roko - 21 m	MAN 26.413	po spec. proizvaj.	80%		65
16.	Tovornjak platforma in hidravlično roko - 21 m	MAN 33.430TGA	po spec. proizvaj.	80%		70
17.	Avtodistem - 9000 l	MAN 33.430 TGA	po spec. proizvaj.	80%		40
18.	AUTO MIXER - 7 m3	MERCEDES 1824	po spec. proizvaj.	80%		38
		MAN TGA 26.350	po spec. proizvaj.	80%		
		6x4 BB				


Osijek, 11.11.2013.g.

ஆம்

PONUĐNIK:

SCHEFFERS
d.o.o. za trgovinu i usluge
Ljubljana 6 - Osijek (12)

(podpis)



Nalozba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchežjski sklad

SEZNAM TRANSPORTNIH SREDSTEV, KI BODO UPORABLJENA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE

Priloga "C1"

Zap. št.	Naziv	Tip	Količina	Nosilnost	Cenik za m³ za vsak km od 1-20 km (v EUR)	Cena za ton/km (v EUR)
					neto cena	neto cena
1	2	3	4	5	6	7
					GLEJ PRILOGA 1 K OBRATCU "C1"	

Oliver

Datum: 11.11.2013.

PONUĐNIK:

COXSEA

(sidpod)

CENIK TRANSPORTNIH SREDSTEV [v evrih]

Zap. Stev.	Naziv	Tip	Količina	Nosilnost t	Cenik za m3 za vsak km od 1-20 km, neto cena	Cena za ton/km neto cena
1.	4 osni kiper	4144K 8x4/4 actros	1	18,5	0,4	0,25
2.	vlačilec+priklonnik kiper	1848 LS	1	25	0,4	0,25
3.	3 osni kiper	2644 K 6x4	2	25	0,44	0,27
4.	3 osni kiper	ACTROS 3346 K 6x4	1	25	0,44	0,27
5.	vlačilec+priklonnik kiper	2755 ACTROS LS	1	25	0,4	0,25
6.	vlačilec+priklonnik kiper	1848 LS	1	25	0,4	0,25
7.	vlačilec+priklonnik kiper	2646 ACTROS	1	25	0,4	0,25
8.	2 osni kiper	1846 ACTROS KIPER Z DVIG.	1	7	0,44	0,27
9.	4 osni kiper	MB ACTROS 4144K	1	18,5	0,4	0,25
10.	4 osni kiper	MB 4146K	1	18,5	0,4	0,25
11.	2 osni kiper	MB 1529 ATEGO+DVIGALO	1	7	0,44	0,27
13.	2 osni kiper	MB ACTROS 1844	1	9	0,44	0,27
14.	2 osni kiper	MB 1833K+DVIGALO	1	7	0,44	0,27

datum: 11. 11. 2013.

žig:

PONUDNIK (podpis)

POSLOVNA
SKRIVNOST

STRUKTURA DELOVNE SILE, KI BO ANGAŽIRANA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE

Zap. št.	Struktura in kategorija	Štev.	Prodajna cena ure EUR/uro	Opomba
			Prodajna cena ure (že vključuje faktor na delo ter prispevke in davke na plačo)	
1	2	3	4	5
		GLEJ PRILOGA 1 K OBRAZCU "D"		

V OSISEKY,
Datum: 11.11.2013.

PONUDBNIK:
(podpis)

PODATKI O GRADBENEM MATERIALU

Priloga "D1"

Zap. št.	Naziv materiala	Enota mere	Izvor materiala	Srednja prevozna oddaljenost	Nabavna cena materiala (v EUR)		Cena zunanjega prevoza (v EUR)		Cena notranjega prevoza (v EUR)		Opomba	
					neto cena		neto cena		neto cena			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
					GLEJ PRILOGA "D1" PRILOGA "D1" DODATAK							

V OŠIJEKY

Datum: 11. 11. 2013.

PONUĐNIK:

WERKOS
d.o.o. za inženjering u građeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)

(podpis)

POSLOVNA
SKRIVNOST

POSLOVNA
SPOSLOVNOST

Priloga "D1"

PODATKI O GRADBENEM MATERIALU

Zap Št.	Naziv materiala	2	Enota mere	3	Izvor materiala	4	Srednjaj prevozna oddaljenost	5	Nabavna cena materiala neto cena (v EUR)	6	Cena zunajnega prevoza neto cena (v EUR)	7	Cena notarnega prevoza neto cena (v EUR)	8
1														
1.	CEMENT 42,5 OSNOVNI BETONSKO JEKLO		t		Terra Kozina		160 km		110,00		1,00		1,00	
2	JEKLO REBRASTO 6-12 MM		kg		Terra Kozina		160 km		0,75		0,10		0,10	
3	JEKLO REBRASTO 12 MM		kg		Terra Kozina		160 km		0,73		0,10		0,10	
4.	MREŽE MAG AGREGATI		kg		Terra Kozina		160 km		0,76		0,10		0,10	
5.	FRAKCIJA 0-4 MM		t		Kamnolom Liboje		10 km		8,80		2,45		2,45	
6.	FRAKCIJA 4-8 MM		t		Kamnolom Liboje		10 km		8,30		2,45		2,45	
7.	FRAKCIJA 8-16 MM		t		Kamnolom Liboje		10 km		8,20		2,45		2,45	
8.	FRAKCIJA 16-32 MM		t		Kamnolom Liboje		10 km		8,10		2,45		2,45	
9.	FILTER ZA DRENAŽO 4-8 MM		t		Kamnolom Liboje		10 km		8,95		2,45		2,45	
10.	DROBLJENEC MEŠANICA 0-16 MM		t		Kamnolom Liboje		10 km		7,90		2,45		2,45	
11.	TAMPON 0-32		t		Kamnolom Liboje		10 km		6,20		2,45		2,45	
12.	GREDA 0-100		t		Kamnolom Liboje		10 km		4,95		2,45		2,45	
13.	JALOVINA		t		Kamnolom Liboje		10 km		2,25		2,45		2,45	

108/407

7.09/01

BETONSKI IZDELKI

32.	BETONSKI JAŠEK 60X60X60 CM	kos	Stavbar Hoče	50 km	22,00	0,25	0,25
33.	BETONSKI JAŠEK 80X80X80 CM	kos	Stavbar Hoče	50 km	44,00	0,25	0,25
34.	BETONSKI POKROV FI 60 CM	kos	Stavbar Hoče	50 km	23,00	0,25	0,25
35.	BETONSKI POKROV FI 90 CM	kos	Stavbar Hoče	50 km	52,00	0,25	0,25
36.	BET.POKROV 40/40 CM	kos	Stavbar Hoče	50 km	18,00	0,25	0,25
37.	BET.POKROV 50/50 CM	kos	Stavbar Hoče	50 km	23,00	0,25	0,25
38.	BET.POKROV 60/60 CM	kos	Stavbar Hoče	50 km	33,00	0,25	0,25
39.	BET.ROBNIK 12/20/100 CM	kos	Oblak Logatec	110 km	4,60	0,25	0,25
40.	BET.ROBNIK 15/25/100 CM CEST.	kos	Oblak Logatec	110 km	5,80	0,25	0,25
41.	BET.ROBNIK 15/25/100 CM ODOČN	kos	Oblak Logatec	110 km	11,70	0,25	0,25
42.	BET.ROBNIK 20/17X35/50/48,5 CM R	kos	Oblak Logatec	110 km	8,50	0,25	0,25
43.	AB.ROBNIK 12/20/48 CM VODILNI	kos	Oblak Logatec	110 km	2,44	0,25	0,25
44.	BET KANILETA TIP A 110/37 CM	kos	Oblak Logatec	110 km	26,08	0,25	0,25
<u>LTŽ IZDELKI - LIVAR</u>							
45.	Kanal. pokrov in okv. 600 x 600, 125 K	kos	Livar Iv. Gorica	100 km	103,05	1,00	1,00
46.	Kanal. pokrov in okv. 600 x 600, 250 K	kos	Livar Iv. Gorica	100 km	178,84	1,00	1,00
47.	Kanal. pokrov in okv. 600 x 600, 400 K	kos	Livar Iv. Gorica	100 km	194,51	1,00	1,00
48.	Kanal. pokrov in okv. FI 60, 125 KN art	kos	Livar Iv. Gorica	100 km	101,21	1,00	1,00
49.	Kanal. pokrov in okv FI 60, 250 KN art	kos	Livar Iv. Gorica	100 km	137,58	1,00	1,00
50.	Kanal. pokrov in okv. FI 60, 400 KN art	kos	Livar Iv. Gorica	100 km	143,45	1,00	1,00

POSLOVNA
SPRAVNOST

WERKOS

Datum: 11.11.2013.

AAA) 407

POSLOVNA SKRIVNOST

PODATKI O GRADBENEM MATERIALU

Priloga "D1" dodatak


Zap. št.	Naziv materiala	Enota mere	Izvor materiala	Srednja prevozna oddaljenost	Nabavna cena materiala (v EUR)		Cena zunanjega prevoza (v EUR)		Cena notranjega prevoza (v EUR)	
					neto cena		neto cena		neto cena	
1.	Jeklena cev, premera 660 mm in debeline stene cevi t=8 mm	m ¹	EU	190 km	95,00		4,00		2,00	
2.	AB parapetne grede	m ³	EU	15 km	310,00		10,00		5,00	
3.	Predfabricirani betonski pigmentirani steber	m ¹	EU	300 km	55,00		8,00		4,00	
4.	Visokoabsorpcijski betonski panel	m ²	EU	600 km	60,00		8,00		4,00	
5.	Visokoabsorpcijski aluminijasti panel	m ²	EU	600 km	55,00		8,00		4,00	
6.	Transparentni odbojni panel	m ²	EU	600 km	120,00		8,00		4,00	
7.	Krovni T element	m ¹	EU	600 km	300,00		8,00		4,00	
8.	Jekleni steber	kg	EU	600 km	2,10		1,00		0,50	
9.	Jeklena varnostna ograja H2,W5	m ¹	EU	600 km	35,00		3,00		1,50	
10.	Jeklena varnostna ograja H1,W4	m ¹	EU	600 km	30,00		4,00		2,00	
11.	Betonska varnostna ograja H1,W4	m ¹	EU	300 km	97,00		15,00		7,50	


112/107

12.	Betonska varnostna ograja H2,W2	m ¹	EU	300 km	169,00	12,00	6,00	
13.	Betonska varnostna ograja H2,W1	m ¹	EU	300 km	256,00	10,00	5,00	
14.	Portal	kg	EU	300 km	2,30	0,50	0,25	

Datum: 11. 11. 2013.

PONUĐNIK:


(podpis)


d.o.o. za projektiranje i izvođenje radova
Stari trg 11, 10000 Zagreb (Hrvatska)

**POSLOVNA
SKRIVNOST**

193/607

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

VSEBINA

I. PONUDBA IN DODATEK K PONUDBI

Obrazec ponudbe

Dodatek "A" k ponudbi

II. DODATKI (OBRAZCI) K PONUDBI

B. Vzorec garancije za resnost ponudbe (Bančna garancija)

C. Dodatki (Obrazci) C

D. Dodatki (Obrazci) D, D1

Podpis: _____



Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:

(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)

Vodilni partner: WERKOS d.o.o. - OSIJEK

Sedež: ULICA BOROVA 6 , 31000 OSIJEK , HRVAŠKA

Partner: FRACASSO RI d.o.o.

Sedež: TRPIMIROVA 4 , 51000 RIJEKA , HRVAŠKA

Partner: GODINA d.o.o.

Sedež: OIC - HRPELJE 22, 6240 KOZINA , SLOVENIJA
(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

št. N047/13-JV z dne 28.11.2013.

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Za: Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.

Spoštovani!

1. Potem ko smo pregledali Pogodbene pogoje, Specifikacijo (Opis del), Načrte, Ponudbene predračune in Dopolnila (Adendume) št. JN2937/2013 za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del za znesek:

vrednost brez DDV za sklop 2: 9.177.997,00 EUR
devet milijonov sto sedeminsedemdeset tisoč
(z besedo: devetsto sedemindevedeset evrov nič stotin EUR)

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša: 2.019.159,34 EUR

Skupna vrednost z DDV znaša 11.197.156,34 EUR

WERKOS
d.o.o. - OSIJEK


Podpis: _____


2

11/11/2013

2. Izjavljamo, da Priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
3. Zavezuje se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli:
- z izdelavo PZI za 2. Sklop za odsek 0040 ali 0640 takoj po sklenitvi pogodbe in ga izdelali in predali naročniku v roku 45 dni od sklenitve pogodbe, ter ga popravili po pripombah recenzentov v roku 10 dni po prejemu zapisnika recenzijske obravnave;
 - z izdelavo PZI za 2. Sklop za odsek 0040 ali 0640. takoj po sklenitvi pogodbe in ga izdelali in predali naročniku v roku 90 dni od sklenitve pogodbe, ter ga popravili po pripombah recenzentov v roku 10 dni po prejemu zapisnika recenzijske obravnave.
- Z gradnjo protihrupnih ograj (2. Sklop) bomo pričeli takoj po uvedbi v delo in izvedli gradnjo protihrupnih ograj in ostala dela, potrebna za izdajo potrdila o prevzemu najkasneje do 31.07.2015.
- V roku 4 mesecev po izdaji Potrdila o prevzemu za sklop 2 bomo izvedli vse obveznosti potrebne za izdajo potrdila o izvedbi za sklop 2.
4. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezuje do vključno dne 11.10.2013. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne 28.11.2013.

Podpisnik (ime in priimek) PETAR VELICKI
Direktor
Podpis  v funkciji WERKOS d.o.o.-OSIJEK
s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu JV: WERKOS d.o.o.-OSIJEK/
FRACASO RI d.o.o. / GODINA d.o.o.
(napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami)


d.o.o. / OSIJEK (14)

Podpis: 

Dodatek "A"

Dodatek k Ponudbi

Pod-člen

Rok za izdelavo PZI za odsek 0639 in predaja naročniku v potrditev	5.1	45	dni po sklenitvi pogodbe
Rok za izdelavo PZI za odsek 0039 in predaja naročniku v potrditev	5.1	90	dni po sklenitvi pogodbe
Izdelava popravkov PZI po pripombah recenzentov		10	dni po prejemu zapisnika recenzijske obravnave
Višina garancije za dobro izvedbo	4.2	10	odstotkov od pogodbene cene (vrednost brez DDV)
Minimalni znesek za zavarovanje tretje osebe	18.3	1	milijon EUR na dogodek, z neomejenim številom dogodkov
Rok za izdajo obvestila o pričetku	8.1		Uvedba izvajalca v delo je predvidena v letu 2014 in prvi polovici leta 2015.
Rok za izvršitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo "Potrdila o izvedbi" in pridobitev "Potrdila o izvedbi"	8.2	4	mesece po dokončanju gradbenih del
Višina vnaprej dogovorjene škode zaradi zakasnitve	8.7	1	promil (‰) / dan
Omejena višina vnaprej dogovorjene škode zaradi zakasnitve	8.7	10	odstotkov od pogodbene cene
Znesek premije za zgodnje dokončanje Del	10.2	0	EUR
Omejena višina premije	10.2	0	EUR
Doba za odpravo napak in pomanjkljivosti	11.1	4	mesece

Podpis: 

Št. projekta: 2012/000315


Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Omejena višina 14.3 10 **odstotkov** od vsake situacije **do**
zadržanega zneska **max 5%**
Pogodbene vrednosti

Garancija 11.3 10 **let** za vsa razpisana dela

Obrestna mera
na neplačane zneske 14.8 po zakonsko določeni obrestni meri

Ponudnik:

 **WERKOS**
d.o.o. za posredništvo v graditeljstvu
Ulica Lurova 6 - Osijek (H)

Podpis:



Podpis:



Priloga "B"

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

garant

kraj in datum

upravičenec

Garancija št.

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka, z dne, za izvedbo:

1.
2.
3.

za potrebe naročnika Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. dlvizlje 4, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini EUR.

Garant se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne vrne podpisane pogodbe naročniku v roku 8 dni od prejema (podčlen 32.3 Navodil ponudnikom)
 - ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, kot je določen v podčlenu 33.1 Navodil ponudnikom)

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original garancije št. / ter originali morebitnih dodatkov h garanciji..

Podpis: _____

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Oblika predložitve zahtevka za unovčenje: Priporočeno po pošti ali s katerokoli obliko hitre pošte.

Kraj predložitve:

(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev zahtevka za unovčenje. Če kraj predložitve ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je izdal garancijo).

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. v primeru, ko naročnik ne sprejme odločitve o oddaji naročila, do pravnomočnosti naročnikove odločitve v predmetnem postopku javnega naročanja, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Garant

(podpis)

Podpis: _____



Naložba v vašu prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

CENIK GRADBENE MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV, KI BODO UPORABLJENI PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE


Priloga "C"

Zap. št.	Naziv	Tip	Kapaciteta	Kalkulativni učinek	Ponudbena cena EUR/uro	
					neto	cena
1	2	3	4	5	6	

6730150

Date: 09.11.2013

PONUDNIK:

8

 ZVEZKERKO
 n.o.o. za inženjering u graditeljstvu
 Ulica Trnava 3, Osijek, 12

(sidpod)

POSLOVNA
SKEIVNOST

123/407

POSLOVNA SKRIVNOST

Priloga "C"

CENIK GRADBENE MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV KI BO UPORABLJENA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE

Zap. števil.	Naziv	Tip	Kapaciteta	Kalkulativni učinek	Prodajna cena neto cena
1	2	3	4	5	6
1.	NAKLADAČ	CATERPILLAR 938F	po spec.proizvaj.	80%	40,00
2.	NAKLADAČ	CATERPILLAR 980G	po spec.proizvaj.	80%	70,00
3.	BULDOŽER	CATERPILLAR D6N XL	po spec.proizvaj.	80%	50,00
4.	DEMPER	CATERPILLAR DUMPER 725	po spec.proizvaj.	80%	50,00
5.	MINI NAKLADAČ	JCB 170	po spec.proizvaj.	80%	25,00
6.	MINI NAKLADAČ	JCB 170	po spec.proizvaj.	80%	25,00
7.	KOMBINIRKA-ROVOKOPAČ	JCB 4CX	1,3 m3	80%	32,00
8.	KOMBINIRKA-ROVOKOPAČ	JCB 4CX	1,3 m3	80%	32,00
9.	KOMBINIRKA-ROVOKOPAČ	JCB 4CX	1,3 m3	80%	32,00
10.	KOMBINIRKA-ROVOKOPAČ	JCB 4CX	1,0 m3	80%	32,00
11.	MINI BAGER	JCB 8017	po spec.proizvaj.	80%	27,00
12.	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 215	1,31 m3	80%	45,00
13.	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 245	1,45 m3	80%	47,00
14.	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 245 MM	1,45 m3	80%	47,00
15.	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 305	1,65 m3	80%	52,00
16.	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 305 EL	1,65 m3	80%	52,00
17.	BAGER - GOSENIČAR	NEW HOLLAND 385 EL	2,10 m3	80%	60,00
18.	BAGER - GUMAŠ	NEW HOLLAND 5.6	po spec.proizvaj.	80%	45,00
19.	BAGER - GUMAŠ	NEW HOLLAND MH PLUS	po spec.proizvaj.	80%	45,00
20.	TRAKTOR + PRIKOLICA	NEW HOLLAND TL 90	po spec.proizvaj.	80%	30,00
21.	TRAKTOR + PRIKOLICA	NEW HOLLAND TM 120	po spec.proizvaj.	80%	35,00
22.	MINI BAGER	BOBCAT 323	po spec.proizvaj.	80%	27,00
23.	MINI BAGER	BOBCAT 435 CD	po spec.proizvaj.	80%	30,00
24.	MINI BAGER	BOBCAT 442	po spec.proizvaj.	80%	35,00
25.	MINI BAGER	BOBCAT 442	po spec.proizvaj.	80%	35,00
26.	VALJAR	BOMAG 213 D3	po spec.proizvaj.	80%	50,00
27.	VALJAR	BOMAG BW 100 AD	po spec.proizvaj.	80%	30,00
28.	VALJAR ZA ASFALT	BOMAG BW 120 AD	po spec.proizvaj.	80%	30,00
29.	VALJAR	BOMAG BW 100 AD	po spec.proizvaj.	80%	30,00
30.	ROČNI VALER	BOMAG BW 65 H	po spec.proizvaj.	80%	25,00
31.	ROČNI VALER	BOMAG BW 65 H	po spec.proizvaj.	80%	25,00
32.	VALJAR	BOMAG BW 90 AD2	po spec.proizvaj.	80%	30,00
33.	VALJAR	BOMAG BW 90 AD2	po spec.proizvaj.	80%	30,00
34.	FINIŠER	VOEGELE 1300-2	po spec.proizvaj.	80%	65,00
35.	VALJAR ZA ASFALT	CAT 534DXW	po spec.proizvaj.	80%	38,00
36.	4 osni kiper	4144K 8x4/4 actros	po spec.proizvaj.	80%	48,00
37.	vlačilec+priklopnik kiper	1848 LS	po spec.proizvaj.	80%	49,00
38.	3 osni kiper	2644 K 6x4	po spec.proizvaj.	80%	40,00
39.	3 osni kiper	ACTROS 3346 K 6x4	po spec.proizvaj.	80%	40,00
40.	vlačilec+priklopnik kiper	2755 ACTROS LS	po spec.proizvaj.	80%	55,00
41.	vlačilec+priklopnik kiper	1848 LS	po spec.proizvaj.	80%	49,00
42.	vlačilec+priklopnik kiper	2646 ACTROS	po spec.proizvaj.	80%	55,00
43.	2 osni kiper	1846 ACTROS KIPER Z DVIG.	po spec.proizvaj.	80%	35,00
44.	4 osni kiper	MB ACTROS 4144K	po spec.proizvaj.	80%	48,00
45.	4 osni kiper	MB 4146K	po spec.proizvaj.	80%	48,00
46.	2 osni kiper	MB 1529 ATEGO+DVIGALO	po spec.proizvaj.	80%	35,00
47.	2 osni kiper	MB ACTROS 1844	po spec.proizvaj.	80%	38,00
48.	2 osni kiper	MB 1833K+DVIGALO	po spec.proizvaj.	80%	35,00

datum: 11.11.2013.

WEPKOS
I.O.O. za inženjering in graditeljstvo
Ulica Loreova 6 - Ljubljana (14)

podpis ponudnika:

12/407

POSLOVNA SKRIVNOST

Prilog "C"
dodatak

CENIK GRADBENE MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV KI BO UPORABLJENA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE

Zap. št.	N A Z I V	Tip	Kapaciteta	Kalkulativni učinak	Prodajana cena neto cena/euro/uro
1.	Manipulator hidraulič. rukom 17 m	JCB 540-170	po spec. proizvaj.	80%	46
2.	RADNI STROJ - KOMBINIRKA	JCB 4CX	1,3 m3	80%	32
3.	BAGER GOSENIČAR	HYUDAI Robex 210 NLC7	po spec. proizvaj.	80%	64
4.	Vitalna oprema z lastnim pogonom	KLEMM 802-1	po spec. proizvaj.	80%	58
5.	CONCRETE PUMP	PUTZMEISTER BSA 1002 D MULTI	po spec. proizvaj.	80%	52
6.	KOMPRESOR	INGERSOLL RAND 12/56	po spec. proizvaj.	80%	45
7.	KOMPRESOR	INGERSOLL RAND 9/270	po spec. proizvaj.	80%	80
8.	AGREGAT - DIESEL	PS30 CIDR POWER	po spec. proizvaj.	80%	12
9.	AGREGAT	ENDRESS ESE 3000 BS-V	po spec. proizvaj.	80%	12
10.	AGREGAT	ENDRESS ESE 300 BS-V; WX 87	po spec. proizvaj.	80%	12
11.	AGREGAT	BRIGGS & STRATTON ESE 404 HS	po spec. proizvaj.	80%	12
12.	AGREGAT BRIGGS & STRATTON PROWELD	B & S PROWELDEW 200 DC	po spec. proizvaj.	80%	12
13.	Tovornjak platforma in hidravlično roko - 17 m	MAN 26403	po spec. proizvaj.	80%	60
14.	Tovornjak platforma in hidravlično roko - 17 m	MAN 26.413	po spec. proizvaj.	80%	60
15.	Tovornjak platforma in hidravlično roko - 21 m	MAN 33.430TGA	po spec. proizvaj.	80%	65
16.	Tovornjak platforma in hidravlično roko - 21 m	MAN 33.430 TGA	po spec. proizvaj.	80%	70
17.	Avtocestern - 9000 l	MERCEDES 1824	po spec. proizvaj.	80%	40
18.	AUTO MIXER - 7 m3	MAN TGA 26.350 6x4 BB	po spec. proizvaj.	80%	38


Osijek, 11.11.2013.g.

Žig

PONUDBNIK:

(podpis)

425/407



Priloga "C"

Zap. št.	Naziv	Tip	Količina	Nosilnost	Cenik za m³ za vsak km od 1-20 km (v EUR)	Cena za ton/km (v EUR)
					neto cena	neto cena
1	2	3	4	5	6	7
					GLEJ PRILOGA 16 OBRAZCI "C1"	

✓ 0510E24

Datum: 11. 11. 2013.

COPIES
d.o.o. za inženjering i projektiranje (12)
Ulica Ljudevita 3 - Osijek (12)

PONUĐNIK:

(podpis)

Priloga 1 k obrazcu » C1 «

Priloga "C1"

CENIK TRANSPORTNIH SREDSTEV [v evrih]

Zap. Stev.	Naziv	Tip	Količina	Nosilnost t	Cenik za m3 za vsak km od 1-20 km, neto cena	Cena za ton/km neto cena
1.	4 osni kiper	4114K 8x4/4 actros	1	18,5	0,4	0,25
2.	vlačilec+priklonnik kiper	1848 LS	1	25	0,4	0,25
3.	3 osni kiper	2644 K 6x4	2	25	0,44	0,27
4.	3 osni kiper	ACTROS 3346 K 6x4	1	25	0,44	0,27
5.	vlačilec+priklonnik kiper	2755 ACTROS LS	1	25	0,4	0,25
6.	vlačilec+priklonnik kiper	1848 LS	1	25	0,4	0,25
7.	vlačilec+priklonnik kiper	2646 ACTROS	1	25	0,4	0,25
8.	2 osni kiper	1846 ACTROS KIPER Z DVIG.	1	7	0,44	0,27
9.	4 osni kiper	MB ACTROS 4144K	1	18,5	0,4	0,25
10.	4 osni kiper	MB 4146K	1	18,5	0,4	0,25
11.	2 osni kiper	MB 1529 ATEGO+DVIGALO	1	7	0,44	0,27
13.	2 osni kiper	MB ACTROS 1844	1	9	0,44	0,27
14.	2 osni kiper	MB 1833K+DVIGALO	1	7	0,44	0,27

datum: 11.11.2013.

žig:

PONUDELNIK (podpis)

WIRKO
d.o.o.
Cesta na Sred 105, 1000 Ljubljana

POSLOVNA
SKRIVNOST

12/11/07

Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJA DELOVNE SILE PRI IZVEDBI DELA
KOT PRILOGA K PREDLOGU

STRUKTURA DELOVNE SILE, KI BO ANGAŽIRANA PRI IZVEDBI DELA IZ PONUDBE

**POSLOVNA
SKRIVNOST**

Zap. št.	Struktura in kategorija	Štev.	Prodajna cena ure EUR/uro	5
			Prodajna cena ure (že vključuje faktor na delo ter prispevke in davke na plačo)	
1	2	3	4	5
		GLEJ PRILOGA 1 K OBRAZEC "D"		

V PRILOGI

Datum: 11. 11. 2013.

PONUDBNIK:

VERKOB
H.O.M. za interierne in zgradbene
delo in stroja - Oseba (12)

(podpis)

POSLOVNA SKRIVNOST

Priloga 1 k obrazcu » D «

Zap št.	Struktura in kategorija	Štev.	Prodajna cena ure EUR / uro
1	2	3	4
1	VODJA PROJEKTA	1	30,00
2	INŽENIR GRADBENIŠTVA	3	25,00
3	GRADBENI TEHNIK	4	22,00
4	GRADBENI DELOVODJA	5	20,00
5	VKV DELAVEC (skupinovodja, električist, instalataer, strojar)	12	18,00
6	KV DELAVEC (zidarji, tesarji, montažeri)	18	15,00
7	PK DELAVEC	15	12,00

Datum: 11.11.2013.

POSLOVNA
SKRIVNOST

PONUĐNIK:

(podpis)

023/107

PODATKI O GRADBENEM MATERIALU

Priloga "D1"

Zap. št.	Naziv materiala	Enota mere	Izvor materiala	Srednja prevozna oddaljenost	Nabavna cena materiala (v EUR)		Cena zunanjega prevoza (v EUR)		Cena notranjega prevoza (v EUR)		Opomba
					neto cena		neto cena		neto cena		
1	2	3	4	5	6		7		8		9
							GLEJ PRILOGA "D1"				
							PRILOGA "D1" DODATAK				

GLEJ PRILOGA "D1"
PRILOGA "D1" DODATAK

V OSIJEKY

Datum: 11. 11. 2013.

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)

PONUĐNIK: (podpis)

PODATKI O GRADBENEM MATERIALU

Zap. št.	Naziv materiala	Enota mere	Izvor materiala	Srednjaj prevozna oddaljenost	Nabavna cena materiala neto cena (v EUR)	Cena zunajnega prevoza neto cena (v EUR)	Cena notarnega prevoza neto cena (v EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CEMENT 42,5 OSNOVNI <u>BETONSKO JEKLO</u>	t	Terra Kozina	160 km	110,00	1,00	1,00
2.	JEKLO REBRASTO 6-12 MM	kg	Terra Kozina	160 km	0,75	0,10	0,10
3.	JEKLO REBRASTO 12 MM	kg	Terra Kozina	160 km	0,73	0,10	0,10
4.	MREŽE MAG <u>AGREGATI</u>	kg	Terra Kozina	160 km	0,76	0,10	0,10
5.	FRAKCIJA 0-4 MM	t	Kamnolom Liboje	10 km	8,80	2,45	2,45
6.	FRAKCIJA 4-8 MM	t	Kamnolom Liboje	10 km	8,30	2,45	2,45
7.	FRAKCIJA 8-16 MM	t	Kamnolom Liboje	10 km	8,20	2,45	2,45
8.	FRAKCIJA 16-32 MM	t	Kamnolom Liboje	10 km	8,10	2,45	2,45
9.	FILTER ZA DRENAŽO 4-8 MM	t	Kamnolom Liboje	10 km	8,95	2,45	2,45
10.	DROBLJENEC MEŠANICA 0-16 MM	t	Kamnolom Liboje	10 km	7,90	2,45	2,45
11.	TAMPON 0-32	t	Kamnolom Liboje	10 km	6,20	2,45	2,45
12.	GREDA 0-100	t	Kamnolom Liboje	10 km	4,95	2,45	2,45
13.	JALOVINA	t	Kamnolom Liboje	10 km	2,25	2,45	2,45

**POSLOVNA
SKRIVNOST**

<u>BETONSKE CEVI DOLŽINE 1 M</u>									
14.	BETONSKA CEV FI 30 CM	kos	NIVO Celje	10 km	20,00	1,20	1,20		
15.	BETONSKA CEV FI 40 CM	kos	NIVO Celje	10 km	25,00	1,20	1,20		
16.	BETONSKA CEV FI 50 CM	kos	NIVO Celje	10 km	38,00	1,20	1,20		
17.	BETONSKA CEV FI 60 CM	kos	NIVO Celje	10 km	45,00	1,20	1,20		
18.	A.BETONSKA CEV FI 80 CM	kos	NIVO Celje	10 km	110,00	1,20	1,20		
19.	A.BETONSKA CEV FI 100 CM	kos	NIVO Celje	10 km	150,00	1,20	1,20		
<u>PVC - UK CEVI SN4 (kompakt) 5 m</u>									
20.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 110 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	25,87	0,10	0,10		
21.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 125 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	29,40	0,10	0,10		
22.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 160 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	37,98	0,10	0,10		
23.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 200 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	58,17	0,10	0,10		
24.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 250 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	89,31	0,10	0,10		
25.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 315 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	142,58	0,10	0,10		
26.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 400 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	225,23	0,10	0,10		
<u>PVC - UK CEVI SN8 (kompakt) 5 m</u>									
27.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 160 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	43,45	0,10	0,10		
28.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 200 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	70,94	0,10	0,10		
29.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 250 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	109,11	0,10	0,10		
30.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 315 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	173,76	0,10	0,10		
31.	CEV PVC KANALIZACIJSKA FI 400 M	kos	Zagožen Žalec	10 km	354,00	0,10	0,10		

132/407

PODATKI O GRADBENEM MATERIALU

Priloga "D1" dodatak

POSLOVNA

SKRIVNOST

Zap. št.	Naziv materiala	Enota mere	Izvor materiala	Srednja prevozna oddaljenost	Nabavna cena materiala (v EUR)		Cena zunanjega prevoza (v EUR)		Cena notranjega prevoza (v EUR)	
					neto cena		neto cena		neto cena	
1.	Jeklena cev, premera 660 mm in debeline stene cevi t=8 mm	m ¹	EU	190 km	95,00		4,00		2,00	
2.	AB parapetne grede	m ³	EU	15 km	310,00		10,00		5,00	
3.	Predfabricirani betonski pigmentirani steber	m ¹	EU	300 km	55,00		8,00		4,00	
4.	Visokoabsorpcijski betonski panel	m ²	EU	600 km	60,00		8,00		4,00	
5.	Visokoabsorpcijski aluminijasti panel	m ²	EU	600 km	55,00		8,00		4,00	
6.	Transparentni odbojni panel	m ²	EU	600 km	120,00		8,00		4,00	
7.	Krovni T element	m ¹	EU	600 km	300,00		8,00		4,00	
8.	Jekleni steber	kg	EU	600 km	2,10		1,00		0,50	
9.	Jeklena varnostna ograja H2,W5	m ¹	EU	600 km	35,00		3,00		1,50	
10.	Jeklena varnostna ograja H1,W4	m ¹	EU	600 km	30,00		4,00		2,00	
11.	Betonska varnostna ograja H1,W4	m ¹	EU	300 km	97,00		15,00		7,50	

135/107

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

7.

PONUDBENI PREDRAČUN- POGLAVLJE 6

- Ponudbeni predračun v tiskani obliki
- Ponudbeni predračun v elektronski obliki

PONUDBENI PREDRAČUN


N(020)88

**Izgradnja PHO na AC A1 odseku
0039/0639 Dramlje – Celje**



Cena z DDV:	10.830.756,55 EUR
od tega DDV:	1.953.087,25 EUR
Cena brez DDV:	8.877.669,30 EUR

Datum: 28. 11. 2013.

Ponudnik: 

(podpis in pečat)

d.o.o. Zbirka ...
 Ulica ... - Osijek (12)

139/107

N06Z088

Izgradnja PHO na AC A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje

REKAPITULACIJA STROŠKOV

		Cena brez DDV (EUR)	DDV (EUR)	Cena z DDV (EUR)
1	Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere			
		1.047.786,40	230.513,01	1.278.299,41
2	Izvedba protihrupnih ograj z obračunom na ključ			
		7.829.882,90	1.722.574,24	9.552.457,14
2.1	APO-1			
		141.346,64	31.096,26	172.442,90
2.2	APO-3			
		177.780,43	39.111,69	216.892,12
2.3	APO-4			
		207.719,90	45.698,38	253.418,28
2.4	APO-5			
		255.973,94	56.314,27	312.288,21
2.5	APO-6			
		204.642,22	45.021,29	249.663,51
2.6	APO-7			
		195.464,89	43.002,28	238.467,17
2.7	APO-8			
		142.765,28	31.408,36	174.173,64
2.8	APO-9			
		451.496,65	99.329,26	550.825,91
2.9	APO-10			
		463.849,20	102.046,82	565.896,02
2.10	APO-11			
		145.227,31	31.950,01	177.177,32
2.11	APO-12			
		56.196,91	12.363,32	68.560,23
2.12	APO-13			
		149.969,02	32.993,18	182.962,20
2.13	APO-14			
		62.098,95	13.661,77	75.760,72
2.14	APO-15			
		158.356,92	34.838,52	193.195,44



2.15	APO-16	342.922,21	75.442,89	418.365,10
2.16	APO-17	428.174,78	94.198,45	522.373,23
2.17	APO-17.1	61.074,62	13.436,42	74.511,04
2.18	APO-18	52.160,96	11.475,41	63.636,37
2.19	APO-19	331.911,95	73.020,63	404.932,58
2.20	APO-20	365.181,29	80.339,88	445.521,17
2.21	APO-21	712.539,92	156.758,78	869.298,70
2.22	APO-22 + PO-2	871.938,67	191.826,51	1.063.765,18
2.23	APO-23 + PO-1	91.951,59	20.229,35	112.180,94
2.24	Portali prometne opreme	479.698,62	105.533,70	585.232,32
2.25	Nacrt prometne opreme in predstavitev prometne signalizacije	1.279.440,03	281.476,81	1.560.916,84

Skupaj za projekt:

Cena z DDV:	10.830.756,55 EUR
od tega DDV:	1.953.087,25 EUR
Cena brez DDV:	8.877.669,30 EUR



Nivo 1 1

Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 6 2 483	77.000,00 M1	2,78	214.060,00
Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm V ceni upoštevati tudi odstranitev. Obračunajo se le "polni" deli črt.				
0002	N 1 1 101	1,00 KOS	5.000,00	5.000,00
Začasno vodenje prometa po vzporednih državnih cestah v fazi 3 in fazi 4. Postavka zajema pritrditev začasnih tabel za obvoz na obstoječo prometno signalizacijo za vodenje prometa. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških.				
0003	N 1 2 018	220,00 DNI	1.871,00	411.620,00
Postavitev in odstranitev začasne varnostne ograje (mini guard) dolžine 10.750 m. V ceni upoštevati tudi najem začasnih varnostnih ograj.				
0004	S 7 9 311	40,00 URA	40,00	1.600,00
Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. Projektantski nadzor se obračuna samo pri ograji APO-PO1.				
0005	N 1 2 026	320,00 URA	40,00	12.800,00
Nadzor upravljalcev komunalnih vodov. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora komunalnih vodov.				
0006	N 1 2 002	1,00 KPL	198.960,00	198.960,00
Izdelava in dobava PZI projekta aktivne protihrupne zaščite ob AC; vodilna mapa in gradbeni načrti. Posamezne raziskave, detajlni posnetki terena, načrti rušitve in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO, načrti križanj in prestavitve komunalnih vodov in elaborati so zajeti v tej postavki. Prav tako mora biti v tej postavki upoštevan projektantski nadzor. PZI za vsako PH ograjo posebej, razen za APO-PO1				
0007	N 1 2 019	1.152,00 M1	83,20	95.846,40
Dobava, postavitve in odstranitev montažnega vodilnega robnika z markerji (h=0.58m)				
0008	N 1 2 012	1,00 KPL	40.500,00	40.500,00
Izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predaja naročniku v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki. PID-i in navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsako PH ograjo posebej				
0009	S 6 6 831	23,00 KOS	400,00	9.200,00
Izvedba meritve učinkovitosti absorpcije ograje za zaščito pred hrupom Izvedba meritev skladno s SIST EN-1793-5				
0010	S 6 6 832	23,00 KOS	400,00	9.200,00
Izvedba meritve učinkovitosti izolacije ograje za zaščito pred hrupom Izvedba meritev skladno s SIST EN-1793-5				
0011	N 1 2 016	2,00 KOS	2.600,00	5.200,00
Dobava in postavitve gradbiščne table skladno z navodili Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013)				
0012	N 1 2 021	1,00 KOS	38.600,00	38.600,00
Izvedba dodatnih akustičnih meritev APO-19a in APO-19b skladno s protokolom meritev: 1. serija: akustične meritve obstoječe PHO; 2. serija: akustične meritve s klasičnim elementom nadvišane PHO; 3. Serija: akustične meritve s specialnim elementom nadvišane PHO. Vključno z vsem pripadajočim kadrom, tehnično opremo in zaključnim poročilom.				
0013	N 1 2 017	2,00 KOS	2.600,00	5.200,00
Dobava in postavitve razlagalne table skladno z navodili Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko				

Stran: 4/9

M21/ho7

(Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013)

Skupaj	Cena brez DDV:	1.047.786,40 EUR
	DDV:	230.513,01 EUR
	Cena z DDV:	1.278.299,41 EUR

Nivo 1 2
Nivo 2 2.1

**Izvedba protihrupnih ograj z obračunom na ključ
APO-PO-1**

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	141.346,64	141.346,64
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	141.346,64 EUR
	DDV:	31.096,26 EUR
	Cena z DDV:	172.442,90 EUR

Nivo 2 2.2

APO-3

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	177.780,43	177.780,43
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	177.780,43 EUR
	DDV:	39.111,69 EUR
	Cena z DDV:	216.892,12 EUR

Nivo 2 2.3

APO-4

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	207.719,90	207.719,90
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	207.719,90 EUR
	DDV:	45.698,38 EUR
	Cena z DDV:	253.418,28 EUR

Nivo 2 2.4

APO-5

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	255.973,94	255.973,94
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	255.973,94 EUR
	DDV:	56.314,27 EUR
	Cena z DDV:	312.288,21 EUR

Nivo 2 2.5

APO-6

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	204.642,22	204.642,22
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	204.642,22 EUR
	DDV:	45.021,29 EUR
	Cena z DDV:	249.663,51 EUR

Nivo 2 2.6

APO-7

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	--------------------------	-----------------------

0001	N 1 2 015	1,00 KOS	195.464,89	195.464,89
Izvedba PH ograje				
		Skupaj	Cena brez DDV:	195.464,89 EUR
			DDV:	43.002,28 EUR
			Cena z DDV:	238.467,17 EUR

Nivo 2 2.7 APO-8

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	142.765,28	142.765,28
Izvedba PH ograje				
		Skupaj	Cena brez DDV:	142.765,28 EUR
			DDV:	31.408,36 EUR
			Cena z DDV:	174.173,64 EUR

Nivo 2 2.8 APO-9

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	451.496,65	451.496,65
Izvedba PH ograje				
		Skupaj	Cena brez DDV:	451.496,65 EUR
			DDV:	99.329,26 EUR
			Cena z DDV:	550.825,91 EUR

Nivo 2 2.9 APO-10

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	463.849,20	463.849,20
Izvedba PH ograje				
		Skupaj	Cena brez DDV:	463.849,20 EUR
			DDV:	102.046,82 EUR
			Cena z DDV:	565.896,02 EUR

Nivo 2 2.10 APO-11

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	145.227,31	145.227,31
Izvedba PH ograje				
		Skupaj	Cena brez DDV:	145.227,31 EUR
			DDV:	31.950,01 EUR
			Cena z DDV:	177.177,32 EUR

Nivo 2 2.11 APO-12

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	56.196,91	56.196,91
Izvedba PH ograje				
		Skupaj	Cena brez DDV:	56.196,91 EUR
			DDV:	12.363,32 EUR
			Cena z DDV:	68.560,23 EUR

Nivo 2 2.12 APO-13

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

144/154

0001 N 1 2 015 1,00 KOS 149.969,02 149.969,02
Izvedba PH ograje

Skupaj Cena brez DDV: 149.969,02 EUR
DDV: 32.993,18 EUR
Cena z DDV: 182.962,20 EUR

Nivo 2 2.13 APO-14

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	62.098,95	62.098,95
Izvedba PH ograje				

Skupaj Cena brez DDV: 62.098,95 EUR
DDV: 13.661,77 EUR
Cena z DDV: 75.760,72 EUR

Nivo 2 2.14 APO-15

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	158.356,92	158.356,92
Izvedba PH ograje				

Skupaj Cena brez DDV: 158.356,92 EUR
DDV: 34.838,52 EUR
Cena z DDV: 193.195,44 EUR

Nivo 2 2.15 APO-16

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	342.922,21	342.922,21
Izvedba PH ograje				

Skupaj Cena brez DDV: 342.922,21 EUR
DDV: 75.442,89 EUR
Cena z DDV: 418.365,10 EUR

Nivo 2 2.16 APO-17

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	428.174,78	428.174,78
Izvedba PH ograje				

Skupaj Cena brez DDV: 428.174,78 EUR
DDV: 94.198,45 EUR
Cena z DDV: 522.373,23 EUR

Nivo 2 2.17 APO-17.1

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	61.074,62	61.074,62
Izvedba PH ograje				

Skupaj Cena brez DDV: 61.074,62 EUR
DDV: 13.436,42 EUR
Cena z DDV: 74.511,04 EUR

Nivo 2 2.18 APO-18

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 2 015	1,00 KOS	61.074,62	61.074,62
Izvedba PH ograje				

0001 N 1 2 015 1,00 KOS 52.160,96 52.160,96
Izvedba PH ograje

Skupaj Cena brez DDV: 52.160,96 EUR
DDV: 11.475,41 EUR
Cena z DDV: 63.636,37 EUR

Nivo 2 2.19 APO-19

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	--------------------------	-----------------------

0001 N 1 2 015 1,00 KOS 331.911,95 331.911,95
Izvedba PH ograje

Skupaj Cena brez DDV: 331.911,95 EUR
DDV: 73.020,63 EUR
Cena z DDV: 404.932,58 EUR

Nivo 2 2.20 APO-20

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	--------------------------	-----------------------

0001 N 1 2 015 1,00 KOS 365.181,29 365.181,29
Izvedba PH ograje

Skupaj Cena brez DDV: 365.181,29 EUR
DDV: 80.339,88 EUR
Cena z DDV: 445.521,17 EUR

Nivo 2 2.21 APO-21

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	--------------------------	-----------------------

0001 N 1 2 015 1,00 KOS 712.539,92 712.539,92
Izvedba PH ograje

Skupaj Cena brez DDV: 712.539,92 EUR
DDV: 156.758,78 EUR
Cena z DDV: 869.298,70 EUR

Nivo 2 2.22 APO-22 + PO-2

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	--------------------------	-----------------------

0001 N 1 2 015 1,00 KOS 871.938,67 871.938,67
Izvedba PH ograje

Skupaj Cena brez DDV: 871.938,67 EUR
DDV: 191.826,51 EUR
Cena z DDV: 1.063.765,18 EUR

Nivo 2 2.23 APO-23 + PO-1

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	--------------------------	-----------------------

0001 N 1 2 015 1,00 KOS 91.951,59 91.951,59
Izvedba PH ograje

Skupaj Cena brez DDV: 91.951,59 EUR
DDV: 20.229,35 EUR
Cena z DDV: 112.180,94 EUR

Nivo 2 2.24

Portali prometne opreme

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	--------------------------	-----------------------



0001 N 1 2 023 1,00 KOS 479.698,62 479.698,62
 Izvedba portalov prometne opreme in polportalov

Skupaj Cena brez DDV: 479.698,62 EUR
 DDV: 105.533,70 EUR
 Cena z DDV: 585.232,32 EUR

Nivo 2 2.25

Nacrt prometne opreme in prestavitve prometne signalizacije

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
----------	----------	----------	-----------------------------	--------------------------

0001	N 1 2 024	1,00 KOS	1.279.440,03	1.279.440,03
------	-----------	----------	--------------	--------------

Postavitev prometne opreme in prestavitve prometne signalizacije


Skupaj Cena brez DDV: 1.279.440,03 EUR
 DDV: 281.476,81 EUR
 Cena z DDV: 1.560.916,84 EUR

PONUDBENI PREDRAČUN

**N06Z089 Izgradnja PHO na AC A1 odseku
0040/0640 Celje-Arja vas**

Cena z DDV:	11.197.156,34	EUR
od tega DDV:	2.019.159,34	EUR
Cena brez DDV:	9.177.997,00	EUR

Datum: 28. 11. 2013.

Ponudnik: 

(podpis in pečat)

~~SECRET~~

149/407

**N06Z089 Izgradnja PHO na AC A1 odseku 0040/0640
Celje-Arja vas**

REKAPITULACIJA STROŠKOV

		Cena brez DDV (EUR)	DDV (EUR)	Cena z DDV (EUR)
1	Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere	917.141,16	201.771,06	1.118.912,22
2	Izvedba protihrupnih ograj z obračunom na ključ	8.260.855,84	1.817.388,28	10.078.244,12
2.1	APO-3	42.491,09	9.348,04	51.839,13
2.2	APO-4	1.190.372,28	261.881,90	1.452.254,18
2.3	APO-5	847.371,07	186.421,64	1.033.792,71
2.4	APO-6	1.068.588,86	235.089,55	1.303.678,41
2.5	APO-7	94.617,91	20.815,94	115.433,85
2.6	APO-8	968.205,66	213.005,25	1.181.210,91
2.7	APO-9	144.140,92	31.711,00	175.851,92
2.8	APO-10	87.792,40	19.314,33	107.106,73
2.9	APO-11	379.671,19	83.527,66	463.198,85
2.10	APO-12	251.576,06	55.346,73	306.922,79
2.11	APO-13	145.332,58	31.973,17	177.305,75
2.12	APO-14	497.149,02	109.372,78	606.521,80
2.13	APO-15	162.495,17	35.748,94	198.244,11
2.14	APO-17	283.270,75	62.319,57	345.590,32

2.15	APO-18	226.057,99	49.732,76	275.790,75
2.16	APO-19	211.419,42	46.512,27	257.931,69
2.17	Portali in polportal	246.234,61	54.171,61	300.406,22
2.18	Nacrt prometne opreme in prestavitev prometne signalizacije	1.414.068,86	311.095,15	1.725.164,01

Skupaj za projekt:

Cena z DDV:	11.197.156,34 EUR
od tega DDV:	2.019.159,34 EUR
Cena brez DDV:	9.177.997,00 EUR

Nivo 1 1

Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	S 6 2 483	63.200,00 M1	2,81	177.592,00
Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm V ceni upoštevati tudi odstranitev. Obračunajo se le "polni" deli črt.				
0002	N 1 1 002	1,00 KPL	167.000,00	167.000,00
Izdelava in dobava PZI projekta aktivne protihrupne zaščite ob AC; vodilna mapa in gradbeni načrti. Posamezne raziskave, detajlni posnetki terena, načrti rušitve in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO, načrti križanj in prestavitve komunalnih vodov in elaborati so zajeti v tej postavki. Prav tako mora biti v tej postavki upoštevan projektantski nadzor. PZI za vsako PH ograjo posebej				
0003	N 1 1 018	240,00 DNI	1.565,20	375.648,00
Postavitve in odstranitev začasne varnostne ograje (mini guard) dolžine 10.750 m. V ceni upoštevati najem začasnih varnostnih ograj.				
0004	N 1 1 020	2,00 KOS	17.027,38	34.054,76
Izvedba začasnega prehoda				
0005	N 1 1 023	280,00 URA	40,00	11.200,00
Nadzor upravljalcev komunalnih vodov. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora komunalnih vodov.				
0006	N 1 1 012	1,00 KPL	32.600,00	32.600,00
Izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predaja naročniku v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki. PID-i in navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsako PH ograjo posebej				
0007	N 1 1 019	1.152,00 M1	83,20	95.846,40
Dobava, postavitve in odstranitev montažnega vodilnega robnika z markerji (h=0.58m)				
0008	S 6 6 831	16,00 KOS	400,00	6.400,00
Izvedba meritve učinkovitosti absorpcije ograje za zaščito pred hrupom Izvedba meritev skladno s SIST EN-1793-5				
0009	S 6 6 832	16,00 KOS	400,00	6.400,00
Izvedba meritve učinkovitosti izolacije ograje za zaščito pred hrupom Izvedba meritev skladno s SIST EN-1793-5				
0010	N 1 1 016	2,00 KOS	2.600,00	5.200,00
Dobava in postavitve gradbiščne table skladno z navodili Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013)				
0011	N 1 1 017	2,00 KOS	2.600,00	5.200,00
Dobava in postavitve razlagalne table skladno z navodili Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013)				
Skupaj		Cena brez DDV:	917.141,16 EUR	
		DDV:	201.771,06 EUR	
		Cena z DDV:	1.118.912,22 EUR	

Nivo 1 2

Nivo 2 2.1

Izvedba protihrupnih ograj z obračunom na ključ
APO-3

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	42.491,09	42.491,09

Stran: 4/7

152/407

Izvedba PH ograje

		Skupaj	Cena brez DDV:	42.491,09 EUR
			DDV:	9.348,04 EUR
			Cena z DDV:	51.839,13 EUR

Nivo 2 2.2

APO-4

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	1.190.372,28	1.190.372,28
Izvedba PH ograje				

Nivo 2 2.3

APO-5

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	847.371,07	847.371,07
Izvedba PH ograje				

Nivo 2 2.4

APO-6

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	1.068.588,86	1.068.588,86
Izvedba PH ograje				

Nivo 2 2.5

APO-7

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	94.617,91	94.617,91
Izvedba PH ograje				

Nivo 2 2.6

APO-8

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	968.205,66	968.205,66
Izvedba PH ograje				

Nivo 2 2.7

APO-9

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	144.140,92	144.140,92
Izvedba PH ograje				

Izvedba PH ograje

		Skupaj	Cena brez DDV:	144.140,92 EUR
			DDV:	31.711,00 EUR
			Cena z DDV:	175.851,92 EUR

Nivo 2 2.8

APO-10

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	87.792,40	87.792,40
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	87.792,40 EUR
	DDV:	19.314,33 EUR
	Cena z DDV:	107.106,73 EUR

Nivo 2 2.9

APO-11

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	379.671,19	379.671,19
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	379.671,19 EUR
	DDV:	83.527,66 EUR
	Cena z DDV:	463.198,85 EUR

Nivo 2 2.10

APO-12

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	251.576,06	251.576,06
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	251.576,06 EUR
	DDV:	55.346,73 EUR
	Cena z DDV:	306.922,79 EUR

Nivo 2 2.11

APO-13

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	145.332,58	145.332,58
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	145.332,58 EUR
	DDV:	31.973,17 EUR
	Cena z DDV:	177.305,75 EUR

Nivo 2 2.12

APO-14

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	497.149,02	497.149,02
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	497.149,02 EUR
	DDV:	109.372,78 EUR
	Cena z DDV:	606.521,80 EUR

Nivo 2 2.13

APO-15

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	162.495,17	162.495,17
Izvedba PH ograje				

Izvedba PH ograje

		Skupaj	Cena brez DDV:	162.495,17 EUR
			DDV:	35.748,94 EUR
			Cena z DDV:	198.244,11 EUR

Nivo 2 2.14

APO-17

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	283.270,75	283.270,75
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	283.270,75 EUR
	DDV:	62.319,57 EUR
	Cena z DDV:	345.590,32 EUR

Nivo 2 2.15

APO-18

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	226.057,99	226.057,99
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	226.057,99 EUR
	DDV:	49.732,76 EUR
	Cena z DDV:	275.790,75 EUR

Nivo 2 2.16

APO-19

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 015	1,00 KOS	211.419,42	211.419,42
Izvedba PH ograje				

Skupaj	Cena brez DDV:	211.419,42 EUR
	DDV:	46.512,27 EUR
	Cena z DDV:	257.931,69 EUR

Nivo 2 2.17

Portali in polportali

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 021	1,00 KOS	246.234,61	246.234,61
Izvedba portalov in polportala				

Skupaj	Cena brez DDV:	246.234,61 EUR
	DDV:	54.171,61 EUR
	Cena z DDV:	300.406,22 EUR

Nivo 2 2.18

Nacrt prometne opreme in prestavitev prometne signalizacije

Postavka	Normativ	Količina	Cena / EM brez DDV (EUR)	Znesek brez DDV (EUR)
0001	N 1 1 022	1,00 KOS	1.414.068,86	1.414.068,86
Prestavitev prometne opreme in prestavitev prometne signalizacije				

Skupaj	Cena brez DDV:	1.414.068,86 EUR
	DDV:	311.095,15 EUR
	Cena z DDV:	1.725.164,01 EUR

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

8.

POGLAVJE 7

- **Obrazec pogodbe**
- **Pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe**

157/1.7



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DOLNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 7

OSNUTEK POGODBE

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, september 2013

POGODBA

DARS d.d., št.

Izvajalec, št.

ki jo skleneta:

NAROČNIK: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava

Matična številka: 5814251

Identifikacijska št. za DDV: SI92473717

Transakcijski račun številka: SI5606000-0112292446 pri Banki Celje d.d.

in

IZVAJALEC:

ki ga zastopa

Matična številka

Identifikacijska št. za DDV

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela pri

PODILNI PARTNER:

IZVAJALEC (izpolni ponudnik, ki je tuja pravna oseba): WERKOS d.o.o. - OSIJEK

Sedež (v državi ponudnika) ULICA BOROVA 6 31000 OSIJEK HRVAŠKA

ki ga zastopa DIREKTOR PETAR VELICKI

Matična številka (v državi ponudnika) 0295558

Davčna številka (v državi ponudnika) 84820806875

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela HR0724810001123000834 pri KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

da je Naročnik DARS d. d. dne 14.03.2013. objavil na portalu št. JN2937/2013 in dne 17.03.2013 pri Uradu za uradne objave evropske skupnosti javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z določilom 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 - odl. US in 90/12; v nadaljevanju ZJN-2) za Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2), na podlagi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec; da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom ZDDV-1 tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik, upošteva tudi stališče iz uradnega pojasnila MF, DURS, Generalnega davčnega urada, številka: 4230-48/2009 01032-01 z dne 05.02.2010 glede na pretežnost gradbenih storitev; da se dela, ki so predmet te pogodbe štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist in se izvajajo v skladu z Zakonom o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012).

Podpis: _____

1
159/407

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to Pogodbo Naročnik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Natančen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 - Ponudbeni predračun (Popis del) in Poglavja 9 (načrt) razpisne dokumentacije.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. N 047/13-JV, z dne 28.11.2013, v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti (brez DDV) s strani naročnika, ki znaša:

Za sklop 1 - Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje:

Pogodbena vrednost del brez DDV znaša 8.877.669,30 EUR
OSEM MILIONOV OSEMSTO SEDEMINSEDEMESET TISOČ
z besedo: ŠESTO DEVEETINŠESTDESET EUROV TRIDSET STOTIN EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša 1.953.087,25 EUR
Skupna vrednost z DDV znaša 10.830.756,55 EUR

Za sklop 2 - Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas:

Pogodbena vrednost del brez DDV znaša 9.177.997,00 EUR
DEVET MILIONOV STO SEDEMINSEDEMESET TISOČ DEVETSTO
z besedo: SEDEMINDEVEDESET EURO NIČ STOTIN EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša 2.019.159,34 EUR
Skupna vrednost z DDV znaša 11.197.156,34 EUR

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: cestna in pomorska infrastruktura; prednostne usmeritve: področje cest.

Podpis: _____

2 1160/1207

IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

4. člen

Opravljenega dela bo izvajalec obračunal po načelu ključ v roke, razen pripravljalnih in zaključnih del, ki jih bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Za vsa morebitna, s strani naročnika naročena dodatna dela, ki so vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena od inženirja, bosta pogodbenika sklenila aneks k tej pogodbi, pri čemer bosta ceno za to delo določila na podlagi pogodbeno določenih kalkulativnih osnov. Aneks k pogodbi se sklene po predhodni potrditvi zahtevka izvajalca.

Obračunavanje del bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij, ki jih bo dostavil naročniku v potrditev do vsakega 3. v mesecu za pretekli mesec. Osnutek končne situacije pa bo izstavljen v 30 dneh po izdaji potrdila o prevzemu.

V primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne in končna situacija podpisane s strani partnerja, ki je naročnik garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru morajo biti v situaciji razvidni deleži posameznih partnerjev skupnega nastopanja.

V. NAČIN PLAČEVANJA

5. člen

Izvršena dela bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v začasni mesečni situaciji.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-eh dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

V primerih, ko izvajalec dela izvaja s podizvajalci, mora računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa je dolžan plačati v roku 30 dni od prejema.

Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3 (c) Splošnih pogojev pogodbe in, v skladu z Dodatkom »A« k ponudbi zadržal zadržani znesek 10 % od vsake situacije do max 5% Pogodbene vrednosti. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s Podčlenom 14.9 Splošnih pogojev pogodbe.

V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, imajo izvajalec in podizvajalci pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo do datuma plačila.

Naročnik lahko v dogovoru z izvajalcem svoje obveznosti plača prej kot v 30 dneh, pri čemer bosta naročnik in izvajalec za vsakokratno predčasno plačilo dogovorila ustrezen popust.

V primerih, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v razmerju do izvajalca ne izpolnjujejo kriterijev za povežano družbo po zakonu o gospodarskih družbah

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

Podpis: _____

3

161/107

V nobenem trenutku direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju (vmesni rok). Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenе situacije presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

6. člen

Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti del in jo nato po potrjeni končni situaciji uskladi in po potrebi dopolni. Do predložitve ustrezne Garancije za odpravo napak in izdaje Potrdila o izvedbi, bo naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščino v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu:

- zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
- izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z določili te pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek del.

Uvedba Izvajalca v delo se izvede s *podpisom* posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni dnevnik. V primeru, da Izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik postopa v skladu s podčlenom 8.1 Splošnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vročitve obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi Izvajalcu se bo štelo, da je Izvajalec uveden v delo, razen če se naročnik, po njegovi lastni presoji, odloči, da odstopi od pogodbe in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi; naročnik bo v takšnem primeru upravičen do popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja Izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim Izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški ali škodo.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. člen

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom del izročiti naročniku oziroma inženirju, ki ga je imenoval naročnik, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in ki so navedeni v Splošnih in Posebnih pogojih pogodbe.

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

Podpis: _____



(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v ponudbi - Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela.

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)

Vrsta del/predmet dobave:

količina:

kraj izvedbe del:

predviden termin izvajanja:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene razloge je šteti:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti (kot npr. insolvenčnost);
- potreba po dodatnih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti.

Naročnik bo po prejemu predloga (ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev) preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V tem primeru bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

9. člen

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela kvalitetno, v skladu s poglavjem 4 (splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki in TSC in Tehnični pogoji za izvedbo talnih označb);
- Izročiti naročniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas izvajanja del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodili inženirja;

Podpis: _____

- v roku 20 (dvajset) delovnih dni od sklenitve pogodbe dostaviti naročniku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del v skladu s pogoji Pogodbe in njenih sestavnih delov
- imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci skladno z 9. odstavkom 71. člena ZJN-2;
- kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora izbrana skupina izvajalcev naročniku predložiti najkasneje v 20 delovnih dneh od prejema sklenjene pogodbe zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila kot je določeno v tč. 5.2 (d) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;
- vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložiti naročniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v skladu z zahtevo iz podčlena 18.3 Splošnih pogojev pogodbe in podčlena 18.3 Posebnih pogojev pogodbe. V skladu s podčlenom 18.1 Splošnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se zavarovanje vzdržuje ves čas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika;
- izdelati projekte za izvedbo (PZI) za protihrupne ograje (razen za protihrupno ograjo APO-P01);
- izdelati in dostaviti naročniku pred pričetkom gradbenih del Tehnološke elaborate za izvedbo posameznih del, izdelke in njihovo montažo po tej pogodbi, katerega bo potrdil inženir. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavlja 4 - Posebni tehnični pogoji.
- izdelati in dostaviti naročniku pred pričetkom gradbenih del terminski in finančni plan, ki morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project. Za dela, ki se obračunavajo po načelu "Ključ v roke" se zahteva razdelitev po vrsti del;
- izvajati dela 24 ur na dan vse dni v tednu, tudi ob sobotah in nedeljah. Za dela, ki jih bo izvajal v nočnem času, mora izvajalec zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete predhodno pridobiti soglasje inženirja;
- dokončati dela na gradbišču v dovoljenih časih trajanja zapor za posamezen odsek, določenih v Posebnih pogojih pogodbe;
- Izvajalec del se je dolžan v roku 24 ur odzvati in pripraviti odgovore v sodelovanju s projektantom zapore ceste na vsa novinarska vprašanja, ki so mu posredovana s strani naročnika;
- dela opravljati z odgovornim projektantom in odgovornim vodjo del, ki ju je navedel v ponudbi
- spremembo odgovornega projektanta in odgovornega vodje del izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo odgovornega vodje del zahteva tudi naročnik. V primeru spremembe odgovornega vodje del bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;
- pravočasno obračunati vsa dela, opravljena v preteklem mesecu in zanje izstaviti situacijo do 3. v mesecu.
- zagotoviti prostore za redne operativne sestanke, ki bodo zadoščali za primer udeležbe 12 ljudi;
- v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča;
- izdelati Projekte izvedenih del (PID) in geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, podatke za kataster GJL in jih izročiti naročniku pred izdajo potrdila o prevzemu;
- izdelati navodila za obratovanja in vzdrževanja (NOV) pred izdajo potrdila o prevzemu;
- predložiti naročniku izpolnjene obrazce s podatki o izvršenih delih za banko cestnih podatkov pred izdajo potrdila o prevzemu;

Po prejemu predloga za zamenjavo odgovornega projektanta in odgovornega vodje del bo naročnik (ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev) preveril ustreznost kadra, predlaganega

za zamenjavo in odločil, ali bo nadomestni kader odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi odgovornega projektanta in odgovornega vodje del tekom izvedbe pogodbe.

10. člen

Če naročnik ali inženir ugotovita, da že izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbeni dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, sta upravičena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na lastne stroške takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravnava tudi vse zaradi tega nastale stroške, ki bi jih imel naročnik. Če izvajalec ne bi izvršil naročnikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naročnik, lahko naročnik na stroške izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce, naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrta te pogodbe, vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovčenja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naročnik tudi v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

VIII. ROKI ZA DOKONČANJE DEL

11. člen

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem del pričeti takoj, ko bodo izpolnjena določila podčlena 8.1 Posebnih pogojev pogodbe in po izpolnitvi obveznosti naročnika iz 7. člena te pogodbe ter jih dokončati v naslednjih rokih:

Roki za dokončanje del za 1. sklop:

- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 1. Sklop za odsek 0639: **45 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 1. Sklop za odsek 0039: **90 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava popravkov PZI projekta za posamezni odsek po pripombah revidentov/recenzentov: **10 dni po prejemu Zapisnika recenzijske obravnave;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0639 Dramlje - Celje: **100 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0039 Dramlje - Celje: **120 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0195 priključek Celje-vzhod: **7 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0138 priključek Celje-center: **10 dni od delne uvedbe v delo.**

Roki za dokončanje del za 2. sklop:

- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 2. Sklop za odsek 0040 ali 0640: **45 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 2. Sklop za odsek 0040 ali 0640: **90 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava popravkov PZI projekta za posamezni odsek po pripombah revidentov/recenzentov: **10 dni po prejemu Zapisnika recenzijske obravnave;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0640 Celje-Arja vas: **120 dni od delne uvedbe v delo;**

- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0040 Celje-Arja vas: **120 dni od delne uvedbe v delo.**

Rok za izvršitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo "Potrdila o izvedbi" je 4 mesecev po dokončanju gradbenih del. Kot dokončanje gradbenih del se šteje sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da se lahko izda Dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo.

IX. POGODBENA KAZEN

12. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih vmesnih rokih iz 11. člena ali zamudi z izvršitvijo vseh obveznosti potrebnih za izdajo potrdila o izvedbi, kot tudi v primeru zamude s to pogodbo dogovorjenih rokov za izvedbo posamezne obveznosti iz 9. člena te pogodbe, ki se nanašajo na:

- dokončanje del v dovoljenih časih trajanja zapor,
- izdelavo in predložitev Projekta izvedenih del (PID) in geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
- izdelavo in predložitev navodil za obratovanja in vzdrževanja (NOV),
- dostavo izpolnjenih obrazcev s podatki o izvršenih delih za banko cestnih podatkov,

Je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1% (en promil) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujen koledarski dan.

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo rokov za izvedbo posamezne obveznosti iz 9. člena te pogodbe, ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne obveznosti iz 9. člena te pogodbe, pogodbeno prevzeta dela dokonča v roku za dokončanje del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi Končne situacije. Pogodbena kazen se obračuna s Končno situacijo.

V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva, vse dni v tednu tudi ob sobotah in nedeljah ter so za to izpolnjeni vsi pogoji, je izvajalec dolžan za vsak dan, ko naročnik ugotovi tovrstno kršitev pogodbene obveznosti, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1% (en promil) od pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset) pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo odgovornega projektanta ali odgovornega vodje del ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 5.000 (pettisoč) EUR. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 2% vrednosti pogodbenih del.

13. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Podpis: _____



V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

X. GARANCIJSKA DOBA

14. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti izvedenih del in naprav, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki po členu 4.25 Posebnih pogojev pogodbe znaša **10 let za vsa razpisana dela**.

Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta v uporabo ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega kateri rok je zgodnejši. Za predajo objekta v uporabo se šteje sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da predlaga izdajo Dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo.

15. člen

Ob prevzemu del in izdaji "Potrdila o prevzemu del", bo naročnik pregledal izvršena dela v skladu z določili Splošnih pogojev pogodbe in Posebnih tehničnih pogojev. Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v 4-ih mesecih, inženir pa bo izdal "Potrdilo o izvedbi" šele po odpravi vseh pomanjkljivosti.

16. člen

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe, opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem iz vidika varnosti (promet, stabilnost...). Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug, primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti bančno garancijo.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur na dan.

XI. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA

17. člen

Naročnik bo v skladu s Splošnimi pogoji pogodbe imenoval za inženirja:

Podpis: _____

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Matic Poznič, univ. dipl. inž.grad.

Predstavnik s strani izvajalca je: PETAR VELICKI, DIPLOM. INŽ.

S strani izvajalca je določen za odgovornega vodjo del: MAKS GOSINA, INŽ. GRADB.

S strani izvajalca je določen kot odgovorni projektant: MATJAŽ BREZAVŠČEK (SKLOP 1)
ANDREJ CVAR (SKLOP 2)

XII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

18. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu, sestavni del te Pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba
2. Ponudba in Dodatek "A" k ponudbi
3. Posebni pogoji pogodbe
4. Splošni pogoji pogodbe
5. Ponudbeni predračun z izmerami
6. Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki
7. Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupne izvajalcev
8. Soglasja podizvajalcev
9. Drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.

Pogodbeni stranki se strinjata, da je uporaba posebnih gradbenih uzanc v predmetnem obligacijskem razmerju, izključena.

XIII. PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA

19. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Podpis: _____

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odločilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

XIV. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Pogodba je sklenjena z odločnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe.

Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. V tem primeru bo naročnik unovčil Garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

21. člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

22. člen

Ta pogodba je sestavljena v 6 enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank prejme po tri izvide Pogodbe.

Podpisano dne:

Podpisano dne:

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

WERKOS d.o.o. - OSIJEK
ULICA BOROVA 6
31000 OSIJEK, HRVAŠKA

DARS d.d.

Uprava Dars d.d.


WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)

Podpis: 

(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

.....
.....
.....

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
(firma in sedež partnerja) (ime in priimek
zakonitega zastopnika) pooblašчам zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
..... (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila z dne imenovan za
vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV, da v
našem imenu in za naš račun podpiše in sklene pogodbo za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku
0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

V _____, dne _____

PARTNER (podpis) _____

Opomba: pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev)

Podpis: _____

12
17.01.2017

POSLOVNA
SKRIVNOST

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

FRACASSO RI DOO
TRPIMIROVA 4
51000 RIJEKA

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi FRACASSO RI DOO, TRPIMIROVA 4, 51000 RIJEKA
(firma in sedež partnerja) Marko Hukovic (ime in priimek
zakonitega zastopnika) pooblašča zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
WERKOS D.O.O., Ulica Brozova 6, 31000 OSIJEK (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s
Sporočanjem o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila z dne 14.10.2012 imenovan za
vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV WERKOS D.O.O. - OSIJEK / FRACASSO RI D.O.O. / GODINA D.O.O., da v
našem imenu in za naš račun podpiše in sklene pogodbo za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku
0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

V REK, dne 28.10.2013.

PARTNER (podpis)

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

Opomba: pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev)

Podpis:

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

12

171/107

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

POSLOVNA
KARTICA

(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

GODINA d.o.o.

OIC-HRPELJE 22

6240 KOZINA

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi GODINA d.o.o., OIC-HRPELJE 22, 6240 KOZINA
(firma in sedež partnerja) MAKS GODINA (ime in priimek
zakonitega zastopnika) pooblaščen zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
VERKOS d.o.o.-OSIJEK, ULICA BORUAG (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila z dne 5.11.2013 imenovan za
vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV VERKOS d.o.o.-OSIJEK/FRACASSORI d.o.o./GODINA d.o.o., da v
našem imenu in za naš račun podpiše in sklene pogodbo za

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku
0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

v HRPELJAH, dne 5.11.2013

PARTNER (podpis)

Opomba: pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupne
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev)

GODINA
d.o.o.
POSLOVNA KARTICA

Podpis:

12

172/107

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

9.

POGLAVJE 8

- Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku

113/107



Naložba v vašo prihodnost
OPERAČNI PROGRAM FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotizacija št. 1

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DARS d.d.

POGLAVJE 8

VZORCI GARANCIJ

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1)
in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Celje, november 2013

17/11/13

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

garant

kraj in datum

upravičenec

Oblika predložitve: V papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte.

Kraj predložitve: [Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnatih listin. Če kraj predložitvi ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je izdal garancijo]

Garancija št.

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4

in

..... (naziv izvajalca) za izvedbo (predmet pogodbe) v vrednosti EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednja dela:

1.
2.
3.

v skupni vrednosti EUR, (z besedo (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15-ih dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačati EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil bodisi v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

175/107

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje Arja vas (sklop 2)

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom.

Ta garancija velja najkasneje do Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Garant
(Žig in podpis)



Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AČ-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

garant

kraj in datum

upravičenec

Oblika predložitve: V papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte.

Kraj predložitve: [Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnatih listin.
Če kraj predložitvi ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem
naslovu, kjer je izdal garancijo]

Garancija št.

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe,
datum) sklenjene med upravičencem Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s
sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4

in

..... (naziv izvajalca) za nakup
(izdelavo) (predmet pogodbe) v
vrednosti EUR je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v
garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in
dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in
garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15-ih dneh po prejemu
vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek
..... EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta
garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati originalno
pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom.

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj
navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na
to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Garant
(Žig in podpis)



Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) In odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

10.

IZJAVA

**o seznanjenosti s Poglavjem 9 in njegovem upoštevanju pri pripravi
ponudbe in pri izvedbi del**

179/407

VODILNI PARTNER

Werkos d.o.o. –Osijek
Ulica borova 6
31000 Osijek, Hrvatska


**POSLOVNA
SVEIVNOST**

ZADEVA: Izjava ponudnika

- Izjavljamo, da smo seznanjeni s Poglavljem 9 in njegovem upoštevanju pri pripravi ponudbe in pri izvedbi del.

V Oseku, 11.11.2013

Podpis ponudnika

 **WERKOS**
d.o.o. za inženjering u građevinarstvu
Ulica borova 6 Osijek 31000



POSREDOVANJE
SERIVNOST

PARTNER

FRACASSO RI d.o.o.
Trpimirova 4
51000 RIJEKA

ZADEVA: Izjava ponudnika

Izjavljamo, da smo seznanjeni s Poglavjem 9 in njegovem upoštevanju pri pripravi ponudbe in pri izvedbi del.

Datum: Reka, 25.10.2013.

Podpis ponudnika

~~FRACASSO RI d.o.o.~~
~~RIJEKA, Trpimirova 4~~

**POSLOVNA
SKRIVNOST**

Partner
GODINA d.o.o.
Hrpelje, OIC – Hrpelje 22
6240 KOZINA

ZADEVA: Izjava ponudnika

- Izjavljamo, da smo seznanjeni s Poglavjem 9 in njegovem upoštevanju pri pripravi ponudbe in pri izvedbi del.

Hrpelje, 5.11.2013

Direktor
Maks Godina






SMERNICE ZA GRADNJO PROTIHRUPNIH OGRAJ NA AC DRAMLJE-CELJE-ARJA VAS

(verzija 7. november 2013)

1. SPLOŠNO

Predmet javnega naročila je izdelava PZI (razen za parcelno protihrupno ograjo APO-PO1) in izgradnja aktivne protihrupne zaščite na AC-A1 Šentilj-Srmin, odseku 0039/0639 Dramlje-Celje in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas, ter izgradnja parcelne protihrupne ograje APO-PO1 na začetku odseka 0039/0639 Dramlje-Celje, za katero je PZI že izdelan.

2. OBSEG DEL

Predvidena je gradnja protihrupnih ograd (v nadaljevanju PHO), razdeljenih v dva sklopa:

- **SKLOP 1 - 23 PHO na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje**
- **SKLOP 2 - 16 PHO na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas.**

V okviru sklopa 1 je predvidena izgradnja ene PHO - parcelne ograje APO-PO1, za katero je PZI že izdelan. Izhodišča za izdelavo PZI projektov in izgradnjo aktivne protihrupne zaščite ob AC A1 Šentilj-Srmin predstavljajo naslednji dokumenti:

- **SKLOP 1:**
 - izvleček iz PSP, št. projekta: PR190-PSP-IZ, julij 2012, ki je del razpisne dokumentacije, posebne strokovne podlage (PSP), št. projekta: PR190-PSP, junij 2012, ki so na vpogled na DARS d.d.;
 - izvleček iz PZI za parcelno ograjo APO-PO-1 v naselju Laze pri Dramljah, št. projekta: PR190-PO-PZI-IZ, december 2012, ki je del razpisne dokumentacije;
- **SKLOP 2:** - izvleček iz PSP, št. projekta: CS 1074/11, julij 2012, ki je del razpisne dokumentacije in posebne strokovne podlage (PSP) št. projekta: CS 1074/11, april 2012, ki so na vpogled na DARS d.d..

Izbrani Izvajalec je dolžan upoštevati vsa določila iz omenjenih projektov. Spremembe projektov, ki se v okviru izvedbe posameznega sklopa dovoljujejo, so navedene v nadaljevanju pri vsakem sklopu posebej. Zaradi sprememb projektnih rešitev se ne smejo poslabšati zahtevane akustične in druge karakteristike vgrajenih elementov.

Izbrani Izvajalec del mora za vsak sklop in za vsak odsek posebej (razen za parcelno ograjo) izdelati projekt za izvedbo (PZI) vključno z vsemi potrebnimi elaborati, raziskavami materialov in konstrukcij, geomehanskimi in geotehničnimi raziskavami temeljnih tal in geodetskimi načrti. Geološko geomehansko poročilo mora vključevati pogoje temeljenja za izbran način temeljenja.

2.1 Oblikovalska Izhodišča za sklop 1 in sklop 2

Za oba sklopa so bila v fazi izdelave projektov PSP določena skupna oblikovalska izhodišča, ki morajo biti upoštevana v projektih PZI:

1. PHO se na višini 4,0 m razdeli v dve coni. Ločnica med spodnjo in zgornjo cono se izvede z izrazitejšo spremembo barve, strukture ali materiala absorpcijskih panelov.
2. Stebri so vertikalni, v rastru 4,0 m, armirano betonski in na cestni strani z zaobljenimi robovi $r=5\text{cm}$. V zgornji coni so stebri lahko tudi jekleni.
3. V spodnji coni (do 4,0 m) se uporabi visokoabsorpcijske panele iz lesocementa, porobetona ali glinoporja. V zgornji coni so lahko visokoabsorpcijski paneli tudi aluminijasti.
4. Na AC odseku 0039/0639 Dramlje-Celje - sklop 1 se za PHO, ki so locirane na brežini (na odseku 0639: APO-8, APO-12, APO-17.1 in na odseku 0039: APO-6, APO-14, APO-15), lahko uporabi lesene visokoabsorpcijske panele. Pri drugih PHO leseni paneli niso dovoljeni.
5. Za izvedbo parcelne ograje APO-PO-1, za katero je že izdelan PZI, se lahko poleg projektiranih lesocementnih panelov uporabi tudi lesene panele.
6. Izhodi v sili so projektirani enako za oba sklopa. Izvedejo se v vzporednem zamiku za min. 1,20 m od osnovne linije PHO v dolžini min. 5 rastrov. V pravokotnih zamikih se v smeri vožnje izvedejo transparentna vertikalna okna, na nasprotni strani se izvedejo vrata za izhod v sili, ki so umeščena v nasprotni smeri vožnje. V zamiku petih rastrov in še na treh rastrih pred zamikom in za njim je izgled ograje do višine 3,0 m za oba sklopa enak, in sicer: spodnji element je 0,5 m visoka betonska parapetna greda, sledi 0,5 m absorpcijskega betonskega panela, od višine 1,0-2,0 m transparentno okno v okvirju brez vmesnih vertikalnih podpor ter na višini 2,0-3,0 m absorpcijski betonski panel v signalno rumeni brvi - RAL 1003. Dostop v območje zasilnega izhoda se izvede s prekinitvijo varovalne ograje. Območje zamika za izhode v sili se uporabi tudi za prostor klica v sili.
7. Zaključki ograj se izvedejo s stopničastim preходом po projektu PSP in intenzivno zasadijo.
8. Barve protihrupnih konstrukcij se izvedejo po projektu PSP.

2.2 Obseg del na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje - SKLOP 1

odsek 0639:

odsek 0639:

APD		Praviljena stacionaža (km)	Višina (m)	Dolžina (m)	Površina (m²)	
APO-4		PHO ob stanovanjskih objektih	4	120,0	480	
			4	120,0	480	
APO-5		2,6+59.80	3,1+37.80	3,5 - 4,0	480,0	1710
	a	2,6+59.80	2,7+18.60	4,0	60,0	240
	b	2,7+18.60	3,1+37.80	3,5	420,0	1470
APO-8		4,2+67.00	4,3+98.80	6,0	132,0	792
		4,2+67.00	4,3+98.80	6,0	132,0	792
APO-9		4,3+86.70	5,0+30.40	3,5 - 6,5	644,0	2996
	a	4,3+86.70	4,5+10.60	6,5	124,0	806
	b	4,5+10.60	4,5+70.50	5,0	60,0	300
	c	4,5+70.50	4,7+50.50	3,5	180,0	630
	d	4,7+50.50	5,0+30.40	4,5	280,0	1260
APO-11		5,0+30.40	5,2+70.40	2,5 - 4,5	240,0	840
	a	5,0+30.40	5,1+50.40	2,5	120,0	300
	b	5,1+50.40	5,2+70.40	4,5	120,0	540
APO-12		5,2+52.90	5,3+80.70	3,0 - 4,0	128,0	440
	a	5,2+52.90	5,3+08.10	4,0	56,0	224
APO-13	b	5,3+08.10	5,3+80.70	3,0	72,0	216
APO-14		5,5+81.70	5,6+65.50	6,0	90,0	540
		5,5+81.70	5,6+65.50	6,0	90,0	540
APO-17		5,6+65.50	6,2+23.80	4,0 - 7,0	561,0	3064,0
	a	5,6+65.50	5,7+49.60	5,0	84,0	420
	b	5,7+49.60	5,9+49.70	7,0	200,0	1400
	c	5,9+49.70	6,0+17.70	6,0	68,0	408
	d	6,0+17.70	6,1+58.80	4,0	141,0	564
	e	6,1+58.80	6,2+23.80	4,0	68,0	272
APO-19		6,4+73.00	7,1+70.90	3,0 - 4,5	698,1	2617,9
	a	6,4+73.00	6,6+20.00	4,5	147,0	661,5
	b	6,6+20.00	6,7+07.10	4,0	87,1	348,4
	c	6,7+07.10	6,8+59.00	3,0	152,0	456
	d	6,8+59.00	7,0+03.00	4,5	144,0	648
	e	7,0+03.00	7,1+70.90	3,0	168,0	504



APO-21		7,1+70.90	8,1+58.70	3,0 - 6,5	988,0	4568
	a	7,1+70.90	7,3+06.90	3,0	136,0	408
	b	7,3+06.90	7,3+66.80	4,0	60,0	240
	c	7,3+66.80	7,4+06.80	5,0	40,0	200
	d	7,4+06.80	7,4+50.80	5,0	44,0	220
	e	7,4+50.80	7,6+14.70	6,5	164,0	1066
	f	7,6+14.70	7,7+30.70	6,0	116,0	696
	g	7,7+30.70	7,8+18.70	6,0	88,0	528
	h	7,8+18.70	7,8+58.70	4,0	40,0	160
	i	7,8+58.70	8,1+58.70	3,5	300,0	1050
SKUPAJ odsek 0639					4081,1 m	18047,9 m ²

odsek 0039:

		Predviđena stacionaža [km]		Višina [m]	Dolžina [m]	Površina [m ²]
APO-3		0,6+86.20	1,0+26.30	3,5 - 4,0	340,0	1250
	a	0,6+86.20	0,8+06.20	4,0	120,0	480
	b	0,8+06.20	1,0+26.30	3,5	220,0	770
APO-4		1,5+97.30	1,9+96.10	3,5 - 4,0	400,0	1564
	a	1,5+97.30	1,6+69.30	3,5	72,0	252
	b	1,6+69.30	1,9+96.10	4,0	328,0	1312
APO-6		2,7+11.20	2,8+95.10	7,0	184,0	1288
		2,7+11.20	2,8+95.10	7,0	184,0	1288
APO-7		3,0+50.30	3,4+30.30	3,0 - 3,5	380,0	1288
	a	3,0+50.30	3,1+30.10	3,0	84,0	252
	b	3,1+30.10	3,4+30.30	3,5	296,0	1036
APO-10		4,3+55.50	4,9+47.90	5,0 - 6,5	592,0	3438
	a	4,3+55.50	4,5+03.60	5,0	148,0	740
	b	4,5+03.60	4,6+55.80	6,0	152,0	912
	c	4,6+55.80	4,7+23.80	6,5	68,0	442
	d	4,7+23.80	4,9+47.90	6,0	224,0	1344
APO-13		4,9+47.90	5,2+31.90	2,5 - 3,5	284,0	762
	a	4,9+47.90	5,1+79.80	2,5	232,0	580
	b	5,1+79.80	5,2+31.90	3,5	52,0	182
APO-14		5,2+25.40	5,3+97.10	3,0 - 3,5	172,0	556
	a	5,2+25.40	5,3+05.30	3,5	80,0	280
	b	5,3+05.30	5,3+97.10	3,0	92,0	276
APO-15		5,4+22.40	5,7+01.00	2,0 - 7,0	280,0	1416



	a	5,4+22.40	5,4+62.10	2,0	40,0	80
	b	5,4+62.10	5,5+53.70	4,0	92,0	368
	c	5,5+53.70	5,6+21.30	6,0	68,0	408
	d	5,6+21.30	5,7+01.00	7,0	80,0	560
APO-16		5,6+81.10	6,3+19.60	3,0 - 6,0	641,0	2476
	a	5,6+81.10	5,7+73.10	6,0	92,0	552
	b	5,7+73.10	5,9+33.00	4,0	160,0	640
	c	5,9+33.00	6,0+13.00	3,5	80,0	280
	d	6,0+13.00	6,1+66.00	3,5	153,0	535,5
	e	6,1+66.00	6,3+19.60	3,0	156,0	468
APO-8		6,4+19.00 (AC)	6,4+44.00 (AC)	2,5	162,0	405
		6,4+19.00 (AC)	6,4+44.00 (AC)	2,5	162,0	405
APO-20		6,4+75.60	7,1+83.70	2,5 - 4,5	708,0	2938
	a	6,4+75.60	6,5+02.60	3,0	30,0	90
	b	6,5+02.60	6,5+56.50	3,5	54,0	189
	c	6,5+56.50	6,6+52.60	4,5	102,0	459
	d	6,6+52.60	6,6+76.50	3,5	21,0	73,5
	e	6,6+76.50	6,7+03.50	3,0	24,0	72
	f	6,7+03.50	6,7+87.50	4,0	84,0	336
	g	6,7+87.50	7,1+51.70	4,5	364,0	1638
	h	7,1+51.70	7,1+83.70	2,5	32,0	80
APO-22		7,1+83.70	8,4+75.80	2,5 - 6,0	1292,0	5606
	a	7,1+83.70	7,4+43.80	2,5	260,0	650
	b	7,4+43.80	7,5+99.90	3,0	156,0	468
	c	7,5+99.90	7,8+43.90	6,0	244,0	1464
	d	7,8+43.90	8,0+03.90	6,0	160,0	960
	e	8,0+03.90	8,1+79.90	5,0	176,0	880
	f	8,1+79.90	8,4+75.80	4,0	296,0	1184
PO-2		8,4+75.80	8,5+47.80	3,5	76,0	266,0
		8,4+75.80	8,5+47.80	3,5	76,0	266,00
APO-23	a	0,0+05.90	0,1+60.80	2,5 - 3,0	160,0	400
	b	0,0+05.90	0,0+67.70	2,5	64,0	160
	b	0,0+67.70	0,1+29.90	3,0	64,0	192
	c	0,1+29.90	0,1+60.80	2,5	32,0	80
PO-1		0,1+60.80	0,1+76.40	2,5	16,0	40,0
		0,1+60.80	0,1+76.40	2,5	16,0	40,00
SKUPAJ odsek 0039					5687,0 m	23724 m ²
SKUPAJ odsek 0039/0639 AC Dramlje-Celje					9768,1 m	41771,9 m ²

Predvidena je postavitev 23 protihrupnih ograj skupne dolžine cca 9,8 km. Dve od njih sta predvideni na avtocestnih priključkih (APO-18 in APO-23 + PO-1), ostale so postavljene na območju dolgem 7,86 km, ki se začne v km 0+686 za priključkom Dramlje (APO-3) in konča na priključku Celje-Center (APO-23 + PO-1). Ena PHO (APO-PO1) je predvidena kot parcelna ograja ob stanovanjskih objektih v neposredni bližini priključka Dramlje.


Območje postavitve protihrupnih ograj je razdeljeno na dva dela. V prvem, začetnem delu, je na razdalji 2,75 km na obeh straneh AC predvidena postavitev posamičnih 5 ograj višine med 2,5 m in 7,0 m, pri čemer se posamična dolžina varovanja giblje med 200 in 500 m.

Po 840 m se začne drugi del, v katerem je 17 preostalih PHO postavljenih obojestransko v sklenjeni dolžini cca 4 km vse do konca obravnavanega odseka. Višine ograj na tem delu so med 2,0 m in 7,0 m.


Razen šestih ograj (APO-6, APO-8, APO-12, APO-14, APO-15, APO-17.1), ki so odmaknjene na brežino in ene parcelne ograje (APO-PO-1), so vse preostale ograje predvidene neposredno ob robu vozišča.

Na območju priključka Celje-vzhod (Ljubečna) se obstoječe PHO ne rušijo (razen zaključni elementi) temveč se nadgradijo s posebnimi krovnimi elementi višine 0,5 m. Hkrati se vse obstoječe PHO, zgrajene v okviru gradnje priključka Celje-vzhod, podaljšajo v PHO po projektu PSP na odseku 0639: APO-17, APO-19 in na odseku 0039: APO-16, APO-20 in APO-18 (v priključku Celje vzhod, na R3-752/1403). Na PHO-19a in PHO-19b se v času nadgradnje s posebnimi krovnimi elementi izvedejo dodatne akustične meritve.


Karakteristični prerezi iz projekta PSP so prikazani na naslednjih slikah.

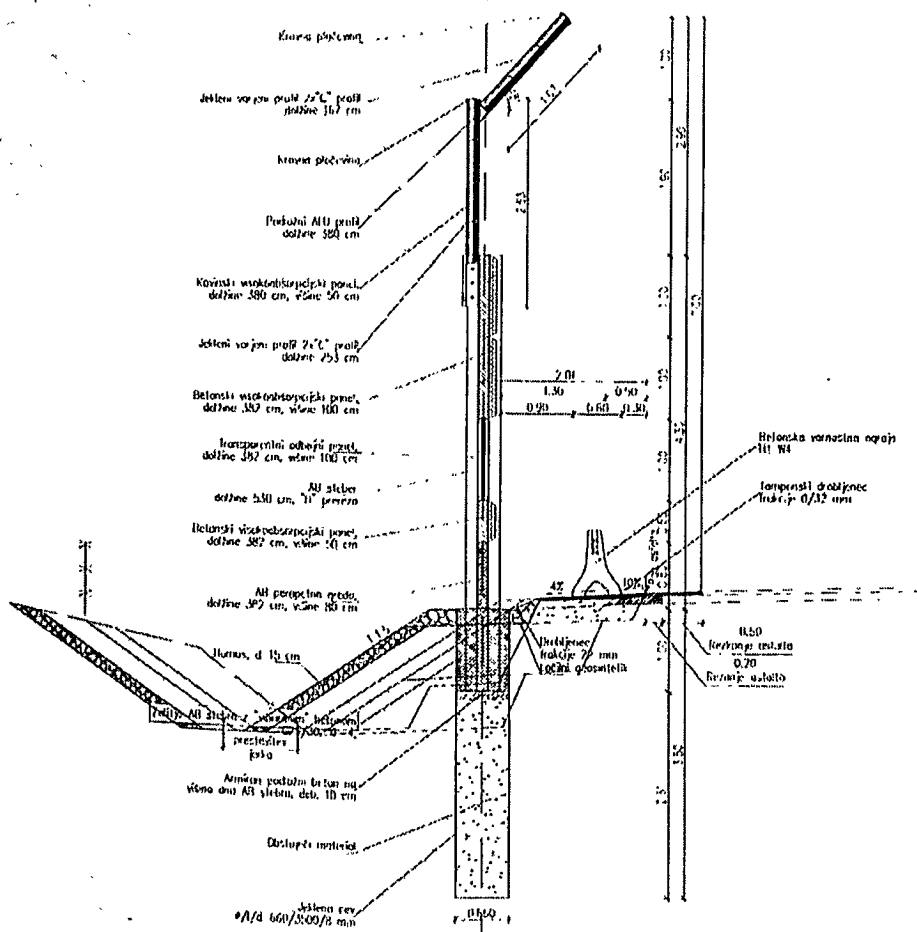


Slika 1: Karakteristični prečni prerez PHO na AC bankini

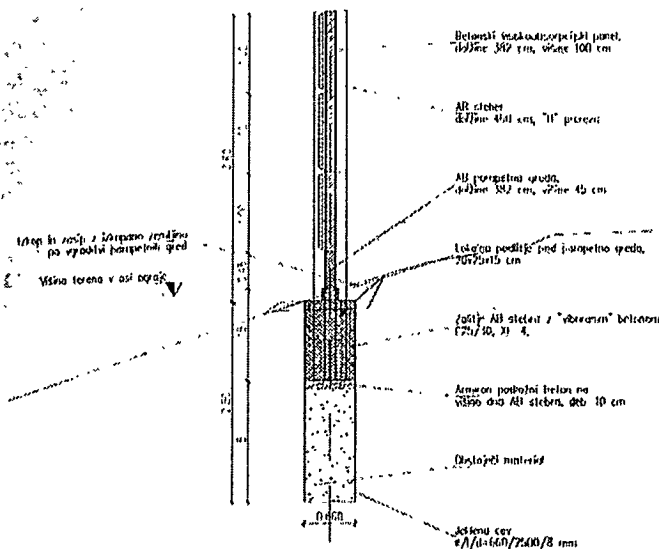

Slika 2: Karakteristični prečni prerez PHO na brežini

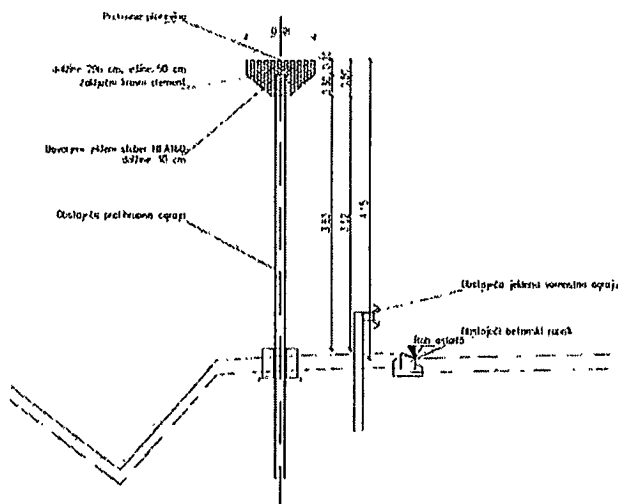

Slika 3: Karakteristični prečni prerez nadvišanja PHO ob priključku Celje-vzhod

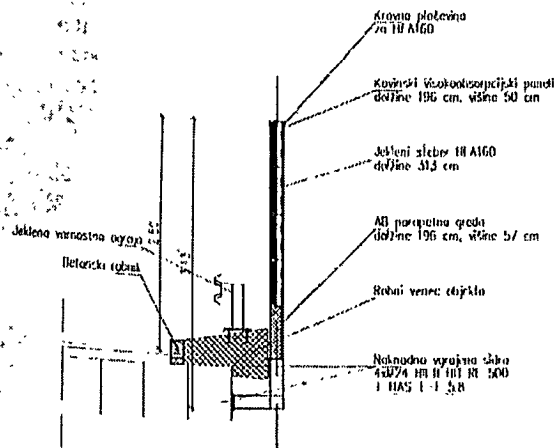

Slika 4: Karakteristični prečni prerez PHO na robnem vencu objektov

Na AC odseku 0039/0639 Dramlje-Celje so dovoljene naslednje spremembe rešitev iz projekta PSP:

- Za PHO, ki so locirane na brežini (na odseku 0639: APO-8, APO-12, APO-17.1 in na odseku 0039: APO-6, APO-14, APO-15), se lahko uporabi lesene visokoabsorpcijske panele. Pri drugih PHO leseni paneli niso dovoljeni.
- Za PHO, ki so locirane na brežini (na odseku 0639: APO-8, APO-12, APO-17.1 in na odseku 0039: APO-6, APO-14, APO-15), so lahko v spodnji coni do višine 4 m stebri namesto armirano betonskih tudi kovinski.
- Dovoljena je sprememba načina temeljenja.
- Za izvedbo parcelne ograje APO-PO-1, za katero je že izdelan PZI, se lahko poleg projektiranih lesocementnih panelov uporabi tudi lesene panele.

Portalne konstrukcije:

Zaradi postavitve PHO so predvidene obsežne spremembe prometne signalizacije in opreme. Prometna signalizacija za vodenje prometa se prestavi nad vozišče na polportalne (dva) in portalne (deset) konstrukcije. Portalni okvir je temeljen na eni strani v vmesnem ločilnem pasu in na drugi strani v brežini za protihrupno ograjo. Konstrukcije portalov morajo biti načrtovane tako, da lahko nosijo veliko prometno tablo nad vsakim voznim pasom in izpolnjujejo zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti po veljavni tehnični regulativi in standardih.

Zaradi temeljenja v sredinskem pasu je potrebno upoštevati zaščito komunalne infrastrukture (meteorne kanalizacije) in varovanje vsakega stebra v ločilnem pasu z 2 x 80 m varnostne ograje H2 W5 skladno s TSC. Poleg tega je potrebno izdelati dodaten elaborat za zaporo za izgradnjo temeljev in postavitev portalov v vmesnem ločilnem pasu.

Za parcelno ograjo (APO-PO-1) mora izbrani izvajalec dostop do gradbišča urediti sam in po koncu gradnje vzpostaviti dovozno cesto v prvotno stanje.

Dodatne akustične meritve na odseku 0639

Namen akustičnih meritev je pridobiti podatke o tem, kakšne razlike oz. akustične učinke v primerjavi z obstoječo višino PHO predstavlja nadvišanje PHO s klasičnimi absorpcijskimi paneli oziroma s po projektu PSP predvidenimi posebnimi krovnimi elementi.

Na obstoječi PHO 10A v dolžini cca. 200 m in višini 3,5 m in 4,0 m, ki se nahaja na odseku 0639 pred priključkom Celje-vzhod (Ljubečna) v smeri proti Mariboru, se v času gradnje izvedejo dodatne akustične meritve klasičnih absorpcijskih panelov in posebnih krovnih absorpcijskih elementov. Priprava PHO in akustične meritve se izvedejo v skladu s predpisanim protokolom:

- Izvedba zapore zaviralnega pasu na območju obstoječe PHO 10A (v trajanju 7 dni) v primeru, da odsek 0639 še ni v celoti pod zaporo zaradi gradnje PHO na sklopu 1, odseku 0639.
- Izvedba 1. serije akustičnih meritev obstoječe PHO 10A.
- Demontaža zgornje vrste panelov na PHO 10A.
- Nadvišanje stebričev HEA 160 za 0,5 m
- Ponovna montaža predhodno odstranjenih panelov.
- Demontaža panelov iz obstoječe PHO 8 in montaža na PHO 10A.
- Izvedba 2. serije akustičnih meritev nadgrajene ograje s klasičnimi paneli.
- Demontaža zgornje vrste panelov iz PHO 10A in ponovna montaža na PHO 8.
- Montaža posebnih krovnih elementov skladno s projektom PSP (za APO-19a in APO-19b.)
- Izvedba 3. serije akustičnih meritev.
- PHO z vgrajenimi posebnimi krovnimi elementi ostane kot končna rešitev nadvišanja obstoječe PHO 10A po projektu PSP v APO-19a in APO-19b.


Akustične meritve PHO se izvedejo v treh serijah v trajanju najmanj 12 ur, in sicer po naslednjem vrstnem redu:

1. meritev obstoječe PHO višine 3,5 in 4,0 m,
2. meritev s klasičnimi paneli nadvišane PHO višine 4,0 in 4,5 m,
3. meritev s posebnimi krovnimi elementi nadvišane PHO višine 4,0 in 4,5 m.

Postopek izvedbe meritev:

- v hodniku med voznim pasom in obstoječo PHO se namesti referenčni mikrofoni, s katerim se ugotavlja dejanska obremenitev okolja s hrupom iz avtoceste,
- učinek nadvišanja PHO se ugotavlja z določitvijo ravni hrupa na devetih različnih pozicijah, in sicer s tremi mikrofoni, nameščenimi na dveh oddaljenostih od osi voznega pasu: 0, 25 in 50 m ter na treh višinah: vozišču, vrhu PHO ter 2,5 m nad vrhom PHO.

Po zaključku dodatnih akustičnih meritev je potrebno pripraviti poročilo o meritvah z usmeritvami uporabe rezultatov pri prihodnjih projektih.

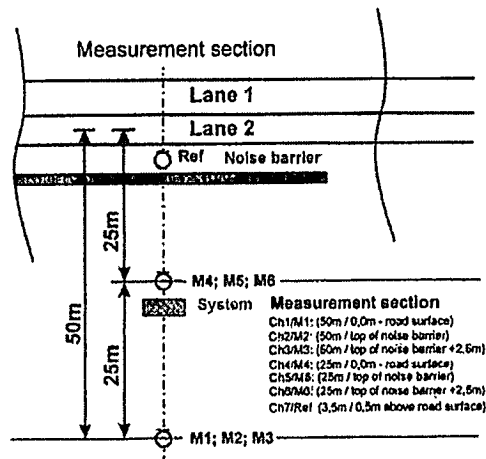

Slika 5: Shema postavitve merilnih naprav pri dodatnih akustičnih meritvah na odseku 0639

2.3 Obseg del na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas - SKLOP 2

odsek 0040:

Ime PHO	Predvidena stacionaža od do (m)		Dolžina (m)	Višina (m)	Površina (m²)
APO 3	63	134	72	3,5	252
APO 3/01	63	137	72	3,5	252
APO 4	129	1462	1336	3,0 - 7,0	7790
APO 4/01	129	174	48	4,5	216
APO 4/02	174	349	176	7	1232
APO 4/03	349	378	28	5,5	154
APO 4/04	378	522	144	4,5	648
APO 4/05	522	662	140	6,5	910
APO 4/06	662	1066	404	7	2828
APO 4/07	1066	1118	52	6,5	338
APO 4/08	1118	1406	288	4,5	1296
APO 4/09	1406	1462	56	3	168
APO 6	1599	2918	1318	2,0 - 7,0	8028
APO 6/01	1599	1771	172	2	344
APO 6/02	1771	1823	52	3	156
APO 6/03	1823	1899	76	5,5	418
APO 6/04	1899	2059	160	6,5	1040
APO 6/05	2059	2348	288	7	2016
APO 6/06	2348	2452	104	6,5	676
APO 6/07	2452	2684	232	7,5	1740
APO 6/08	2684	2826	142	7	994
APO 6/09	2826	2918	92	7	644
APO 7	3037	3193	156	3,5 - 5,5	786
APO 7/01	3026	3146	120	5,5	660
APO 7/02	3146	3182	36	3,5	126
APO 11	3843	4447	604	3,5 - 5,0	2370
APO 11/01	3843	4196	352	3,5	1232
APO 11/02	4196	4284	88	4,5	396
APO 11/03	4284	4396	112	5	560
APO 11/04	4396	4416	20	3,5	70
APO 11/05	4416	4447	32	3,5	112
APO 12	4465	4817	352	3,5 - 5,0	1604
APO 12/01	4465	4569	104	3,5	364
APO 12/02	4569	4589	20	5	100
APO 12/03	4589	4817	228	5	1140
APO 13	4751	4959	208	4	832
APO 13/01	4751	4959	208	4	832
APO 18	6474	6822	348	3,0 - 4,0	1152
APO 18/01	6474	6583	108	4	432
APO 18/02	6583	6822	240	3	720
SKUPAJ odsek 0040			4394 m	2,0 - 7,0	22814 m²


odsek 0640:

Ime PNO	Predvidena stacionaza od do (m)		Dolžina (m)	Višina (m)	Površina (m²)
APO 5	204	1184	1005	4,5 - 7,0	5884,5
APO 5/01	204	224	44	7	308
APO 5/02	224	404	180	7	1260
APO 5/03	404	652	248	5	1240
APO 5/04	652	1072	420	6	2520
APO 5/05	1072	1120	48	5,5	264
APO 5/06	1120	1184	65	4,5	292,5
APO 8	1614	2861	1248	3,5 - 7,5	6894
APO 8/01	1614	1842	228	3,5	798
APO 8/02	1842	1886	44	4,5	198
APO 8/03	1886	2037	152	6	912
APO 8/04	2037	2273	236	7	1652
APO 8/05	2273	2373	100	6,5	650
APO 8/06	2373	2861	488	5,5	2684
APO 9	2858	3056	200	4,0 - 5,0	928
APO 9/01	2858	2985	128	5	640
APO 9/02	2985	3056	72	4	288
APO 10	3049	3193	144	3,5 - 4,5	581
APO 10/01	3049	3105	56	4,5	243
APO 10/02	3105	3149	44	4	184
APO 10/03	3149	3193	44	3,5	154
APO 14	3797	4447	652	4,0 - 6,5	3550
APO 14/01	3797	3832	36	5	180
APO 14/02	3832	4040	208	6	1248
APO 14/03	4040	4076	36	4,5	162
APO 14/04	4076	4216	140	4	560
APO 14/05	4216	4236	20	4,5	90
APO 14/06	4236	4280	44	5,5	242
APO 14/07	4280	4328	48	6	288
APO 14/08	4328	4447	120	6,5	780
APO 15	4457	4668	212	6,5	1378
APO 15/01	4457	4668	212	6,5	1378
APO 17	4643	5003	360	3,5 - 5,5	1684
APO 17/01	4643	4854	212	5,5	1166
APO 17/02	4854	5003	148	3,5	518
APO 19	6729	7105	376	3,5	1316
APO 19/01	6729	7105	376	3,5	1316
SKUPAJ odsek 0640			4197 m	3,5 - 7,5	22215,5 m²

SKUPAJ odsek 0040/0640 Celje-Arja vas	8591 m		45029,5 m²
---------------------------------------	--------	--	------------

Razen APO-9 in del APO-6, ki so odmaknjene na brežino, so vse preostale PHO predvidene neposredno ob robu vozišča.

[illegible]

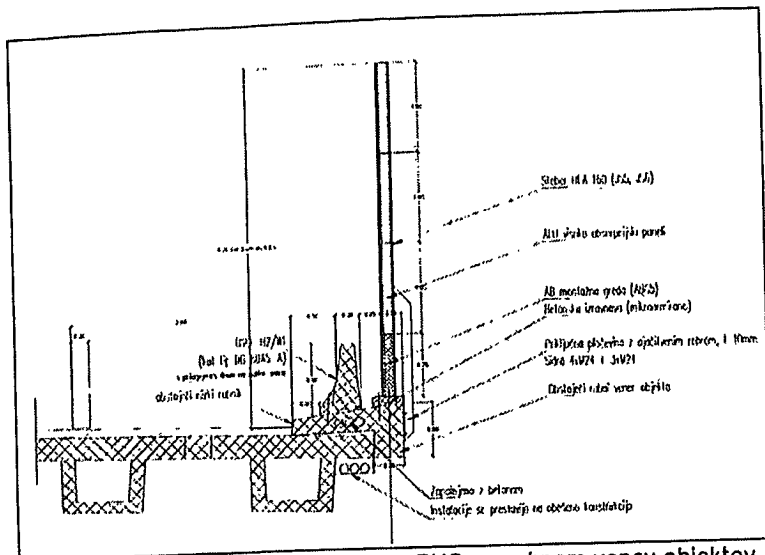

Slika 8: Karakteristični prečni prerez PHO na robnem vencu objektov

Na AC odseku 0040/0640 Celje-Arja vas so dovoljene naslednje spremembe rešitev iz projekta PSP:

- Za PHO, ki so locirane na brežini (na odseku 0640: APO-9, APO-15 in na odseku 0040: APO-12), se lahko uporabi lesene visokoabsorbcijske panele. Pri drugih PHO leseni panell niso dovoljeni.
- Za PHO, ki so locirane na brežini (na odseku 0640: APO-9, APO-15 in na odseku 0040: APO-12), so lahko v spodnji coni do višine 4 m stebri namesto armirano betonskih tudi kovinski.
- Dovoljena je sprememba načina temeljenja.

Portalne konstrukcije:

Zaradi postavitve PHO so predvidene obsežne spremembe prometne signalizacije in opreme. Prometna signalizacija za vodenje prometa se prestavi nad vozišče na polportalne (eden) in portalne (pet) konstrukcije. Portalni okvir je temeljen na eni strani v vmesnem ločilnem pasu in na drugi strani v brežini za protihrupno ograjo. Konstrukcije portalov morajo biti načrtovane tako, da lahko nosijo veliko prometno tablo nad vsakim voznim pasom in izpolnjujejo zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti po veljavni tehnični regulativi in standardih.

Zaradi temeljenja v sredinskem pasu je potrebno upoštevati zaščito komunalne infrastrukture (meteorne kanalizacije) in varovanje vsakega stebra v ločilnem pasu z 2 x 80 m varnostne ograje H2 W5 skladno s TSC. Poleg tega je potrebno izdelati dodaten elaborat za zaporo za izgradnjo temeljev in postavitve portalov v vmesnem ločilnem pasu.

3. IZHODIŠČA

Izbrani Izvajalec mora upoštevati vso veljavno zakonodajo, standarde, predvsem pa naslednje:

- Popis del in Posebni tehnični pogoji (Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989 in Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev DDC 1996 in 1997, 2000, 2001 in 2004)
- Smernice za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa (DARS d.d., Celje, 2003)
- Nemški standardi ZTV-Lsw 88 in Lsw 06 (Zusätzliche technische Vorschriften und Richtlinie für die Ausführung von Lärmschutzwänden an den Strassen)
- Vse veljavne slovenske nacionalne standarde (SIST) za uporabo pri projektiranju in postopkih pri prevzemanju gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS za konstrukcije protihrupnih ukrepov
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 121/04)
- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/08)
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS št. 10/12)
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 3/07-UPB1, 9/11)
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS št. 31/04, 10/05, 82/05, 14/07)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 110/02, ZGO-1b 126/07, ZGO-1c 108/09, 57/12)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/08)
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS št. 91/05, 26/06)
- Zakon o cestah (Ur. l. RS št. ZCes-1 109/10, 48/12)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah (Ur. l. RS št. 46/00, 110/06, 64/08, 109/2010-ZCes-1)
- Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. l. RS št. 116/06, 88/08)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS št. 7/12)
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08).
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 103/11).
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08, 61/11).
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS št. 61/11).
- Navodila in kriteriji za zamenjavo varnostnih ograj na obstoječem AC omrežju (DARS d.d., 14.01.2011)
- Navodilo za pripravo vloge za zaporo avtoceste in hitre ceste (DARS d.d., 27.01.2009).
- Navodila pri izvedbi ukrepov za povečanje pretočnosti prometa in skrajšanje izvedbenih del DARS d.d., 04.01.2011)
- Izvajanje akcijskega načrta optimizacije obnovitvenih del na avtocestah in hitrih cestah v RS (priloga 2 k Akcijskem načrtu izvedbe obnov, sprejetem dne 28.7.2009)
- Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (DRSC, september 2002, dopolnitev oktober 2003).

4. KARAKTERISTIKE IN KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV

Osnova za kontrolo kvalitete izdelave in postavitve panelov so Smernice za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa (DARS d.d., Celje, 2003).

Za absorpcijske panele je potrebno upoštevati:

- zvočna absorpcija - razred A3 (od 8 do 11 dB(A)), skladno s SIST EN 1793-1:2013,
- zvočna izolativnost - razred B3 (>25 dB(A)), skladno s SIST EN 1793-2:2013,
- mehanska odpornost in stabilnost posameznih elementov in konstrukcije kot celote, skladno s SIST EN 1794-1:
 - lastna teža, vertikalna in horizontalna obremenitev,
 - obremenitev vetra 1.45 kN/m²,
 - srk pri vožnji mimo 0.8 kN/m²,
 - pluzenje snega za 60 km/h (3.75 kN/m²),
 - udarec kamenja,
 - varnost pri trku,
 - sredstva za pritrjevanje elementov-vpenjanje elementov,
- trajnost, skladno s SIST EN 14389-2,
- splošne zahteve za varnost in varstvo okolja, skladno s SIST EN 1794-2:
 - odpornost proti požarom v naravi, razred 2,
 - zaščita zaradi izpadanja poškodovanih elementov,
 - varstvo okolja,
 - izhodi v sil.

Zahtevani certifikati pred dobavo na gradbišče:

- razred zvočne absorpcije A3 (od 8 do 11 dB(A)), skladno s SIST EN 1793-1:2013;
- razred zvočne izolacije B3 (>25 dB(A)), skladno s SIST EN 1793-2:2013;
- mehanske karakteristike materiala in konstrukcije kot celote (EN 1794-1);
- odpornost proti ognju (SIST EN 1794-2).

Vsaka dobava mora biti opremljena s pisnimi dokazili in certifikati, ki zagotavljajo zgoraj navedene karakteristike. Proizvajalčeva garancija za material mora biti 10 let.

Transparentni paneli morajo biti ravni in vpeti v okvir ter izdelani iz litih poliakrilnih plošč. Zagotavljati morajo zvočno izolativnost za razred B3 (> 25 dB(A)). Na mestih, kjer se transparentna PHO nahaja nad podvozom, morajo biti transparentni paneli armirani.

Za transparentne panele so zahtevane naslednje karakteristike:

- debelina 15 mm
- predpisane dimenzije (+/- 0.5%)
- barva prozorna - brezbarvna
- transparentnost ob dobavi - min. 90 %
- izguba transparentnosti po 10ih letih do 3%
- gostota poliakrila 1,19 g/cm³
- modul elastičnosti min 3300 N/mm²
- upogibna trdnost min 98 N/mm²
- natezna trdnost min 70 N/mm²
- temperaturna stabilnost 100 °C
- razteznostni koeficient 0.07 mm/m °C
- odpornost na udarce
- odpornost na nalet kamna
- ognjeodpornost
- dokazila časovne stabilnosti
- izvedba varovanja proti izpadu iz ležišča
- pri izvedbi je potrebno upoštevati standard EN 2155 in EN 410 (ravnost in prosojnost poliakrila).

Vsaka dobava mora biti opremljena s pisnimi dokazili in certifikati, ki zagotavljajo zgoraj navedene karakteristike. Proizvajalčeva garancija za poliakrilni material mora biti 10-letna. Po 10-letnem obdobju mora proizvajalec garantirati modul elastičnosti min. 2800 N/mm², natezno trdnost min. 55 N/mm² in izgubo prosojnosti do 3 %.

Zahtevani certifikati pred dobavo na gradbišče:

- razred zvočne izolacije B3 (>25 dB(A)) (SIST EN 1793-2:2013);
- mehanske karakteristike materiala in konstrukcije kot celote (SIST EN 1794-1);
- odpornost proti ognju (SIST EN 1794-2);
- ustreznost detajla vpenjanja panela na nosilno konstrukcijo (SIST EN 1794-1 B.3.4).

Varnostne ograje

Vzdolž PHO na AC bankini je predvidena postavitev betonskih varnostnih ograd (BVO) širine 60 cm in višine 80 cm. Na trasi AC morajo nove BVO zagotavljati nivo zadrževanja H1 in delovno širino W4, ob stebru podporne konstrukcije H2 W2, na objektih pa H2 W1. Na določenih odsekih vzdolž PHO se obstoječe jeklene varnostne ograje ohranijo. Izvedejo se navezave JVO na BVO. Na objektih se paličaste varovalne ograje odstranijo, njihovo funkcijo prevzamejo PHO.

5. ZAPORE

Za izvedbo PHO ob AC se bodo dela predvidoma izvajala pod zaporo ustreznega tipa A z možnostjo zožanja prometnih pasov oz. C2+1+1 za vsako smer in za vsak sklop posebej. Izvajalec mora v okviru PZI izdelati elaborat zapore.

5.1 Zapore na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje - SKLOP 1

Dovoljeni časi trajanja zapor za sklop 1 so naslednji:

Faza	Št. odseka	Oznaka protihrupne ograje	Tip zapore ceste	Št. dovoljenih dni prometne zapore
1.	A1/0639	APO-5, APO-8, APO-9, APO-11, APO-12, APO-17, APO-17.1, APO-19 in APO-21	A oz. C2+1+1	100 dni
2.	A1/0039	APO-3, APO-4, APO-6, APO-7, APO-10, APO-13, APO-14, APO-15, APO-16, APO-20, APO-22 + PO-2	A oz. C2+1+1	120 dni
3.	A1/0195	APO-18 (na priključku Celje-vzhod)	zapora krakov A in B priključka Celje-vzhod ter Z-1 na R3-752/1403	7 dni
4.	A1/0138	APO-23 + PO-1 (na priključku Celje-center)	zapora uvoznega kraka priključka Celje-center	10 dni

5.2 Zapore na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas - SKLOP 2

Dovoljeni časi trajanja zapor za sklop 2 so naslednji:

Faza	Št. odseka	Oznaka protihrupne ograje	Tip zapore ceste	Št. dovoljenih dni prometne zapore
1.	A1/0640	APO-5, APO-8, APO-9, APO-10, APO-14, APO-15, APO-17, APO-19	A oz. C2+1+1	120 dni
2.	A1/0040	APO-3, APO-4, APO-6, APO-7, APO-11, APO-12, APO-13, APO-18	A oz. C2+1+1	120 dni

6. DODATNE ZAHTEVE

Izbrani izvajalec del mora upoštevati še naslednje:

- vsa priložena dokumentacija k ponudbi mora biti v slovenščini oziroma poleg podpisanega in veljavnega originala prevedena v slovenščino,
- razpolagati z nadomestnimi deli najmanj 10 let po izvedbi del,
- zagotoviti dobavni rok za nadomestne dele, ki ne bo daljši od 60 koledarskih dni po prejemu naročila s strani naročnika.

Skladno s SIST EN 14389-1 in 14389-2 se zahteva, da je življenjska doba konstrukcijskih elementov (Structural elements) 30 let, akustičnih elementov (Acoustic elements) pa 20 let, kar ustreza planski dobi načrtovanih PHO.

Pri globokem temeljenju je potrebno nosilnost kolov dokazati s statičnim obremenilnim testom temeljev v horizontalni smeri, in sicer z vsaj enim testom na vsako geotehnično enoto (skladno s Smernicami za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa (DARS d.d., Celje, 2003)).

Obstoječe varnostne ograje in PHO (protihrupni paneli in stebri), ki so še uporabne in ki bodo zaradi gradnje PHO odstranjene, se deponirajo na deponiji DARS. Pri demontaži je potrebno upoštevati postopek dela, ki bo minimalno poškodoval navedene elemente, da bo mogoča nadaljnja uporaba demontiranih elementov.

V priključku Celje-center je bila po izdelavi projekta za PHO izvedena javna razsvetljava, ki jo je potrebno upoštevati in prilagoditi predvideni postavitvi PHO.

Na odseku 0040/0640 Celje-Arja vas je predvidena obnova voziščne konstrukcije. Izbrani izvajalec mora v primeru sočasne izvedbe sodelovati z izbranim izvajalcem obnove voziščne konstrukcije.

Pri izvedbi del na odseku 0039/0639 Dramlje-Celje je potrebno, zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev preusmeritve prometa na odsek 0639 (smer Maribor), dela najprej izvesti na odseku 0639 (smer Maribor).

Splošni pogoji:

- Pri izvedbi naj bo prisoten geomehanik, ki v primeru slabših pogojev od predvidenih predpiše dopolnilne ukrepe.
- Obvezna je zakoličba komunalnih in drugih vodov.
- Na mestih križanj obstoječih komunalnih vodov s protihrupno ograjo je potrebno izvajati ročne prekope. Obvezna je prisotnost upravljavca komunalnih vodov.
- PHO morajo biti izvedene brez vseh z načrtom nepredvidenih odprtín, ki bi eventualno zmanjševale akustične lastnosti in funkcijo same PHO.
- Po izvedbi je potrebno vzpostaviti prvotno stanje okolice.



11.

POGLAVJE 10

- **Obrazec 5.1 (a) - Podatki o ponudniku**
- **Seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika**
- **Izjava 1**
- **Izjava 2 in Izjava 2/A**
- **Izjava 3**
- **Izjava 4**
- **Pooblastila naručniku za pridobivanje podatkov od bank ponudnika**
- **Izjava 5**
- **Obrazec 5.1 (i) – Poročilo o finančnem stanju ponudnika**
- **Obrazec 5.1 (j) – Seznam najpomembnejših opravljenih referenčnih del**
- **Potvrdila naročnikov del**
- **Izjava 6**
- **Obrazec 5.1 (l) – Seznam kadrov**
- **Dokazila za kadre**
- **Obrazec 5.1 (m) – Sezna podizvajalcev , katerim bo ponudnik zaupal delno izvedbo naročila**
- **Obrazec 5.1 m - Povezani**
- **Obrasci » Podatki o podizvajalcu «**
- **Soglasje podizvajalca**
- **Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev iz 3. odstavka 42.člena ZJN-2**
- **Izjava 8**
- **Izjava 9**



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 10

SPOSOBNOST

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1)
in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Celje, september 2013

201/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Opozorilo ponudnikom:

Vsi predloženi obrazci morajo biti podpisani in izpolnjeni na način, kot je razvidno iz obrazca.

Vsebina izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v razpisni dokumentaciji, ne glede na način izpolnjevanja.

podpis

1

202/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

5.1 a

PODATKI O PONUDNIKU

Ponudnik (Firma / ime) WERKOS d.o.o. - OSIZEK
Sedež ULICA BOROVA 6, 31000 OSIZEK, HRVAŠKA
Št. vpisa v sodni register (št. vloška) 030016616
Kontaktna oseba .. DIPL. INŽ. GRADB.
Telefonska št.: +0385 31 228-700 Fax št.: +0385 31 228-701 E-mail: werkos@werkos.com
Država registracije HRVAŠKA
Matična številka (v državi ponudnika) 0295558
Davčna številka (v državi ponudnika) 84820806875

Potrdilo, da je pravna oseba identificirana za DDV pod identifikacijsko številko za DDV, šifra
..... z dne (izpolnijo samo
ponudniki, registrirani v Republiki Sloveniji)

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela (Swift: KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. (KREZHR2X))
HR0724810001123000894 pri

Navedba vseh ostalih transakcijskih računov ponudnika:
HR9423100091100135774 pri PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. (Swift: PBZGHR2X)
HR4723600001101273504 pri ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB (Swift: ZABAHR2X)
HR3824020061100438154 pri ERSTEBSTEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA (Swift: ERSTHR22)
HR8124070001100372609 pri OTP BANKA HRVATSKA d.d. ZADAR (Swift: OTPVHR2X)
HR9223300031100413286 pri SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. SPLIT (Swift: SOGEHR22)
HR6224840081102646054 pri RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB (Swift: RZBHHR2X)

Ponudniki, ki niso registrirani v Republiki Sloveniji, naj navedejo, ali imajo v Republiki Sloveniji
ustanovljeno podružnico (podatek je samo informativnega značaja):

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki
Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku
(ZUP):

Navedba pooblaščenca za vročanje v skladu z ZUP: MAKS. GODINA

Naslov pooblaščenca za vročanje v skladu z ZUP: SLOPE 21A, 6240 KOZINA
SLOVENIJA

Žig in podpis

WERKOS
d.o.o. za inženjering in graditeljstvo
Ulica Kozina - Csigek (12)

2

203/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika:

Ime in priimek	Vrsta pooblastila: 1 - zakoniti zastopnik 2 - prokurist 3 - po pooblastilu (navesti vrsto pooblastila)	Podpis
PETAR VELICKI	ZAKONITI ZASTOPNIK - DIREKTOR	

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Božiča 6 - Ogjok (12)

Žig in podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PODATKI O PONUDNIKU

5.1 a

Ponudnik (Firma / ime) FRACASSO RI D.O.O.
Sedež TRPIMIROVA 4, SI 000 RIJEKA, HRVATSKA
Št. vpisa v sodni register (št. vložka) 040064257
Kontaktna oseba MILIVOJ MILIVOVIC
Telefonska št.: 0038551500590 Fax št.: 0038551500591 E-mail: fracasso@fracasso-ni.hr
Država registracije HRVATSKA
Matična številka (v državi ponudnika) 00741558
Davčna številka (v državi ponudnika) 02744205849

Potrdilo, da je pravna oseba identificirana za DDV pod identifikacijsko številko za DDV, šifra
..... z dne (izpolnijo samo
ponudniki, registrirani v Republiki Sloveniji)

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela
IBAN: HR6823300061100000739; SWIFT: ISKBHR2X pri ISPRASKA KREDITNA BANKA D.O.O.

Navedba vseh ostalih transakcijskih računov ponudnika:
IBAN: HR562360001101918974; SWIFT: ZABAH2X pri ZAGREBAČKA BANKA D.O.
IBAN: HR652488001100104107; SWIFT: BFKCHR22 pri BKS BANK D.O.
..... pri
..... pri
..... pri

Ponudniki, ki niso registrirani v Republiki Sloveniji, naj navedejo, ali imajo v Republiki Sloveniji
ustanovljeno podružnico (podatek je samo informativnega značaja):

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki
Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku
(ZUP):

Navedba pooblaščenca za vročanje v skladu z ZUP: MAKŠ GODINA

Naslov pooblaščenca za vročanje v skladu z ZUP: SLOPE 21A, G140 KOZINA
SLOVENIJA

Žig in podpis

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

2

4

205/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika:

Ime in priimek	Vrsta pooblastila: 1 - zakoniti zastopnik 2 - prokurist 3 - po pooblastilu (navesti vrsto pooblastila)	Podpis
MILIVOJ MILKOVIC	1 - ZAKONIT ZASTOPNIK	
ADRIANO FRACASSO	1 - ZAKONIT ZASTOPNIK	

Žig in podpis **FRACASSO RI d.o.o.**
RIJEKA, Trpimirova 4



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PODATKI O PONUDNIKU

5.1 a

Ponudnik (Firma / ime) GODINA d.o.o.

Sedež OIC-HRPELJE 22, 6240 KOZINA

Št. vpisa v sodni register (št. vložka) 1/07814/00

Kontaktna oseba MAKS GODINA

Telefonska št.: 05/6181 220 Fax št.: 05/6181 221 E-mail: info@godina.si

Država registracije SLOVENIJA

Matična številka (v državi ponudnika) 2296225000

Davčna številka (v državi ponudnika) SI54687080

Potrđilo, da je pravna oseba identificirana za DDV pod identifikacijsko številko za DDV, šifra
SI54687080; št. 41911-3220/2007-06-0176 dne 23.5.2007 (izpolnijo samo
ponudniki, registrirani v Republiki Sloveniji)

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela
SI56 1010 0004 3349 392 pri BANKA KOPER d.d.

Navedba vseh ostalih transakcijskih računov ponudnika:

SI56 1910 0001 0268 668 pri DBS d.d.

SI56 1910 0001 0157 409 pri DBS d.d.

SI56 0432 1000 1398 957 pri NOVA KBM d.d.

SI56 3300 0000 5877 415 pri HYPO BANK d.d.

..... pri

Ponudniki, ki niso registrirani v Republiki Sloveniji, naj navedejo, ali imajo v Republiki Sloveniji
ustanovljeno podružnico (podatek je samo informativnega značaja):

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki
Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku
(ZUP):

Navedba pooblaščenca za vročanje v skladu z ZUP:

Naslov pooblaščenca za vročanje v skladu z ZUP:

Žig in podpis

GODINA
OIC-HRPELJE 22 KOZINA

207/907




Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika:

Ime in priimek	Vrsta pooblastila: 1 - zakoniti zastopnik 2 - prokurist 3 - po pooblastilu (navesti vrsto pooblastila)	Podpis
MAKS GODINA JASNA GODINA	ZAKONITI ZASTOPNIK, DIRECTOR -II- 1 PROKURIST	

 **GODINA**
d.o.o.
ČIG. Hribovci, 12. 11. 2012
Žig in podpis



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)


Ponudnik: WERKOS d.o.o. - OSIJEK
ULICA BOROVA 6
31000 OSIJEK, HRVAŠKA

IZJAVA 1

IZJAVLJAMO, DA SMO REGISTRIRANI PRI PRISTOJNEM ORGANU IN IMAMO V
TEMELJNEM AKTU DRUŽBE OPREDELJENE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNEGA
NAROČILA.

v OSIJEKY, dne 11. 11. 2013.

PONUĐNIK (podpis)

 WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

FRACASSO RI D.O.O.
TRPIMIROVA 4
51000 RIJEKA

IZJAVA 1

IZJAVLJAMO, DA SMO REGISTRIRANI PRI PRISTOJNEM ORGANU IN IMAMO V
TEMELJNEM AKTU DRUŽBE OPREDELJENE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNEGA
NAROČILA.

v REKI, dne 25.10.2013.

PONUĐNIK (podpis)

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4
